



Řídící harmonogram investičních akcí v areálu UKB MU


Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace

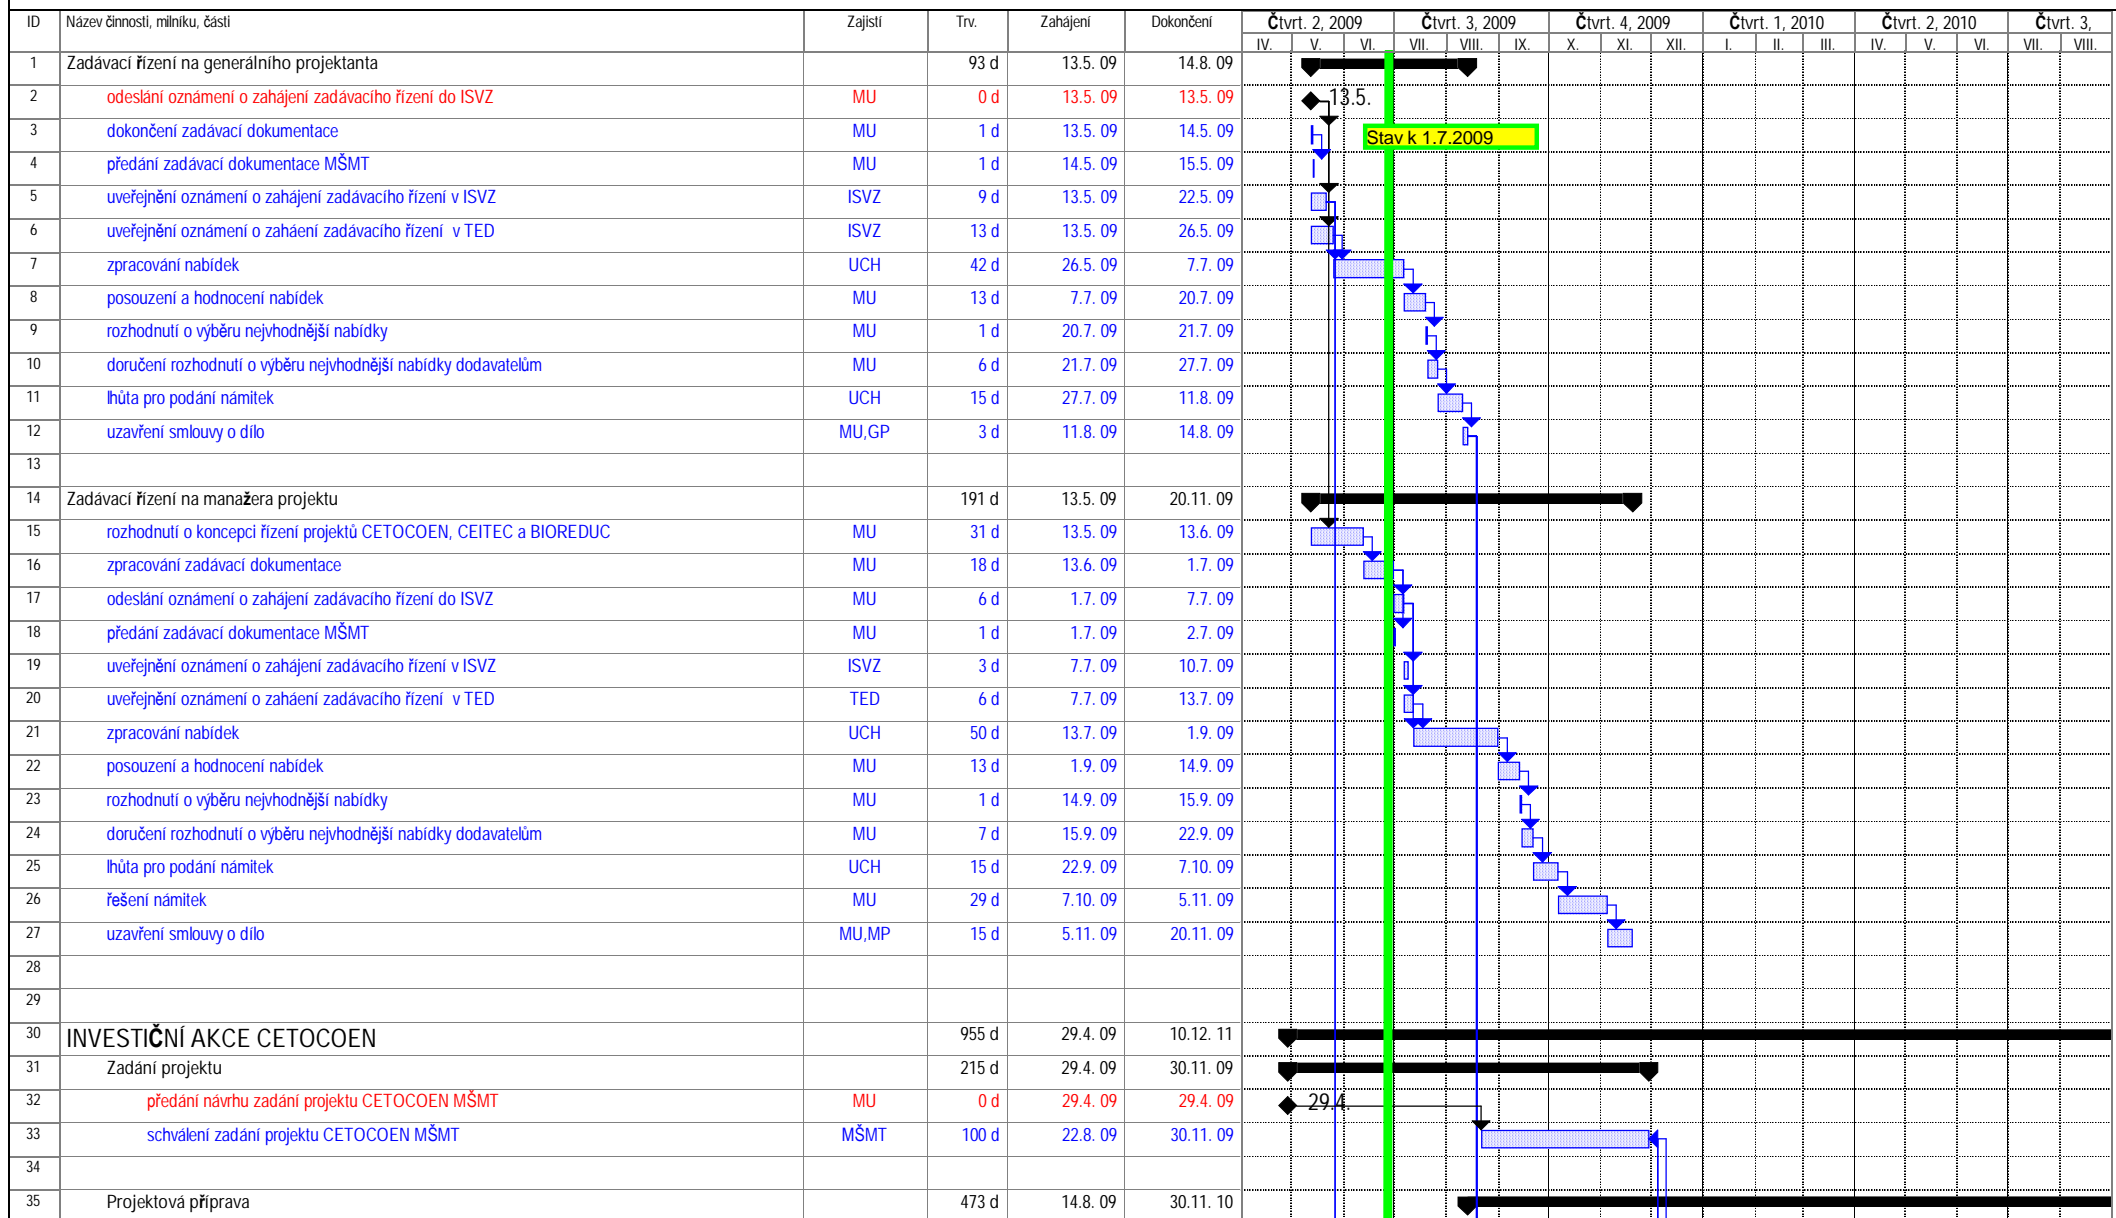

Řídicí harmonogram investičních akcí v areálu UKB MU

Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace

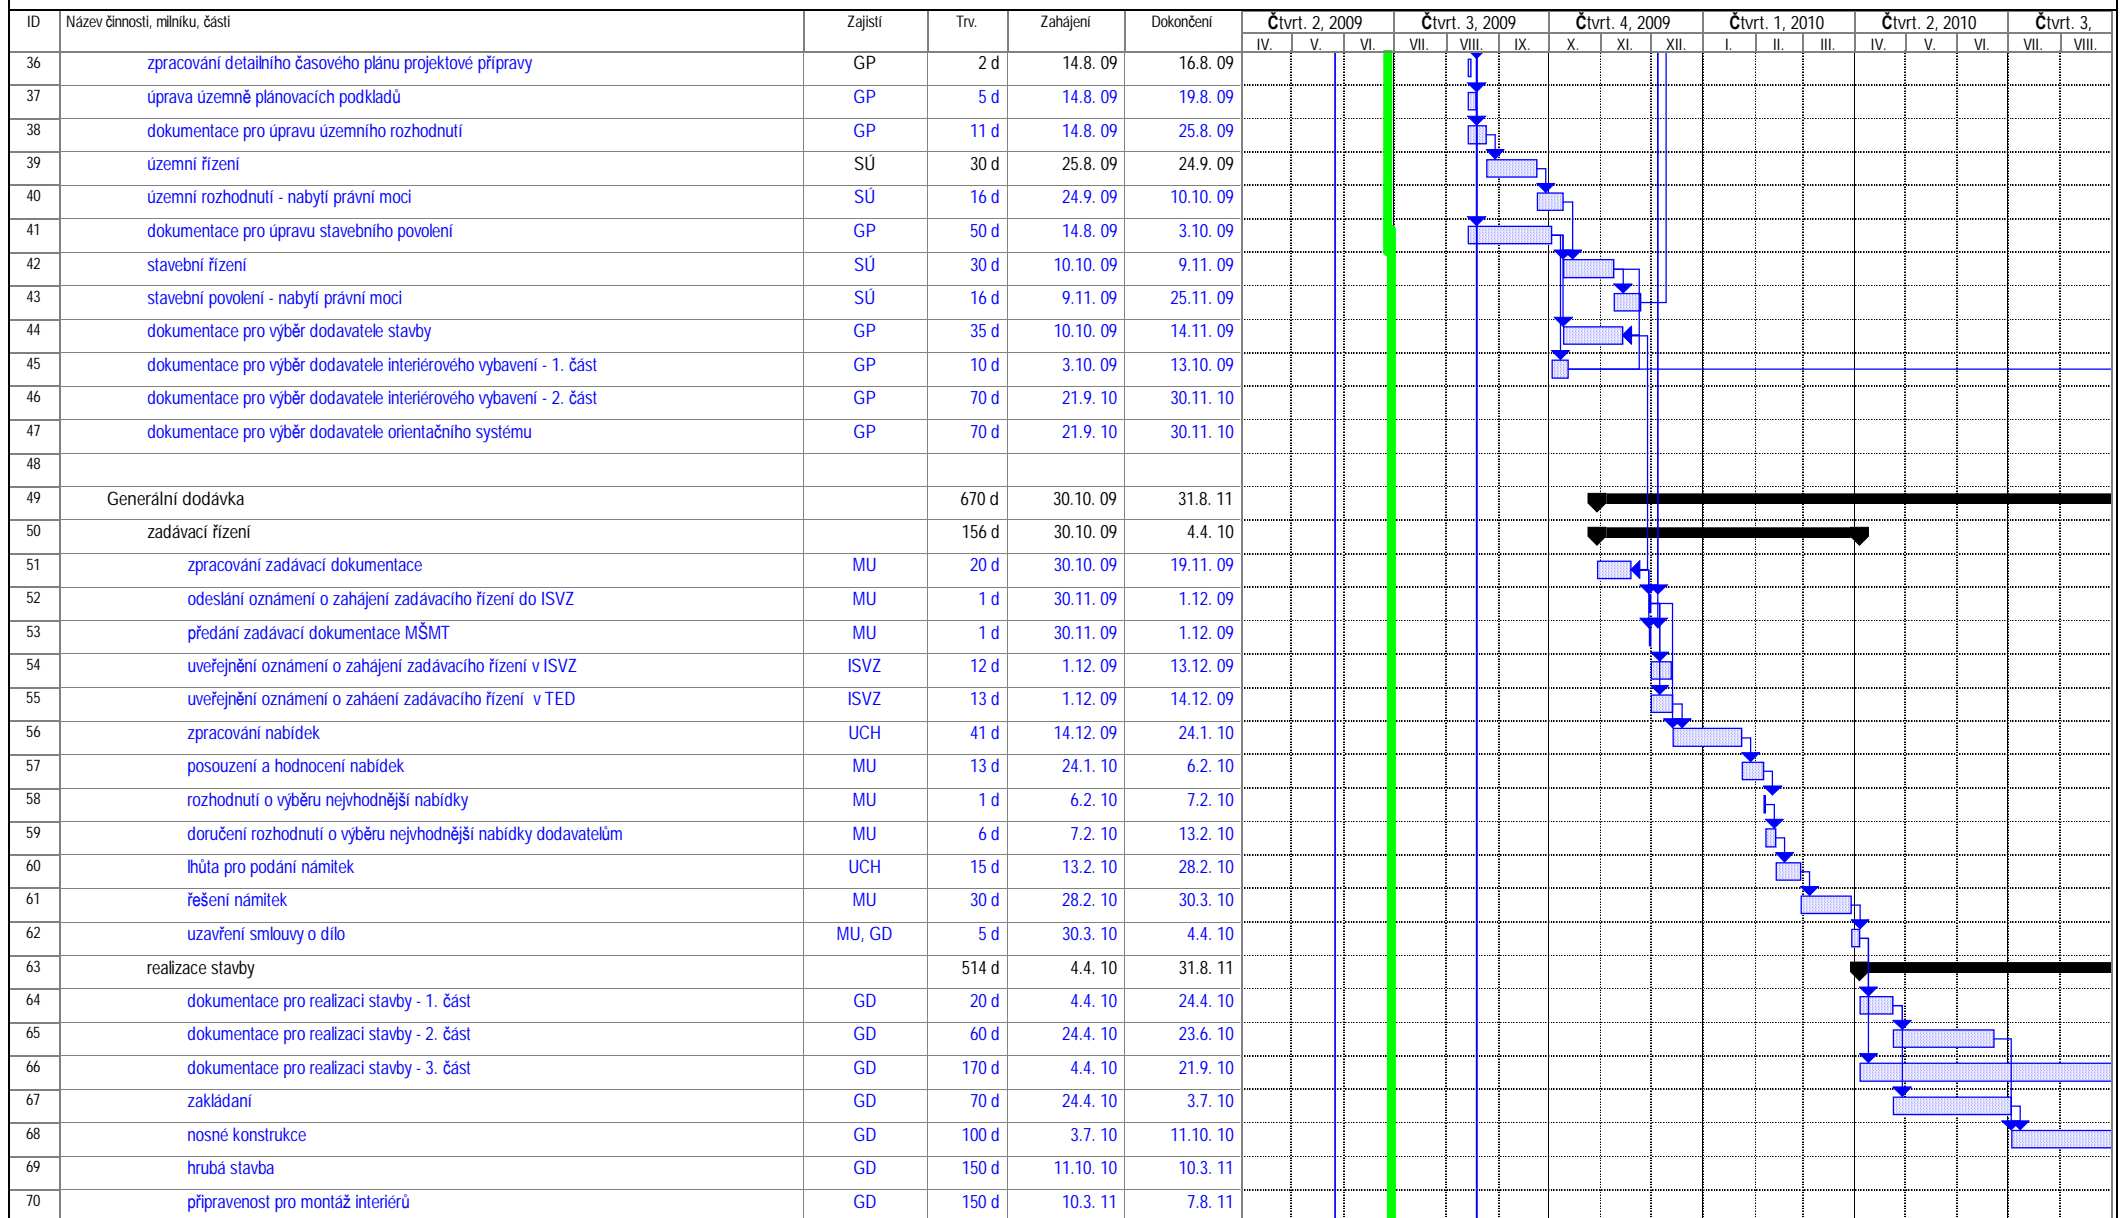




Řídicí harmonogram investičních akcí v areálu UKB MU

Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace

ID	Název činnosti, milníku, části	Zajišť.	Trv.	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 2, 2009			Čtvrt. 3, 2009			Čtvrt. 4, 2009			Čtvrt. 1, 2010			Čtvrt. 2, 2010			Čtvrt. 3,	
						IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
71	předání a převzetí	GD, MU	174 d	10.3. 11	31.8. 11																	
72																						
73	Dodávka interiérového vybavení		314 d	20.11. 10	30.9. 11																	
74	zadávací řízení		145 d	20.11. 10	14.4. 11																	
75	zpracování zadávací dokumentace	MU	20 d	20.11. 10	10.12. 10																	
76	odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do ISVZ	MU	1 d	10.12. 10	11.12. 10																	
77	předání zadávací dokumentace MŠMT	MU	1 d	10.12. 10	11.12. 10																	
78	uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v ISVZ	ISVZ	12 d	11.12. 10	23.12. 10																	
79	uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v TED	ISVZ	13 d	11.12. 10	24.12. 10																	
80	zpracování nabídek	UCH	41 d	24.12. 10	3.2. 11																	
81	posouzení a hodnocení nabídek	MU	13 d	3.2. 11	16.2. 11																	
82	rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky	MU	1 d	16.2. 11	17.2. 11																	
83	doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dodavatelům	MU	6 d	17.2. 11	23.2. 11																	
84	lhůta pro podání námitek	UCH	15 d	23.2. 11	10.3. 11																	
85	řešení námitek	MU	30 d	10.3. 11	9.4. 11																	
86	uzavření smlouvy o dílo	MU, DI	5 d	9.4. 11	14.4. 11																	
87	realizace dodávky		169 d	14.4. 11	30.9. 11																	
88	příprava výroby a výroba	DI	140 d	14.4. 11	1.9. 11																	
89	předání stanoviště	MU	5 d	7.8. 11	12.8. 11																	
90	montáž zařízení podmiňujících doladění VZT	DI	15 d	12.8. 11	27.8. 11																	
91	předání a převzetí	DI, MU	49 d	12.8. 11	30.9. 11																	
92																						
93	Dodávka orientačního systému stavby		329 d	10.11. 10	5.10. 11																	
94	zadávací řízení		155 d	10.11. 10	14.4. 11																	
95	zpracování zadávací dokumentace	MU	30 d	10.11. 10	10.12. 10																	
96	odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do ISVZ	MU	1 d	10.12. 10	11.12. 10																	
97	předání zadávací dokumentace MŠMT	MU	1 d	10.12. 10	11.12. 10																	
98	uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v ISVZ	ISVZ	12 d	11.12. 10	23.12. 10																	
99	uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v TED	ISVZ	13 d	11.12. 10	24.12. 10																	
100	zpracování nabídek	UCH	41 d	24.12. 10	3.2. 11																	
101	posouzení a hodnocení nabídek	MU	13 d	3.2. 11	16.2. 11																	
102	rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky	MU	1 d	16.2. 11	17.2. 11																	
103	doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dodavatelům	MU	6 d	17.2. 11	23.2. 11																	
104	lhůta pro podání námitek	UCH	15 d	23.2. 11	10.3. 11																	
105	řešení námitek	MU	30 d	10.3. 11	9.4. 11																	




Řídicí harmonogram investičních akcí v areálu UKB MU


Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace

ID	Název činnosti, milniku, části	Zajišť	Trv.	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 2, 2009			Čtvrt. 3, 2009			Čtvrt. 4, 2009			Čtvrt. 1, 2010			Čtvrt. 2, 2010			Čtvrt. 3,	
						IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
106	uzavření smlouvy o dílo	MU, DOS	5 d	9.4. 11	14.4. 11																	
107	realizace dodávky		35 d	31.8. 11	5.10. 11																	
108	předání stanoviště	MU	5 d	31.8. 11	5.9. 11																	
109	předání a převzetí	DOS, MU	30 d	5.9. 11	5.10. 11																	
110																						
111	Ostatní přímé dodávky		435 d	21.9. 10	30.11. 11																	
112	žadavací řízení		190 d	21.9. 10	30.3. 11																	
113	podklady pro zadání zakázky	MU	45 d	21.9. 10	5.11. 10																	
114	zpracování žadavací dokumentace	MU	20 d	5.11. 10	25.11. 10																	
115	odeslání oznámení o zahájení žadavacího řízení do ISVZ	MU	1 d	25.11. 10	26.11. 10																	
116	předání žadavací dokumentace MŠMT	MU	1 d	25.11. 10	26.11. 10																	
117	uveřejnění oznámení o zahájení žadavacího řízení v ISVZ	ISVZ	12 d	26.11. 10	8.12. 10																	
118	uveřejnění oznámení o zahájení žadavacího řízení v TED	ISVZ	13 d	26.11. 10	9.12. 10																	
119	zpracování nabídek	UCH	41 d	9.12. 10	19.1. 11																	
120	posouzení a hodnocení nabídek	MU	13 d	19.1. 11	1.2. 11																	
121	rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky	MU	1 d	1.2. 11	2.2. 11																	
122	doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dodavatelům	MU	6 d	2.2. 11	8.2. 11																	
123	lhůta pro podání námitek	UCH	15 d	8.2. 11	23.2. 11																	
124	řešení námitek	MU	30 d	23.2. 11	25.3. 11																	
125	uzavření smlouvy o dílo	MU, DPD	5 d	25.3. 11	30.3. 11																	
126	realizace dodávek		115 d	7.8. 11	30.11. 11																	
127	předání stanoviště	MU	5 d	7.8. 11	12.8. 11																	
128	předání a převzetí	MU, DPD	110 d	12.8. 11	30.11. 11																	
129																						
130	Uvedení do provozu		101 d	31.8. 11	10.12. 11																	
131	kolaudační řízení	SÚ	30 d	31.8. 11	30.9. 11																	
132	kolaudační rozhodnutí - nabytí právní moci	SÚ	20 d	30.9. 11	20.10. 11																	
133	stěhování	MU	20 d	20.11. 11	10.12. 11																	
134																						
135																						
136	INVESTIČNÍ AKCE CEITEC		1513 d	1.5. 09	22.6. 13																	
137	Zadání projektu		403 d	1.5. 09	8.6. 10																	
138	návrh projektu CEITEC	MU	130 d	1.5. 09	8.9. 09																	
139	předání návrhu zadání projektu CEITEC MŠMT	MU	0 d	8.9. 09	8.9. 09																	
140	schválení zadání projektu CEITEC MŠMT	MŠMT	273 d	8.9. 09	8.6. 10																	

Řídicí harmonogram investičních akcí v areálu UKB MU

Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace

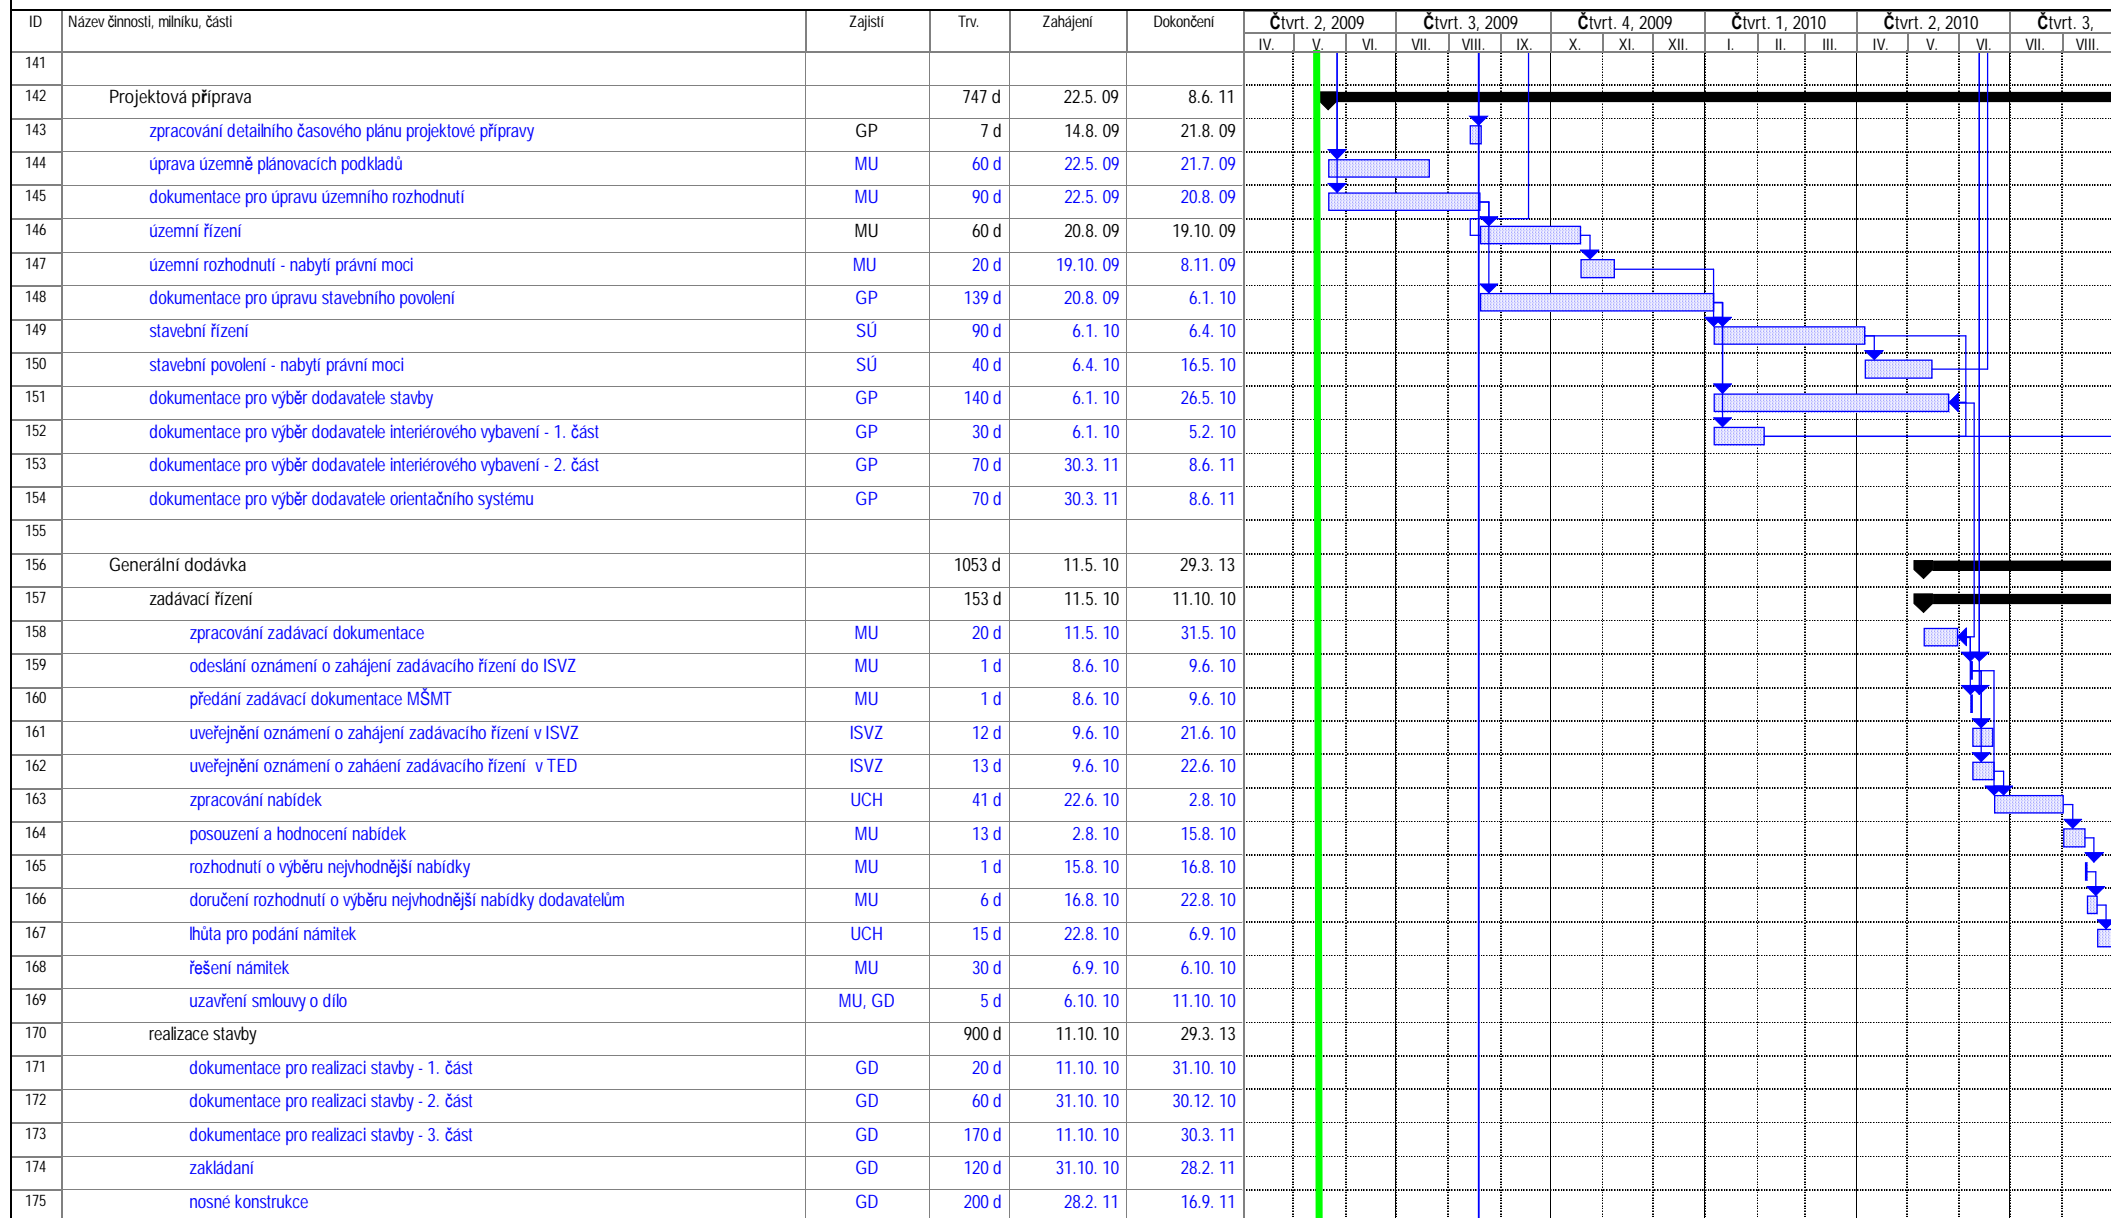



Řídicí harmonogram investičních akcí v areálu UKB MU

Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace

ID	Název činnosti, milníku, části	Zajišť	Trv.	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 2, 2009			Čtvrt. 3, 2009			Čtvrt. 4, 2009			Čtvrt. 1, 2010			Čtvrt. 2, 2010			Čtvrt. 3,	
						IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
176	hrubá stavba	GD	300 d	16.9. 11	12.7. 12																	
177	připravenost pro montáž interiéru	GD	210 d	12.7. 12	7.2. 13																	
178	předání a převzetí	GD, MU	260 d	12.7. 12	29.3. 13																	
179																						
180	Dodávka interiérového vybavení		745 d	19.5. 11	2.6. 13																	
181	žadavací řízení		155 d	19.5. 11	21.10. 11																	
182	zpracování žadavací dokumentace	MU	30 d	19.5. 11	18.6. 11																	
183	odeslání oznámení o zahájení žadavacího řízení do ISVZ	MU	1 d	18.6. 11	19.6. 11																	
184	předání žadavací dokumentace MŠMT	MU	1 d	18.6. 11	19.6. 11																	
185	uveřejnění oznámení o zahájení žadavacího řízení v ISVZ	ISVZ	12 d	19.6. 11	1.7. 11																	
186	uveřejnění oznámení o zahájení žadavacího řízení v TED	ISVZ	13 d	19.6. 11	2.7. 11																	
187	zpracování nabídek	UCH	41 d	2.7. 11	12.8. 11																	
188	posouzení a hodnocení nabídek	MU	13 d	12.8. 11	25.8. 11																	
189	rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky	MU	1 d	25.8. 11	26.8. 11																	
190	doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dodavatelům	MU	6 d	26.8. 11	1.9. 11																	
191	lhůta pro podání námitek	UCH	15 d	1.9. 11	16.9. 11																	
192	řešení námitek	MU	30 d	16.9. 11	16.10. 11																	
193	uzavření smlouvy o dílo	DI,MU	5 d	16.10. 11	21.10. 11																	
194	realizace dodávky		590 d	21.10. 11	2.6. 13																	
195	příprava výroby a výroba	DI	140 d	21.10. 11	9.3. 12																	
196	předání stanoviště	MU	5 d	7.2. 13	12.2. 13																	
197	montáž zařízení podmiňujících doladění VZT	DI	15 d	12.2. 13	27.2. 13																	
198	předání a převzetí	DI, MU	110 d	12.2. 13	2.6. 13																	
199																						
200	Dodávka orientačního systému stavby		715 d	19.5. 11	3.5. 13																	
201	žadavací řízení		155 d	19.5. 11	21.10. 11																	
202	zpracování žadavací dokumentace	MU	30 d	19.5. 11	18.6. 11																	
203	odeslání oznámení o zahájení žadavacího řízení do ISVZ	MU	1 d	18.6. 11	19.6. 11																	
204	předání žadavací dokumentace MŠMT	MU	1 d	18.6. 11	19.6. 11																	
205	uveřejnění oznámení o zahájení žadavacího řízení v ISVZ	ISVZ	12 d	19.6. 11	1.7. 11																	
206	uveřejnění oznámení o zahájení žadavacího řízení v TED	ISVZ	13 d	19.6. 11	2.7. 11																	
207	zpracování nabídek	UCH	41 d	2.7. 11	12.8. 11																	
208	posouzení a hodnocení nabídek	MU	13 d	12.8. 11	25.8. 11																	
209	rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky	MU	1 d	25.8. 11	26.8. 11																	
210	doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dodavatelům	MU	6 d	26.8. 11	1.9. 11																	


Řídicí harmonogram investičních akcí v areálu UKB MU


Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace

ID	Název činnosti, milníku, části	Zajišť	Trv.	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 2, 2009			Čtvrt. 3, 2009			Čtvrt. 4, 2009			Čtvrt. 1, 2010			Čtvrt. 2, 2010			Čtvrt. 3,	
						IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
211	lhůta pro podání námitek	UCH	15 d	1.9. 11	16.9. 11																	
212	řešení námitek	MU	30 d	16.9. 11	16.10. 11																	
213	uzavření smlouvy o dílo	DOS,MU	5 d	16.10. 11	21.10. 11																	
214	realizace dodávky		35 d	29.3. 13	3.5. 13																	
215	předání stanovítě		5 d	29.3. 13	3.4. 13																	
216	předání a převzetí		30 d	3.4. 13	3.5. 13																	
217																						
218	Ostatní přímé dodávky		795 d	30.3. 11	2.6. 13																	
219	zadávací řízení		190 d	30.3. 11	6.10. 11																	
220	podklady pro zadání zakázky	MU	45 d	30.3. 11	14.5. 11																	
221	zpracování zadávací dokumentace	MU	20 d	14.5. 11	3.6. 11																	
222	odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do ISVZ	MU	1 d	3.6. 11	4.6. 11																	
223	předání zadávací dokumentace MŠMT	MU	1 d	3.6. 11	4.6. 11																	
224	uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v ISVZ	ISVZ	12 d	4.6. 11	16.6. 11																	
225	uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v TED	ISVZ	13 d	4.6. 11	17.6. 11																	
226	zpracování nabídek	UCH	41 d	17.6. 11	28.7. 11																	
227	posouzení a hodnocení nabídek	MU	13 d	28.7. 11	10.8. 11																	
228	rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky	MU	1 d	10.8. 11	11.8. 11																	
229	doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dodavatelům	MU	6 d	11.8. 11	17.8. 11																	
230	lhůta pro podání námitek	UCH	15 d	17.8. 11	1.9. 11																	
231	řešení námitek	MU	30 d	1.9. 11	1.10. 11																	
232	uzavření smlouvy o dílo	MU, DPD	5 d	1.10. 11	6.10. 11																	
233	realizace dodávek		115 d	7.2. 13	2.6. 13																	
234	předání stanovítě	MU	5 d	7.2. 13	12.2. 13																	
235	předání a převzetí	DPD, MU	110 d	12.2. 13	2.6. 13																	
236																						
237	Uvedení do provozu		85 d	29.3. 13	22.6. 13																	
238	kolaudační řízení	SŮ	30 d	29.3. 13	28.4. 13																	
239	kolaudační rozhodnutí - nabytí právní moci	SŮ	20 d	28.4. 13	18.5. 13																	
240	stěhování	MU	20 d	2.6. 13	22.6. 13																	
241																						
242																						
243																						
244	INVESTIČNÍ AKCE BIOREDUC		1230 d	14.8. 09	26.12. 12																	
245	Zadání projektu		266 d	7.9. 09	31.5. 10																	

Řídicí harmonogram investičních akcí v areálu UKB MU

Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace

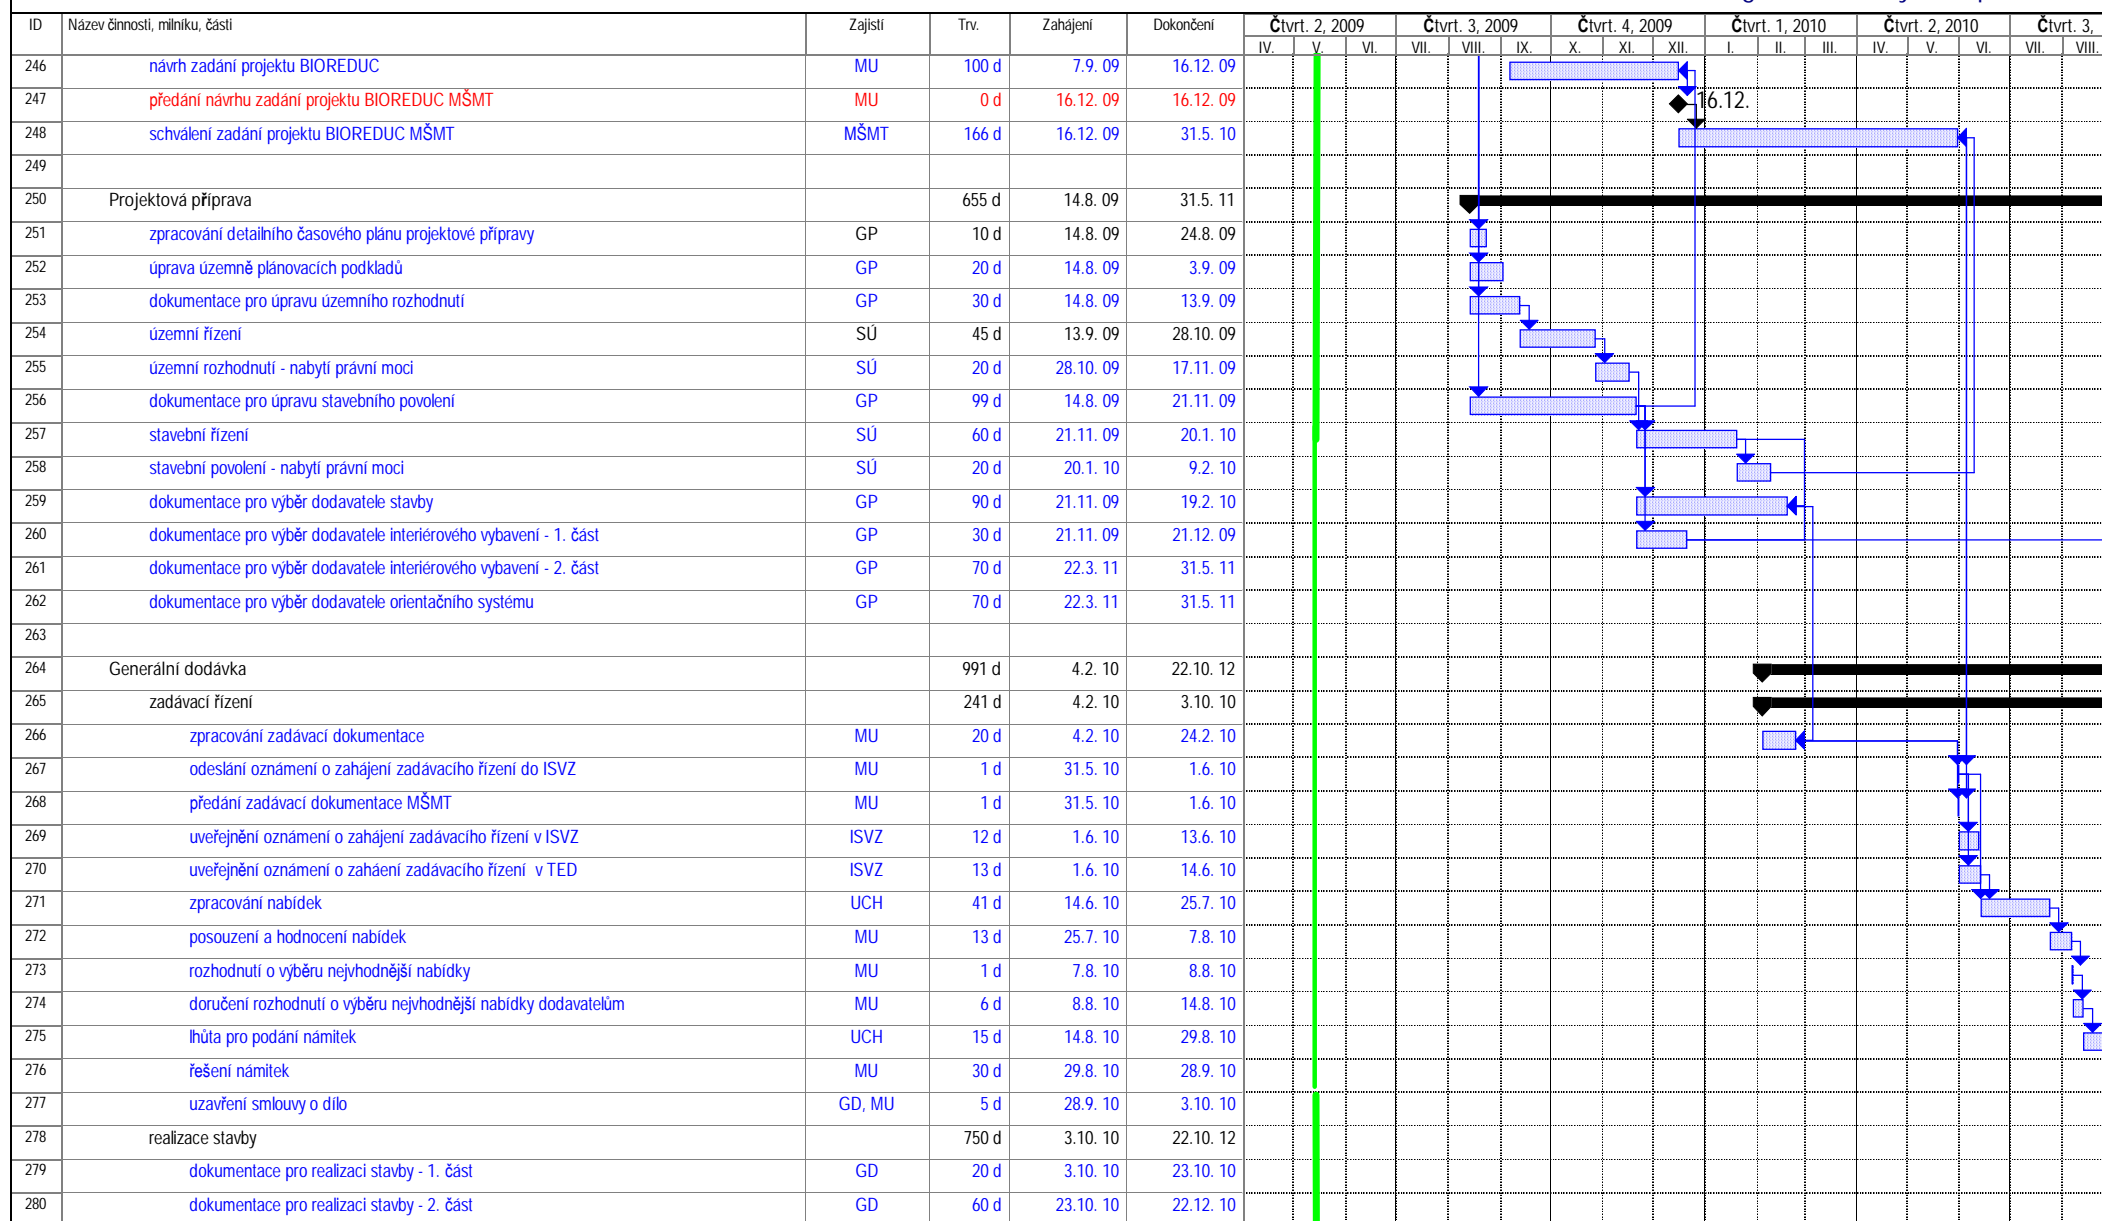



Řídicí harmonogram investičních akcí v areálu UKB MU

Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace

ID	Název činnosti, milníku, části	Zajišť	Trv.	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 2, 2009			Čtvrt. 3, 2009			Čtvrt. 4, 2009			Čtvrt. 1, 2010			Čtvrt. 2, 2010			Čtvrt. 3,	
						IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
281	dokumentace pro realizaci stavby - 3. část	GD	170 d	3.10. 10	22.3. 11																	
282	zakládání	GD	130 d	23.10. 10	2.3. 11																	
283	nosné konstrukce	GD	200 d	2.3. 11	18.9. 11																	
284	hrubá stavba	GD	250 d	18.9. 11	25.5. 12																	
285	připravenost pro montáž interiéru	GD	110 d	25.5. 12	12.9. 12																	
286	předání a převzetí	GD, MU	150 d	25.5. 12	22.10. 12																	
287																						
288	Dodávka interiérového vybavení		565 d	21.5. 11	6.12. 12																	
289	žadavací řízení		145 d	21.5. 11	13.10. 11																	
290	zpracování žadavací dokumentace	MU	20 d	21.5. 11	10.6. 11																	
291	odeslání oznámení o zahájení žadavacího řízení do ISVZ	MU	1 d	10.6. 11	11.6. 11																	
292	předání žadavací dokumentace MŠMT	MU	1 d	10.6. 11	11.6. 11																	
293	uveřejnění oznámení o zahájení žadavacího řízení v ISVZ	ISVZ	12 d	11.6. 11	23.6. 11																	
294	uveřejnění oznámení o zahájení žadavacího řízení v TED	ISVZ	13 d	11.6. 11	24.6. 11																	
295	zpracování nabídek	UCH	41 d	24.6. 11	4.8. 11																	
296	posouzení a hodnocení nabídek	MU	13 d	4.8. 11	17.8. 11																	
297	rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky	MU	1 d	17.8. 11	18.8. 11																	
298	doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dodavatelům	MU	6 d	18.8. 11	24.8. 11																	
299	lhůta pro podání námitek	UCH	15 d	24.8. 11	8.9. 11																	
300	řešení námitek	MU	30 d	8.9. 11	8.10. 11																	
301	uzavření smlouvy o dílo	DI, MU	5 d	8.10. 11	13.10. 11																	
302	realizace dodávky		420 d	13.10. 11	6.12. 12																	
303	příprava výroby a výroba	DI	100 d	13.10. 11	21.1. 12																	
304	předání staniště	MU	5 d	12.9. 12	17.9. 12																	
305	montáž zařízení podmiňujících doladění VZT	DI	15 d	17.9. 12	2.10. 12																	
306	předání a převzetí	DI, MU	80 d	17.9. 12	6.12. 12																	
307																						
308	Dodávka orientačního systému stavby		565 d	11.5. 11	26.11. 12																	
309	žadavací řízení		155 d	11.5. 11	13.10. 11																	
310	zpracování žadavací dokumentace	MU	30 d	11.5. 11	10.6. 11																	
311	odeslání oznámení o zahájení žadavacího řízení do ISVZ	MU	1 d	10.6. 11	11.6. 11																	
312	předání žadavací dokumentace MŠMT	MU	1 d	10.6. 11	11.6. 11																	
313	uveřejnění oznámení o zahájení žadavacího řízení v ISVZ	ISVZ	12 d	11.6. 11	23.6. 11																	
314	uveřejnění oznámení o zahájení žadavacího řízení v TED	ISVZ	13 d	11.6. 11	24.6. 11																	
315	zpracování nabídek	UCH	41 d	24.6. 11	4.8. 11																	

Řídící harmonogram investičních akcí v areálu UKB MU

Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace

ID	Název činnosti, milniku, části	Zajišť	Trv.	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 2, 2009			Čtvrt. 3, 2009			Čtvrt. 4, 2009			Čtvrt. 1, 2010			Čtvrt. 2, 2010			Čtvrt. 3,	
						IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
316	posouzení a hodnocení nabídek	MU	13 d	4.8. 11	17.8. 11																	
317	rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky	MU	1 d	17.8. 11	18.8. 11																	
318	doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dodavatelům	MU	6 d	18.8. 11	24.8. 11																	
319	lhůta pro podání námitek	UCH	15 d	24.8. 11	8.9. 11																	
320	řesení námitek	MU	30 d	8.9. 11	8.10. 11																	
321	uzavření smlouvy o dílo	DOS, MU	5 d	8.10. 11	13.10. 11																	
322	realizace dodávky		35 d	22.10. 12	26.11. 12																	
323	předání stanovítě	MU	5 d	22.10. 12	27.10. 12																	
324	předání a převzetí	DOS, MU	30 d	27.10. 12	26.11. 12																	
325																						
326	Ostatní přímé dodávky		625 d	22.3. 11	6.12. 12																	
327	zadávací řízení		190 d	22.3. 11	28.9. 11																	
328	podklady pro zadání zakázky	MU	45 d	22.3. 11	6.5. 11																	
329	zpracování zadávací dokumentace	MU	20 d	6.5. 11	26.5. 11																	
330	odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do ISVZ	MU	1 d	26.5. 11	27.5. 11																	
331	předání zadávací dokumentace MŠMT	MU	1 d	26.5. 11	27.5. 11																	
332	uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v ISVZ	ISVZ	12 d	27.5. 11	8.6. 11																	
333	uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v TED	ISVZ	13 d	27.5. 11	9.6. 11																	
334	zpracování nabídek	UCH	41 d	9.6. 11	20.7. 11																	
335	posouzení a hodnocení nabídek	MU	13 d	20.7. 11	2.8. 11																	
336	rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky	MU	1 d	2.8. 11	3.8. 11																	
337	doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dodavatelům	MU	6 d	3.8. 11	9.8. 11																	
338	lhůta pro podání námitek	UCH	15 d	9.8. 11	24.8. 11																	
339	řesení námitek	MU	30 d	24.8. 11	23.9. 11																	
340	uzavření smlouvy o dílo	DOS, MU	5 d	23.9. 11	28.9. 11																	
341	realizace dodávek		85 d	12.9. 12	6.12. 12																	
342	předání stanovítě	MU	5 d	12.9. 12	17.9. 12																	
343	předání a převzetí	DOS, MU	80 d	17.9. 12	6.12. 12																	
344																						
345	Uvedení do provozu		65 d	22.10. 12	26.12. 12																	
346	kolaudační řízení	SÚ	30 d	22.10. 12	21.11. 12																	
347	kolaudační rozhodnutí - nabytí právní moci	SÚ	20 d	21.11. 12	11.12. 12																	
348	stěhování	MU	20 d	6.12. 12	26.12. 12																	





Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace

Revize: 1.7. 09 Strana : 11 / 20 Soubor : ridici_hmg_010709




Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace

Soubor : ridici_hmg_010709



Řídicí harmonogram investičních akcí v areálu UKB MU


Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace

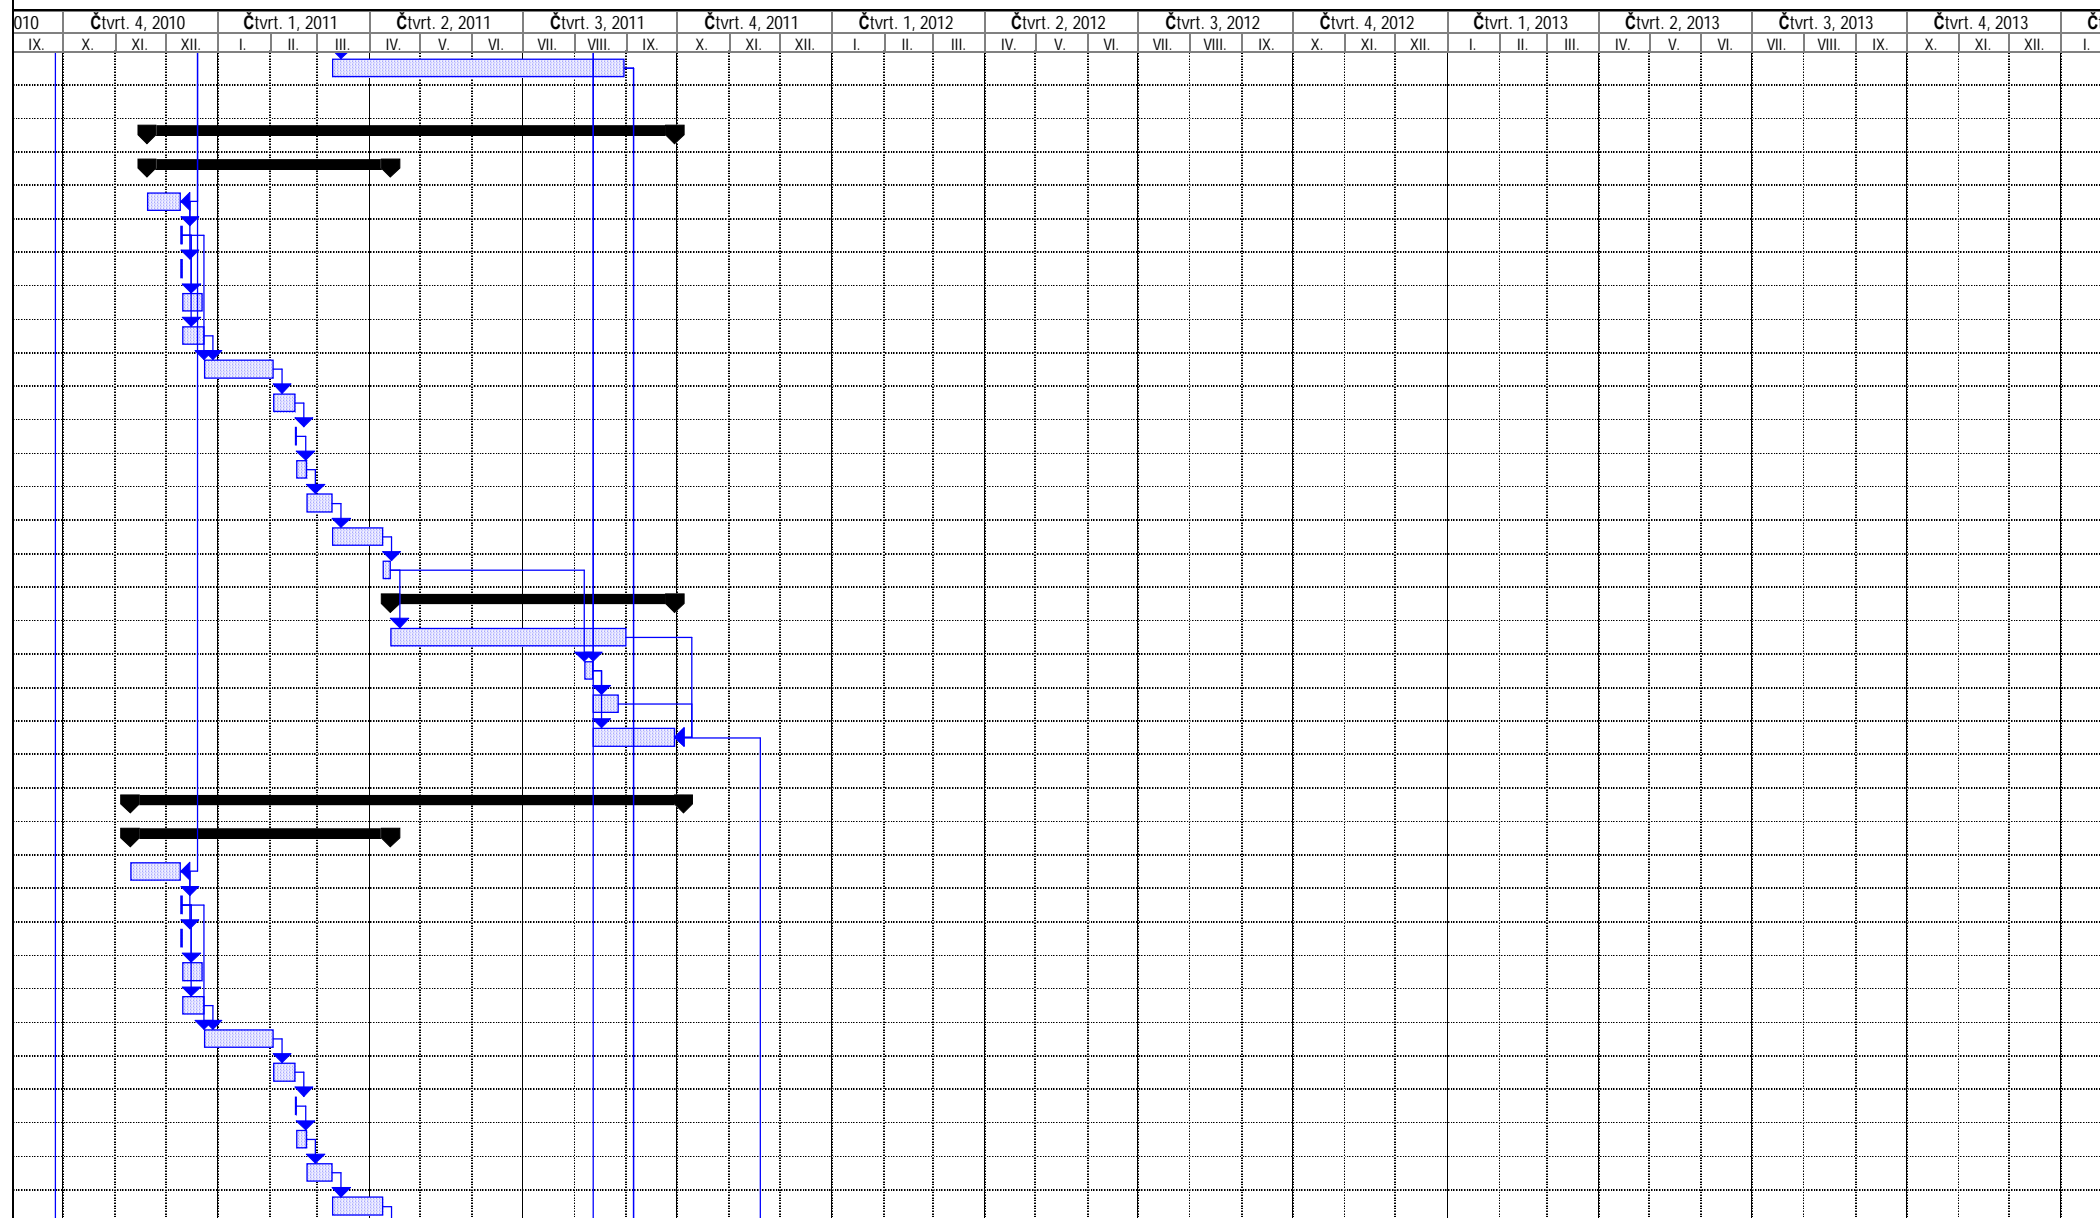




Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace






Řídicí harmonogram investičních akcí v areálu UKB MU

Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace

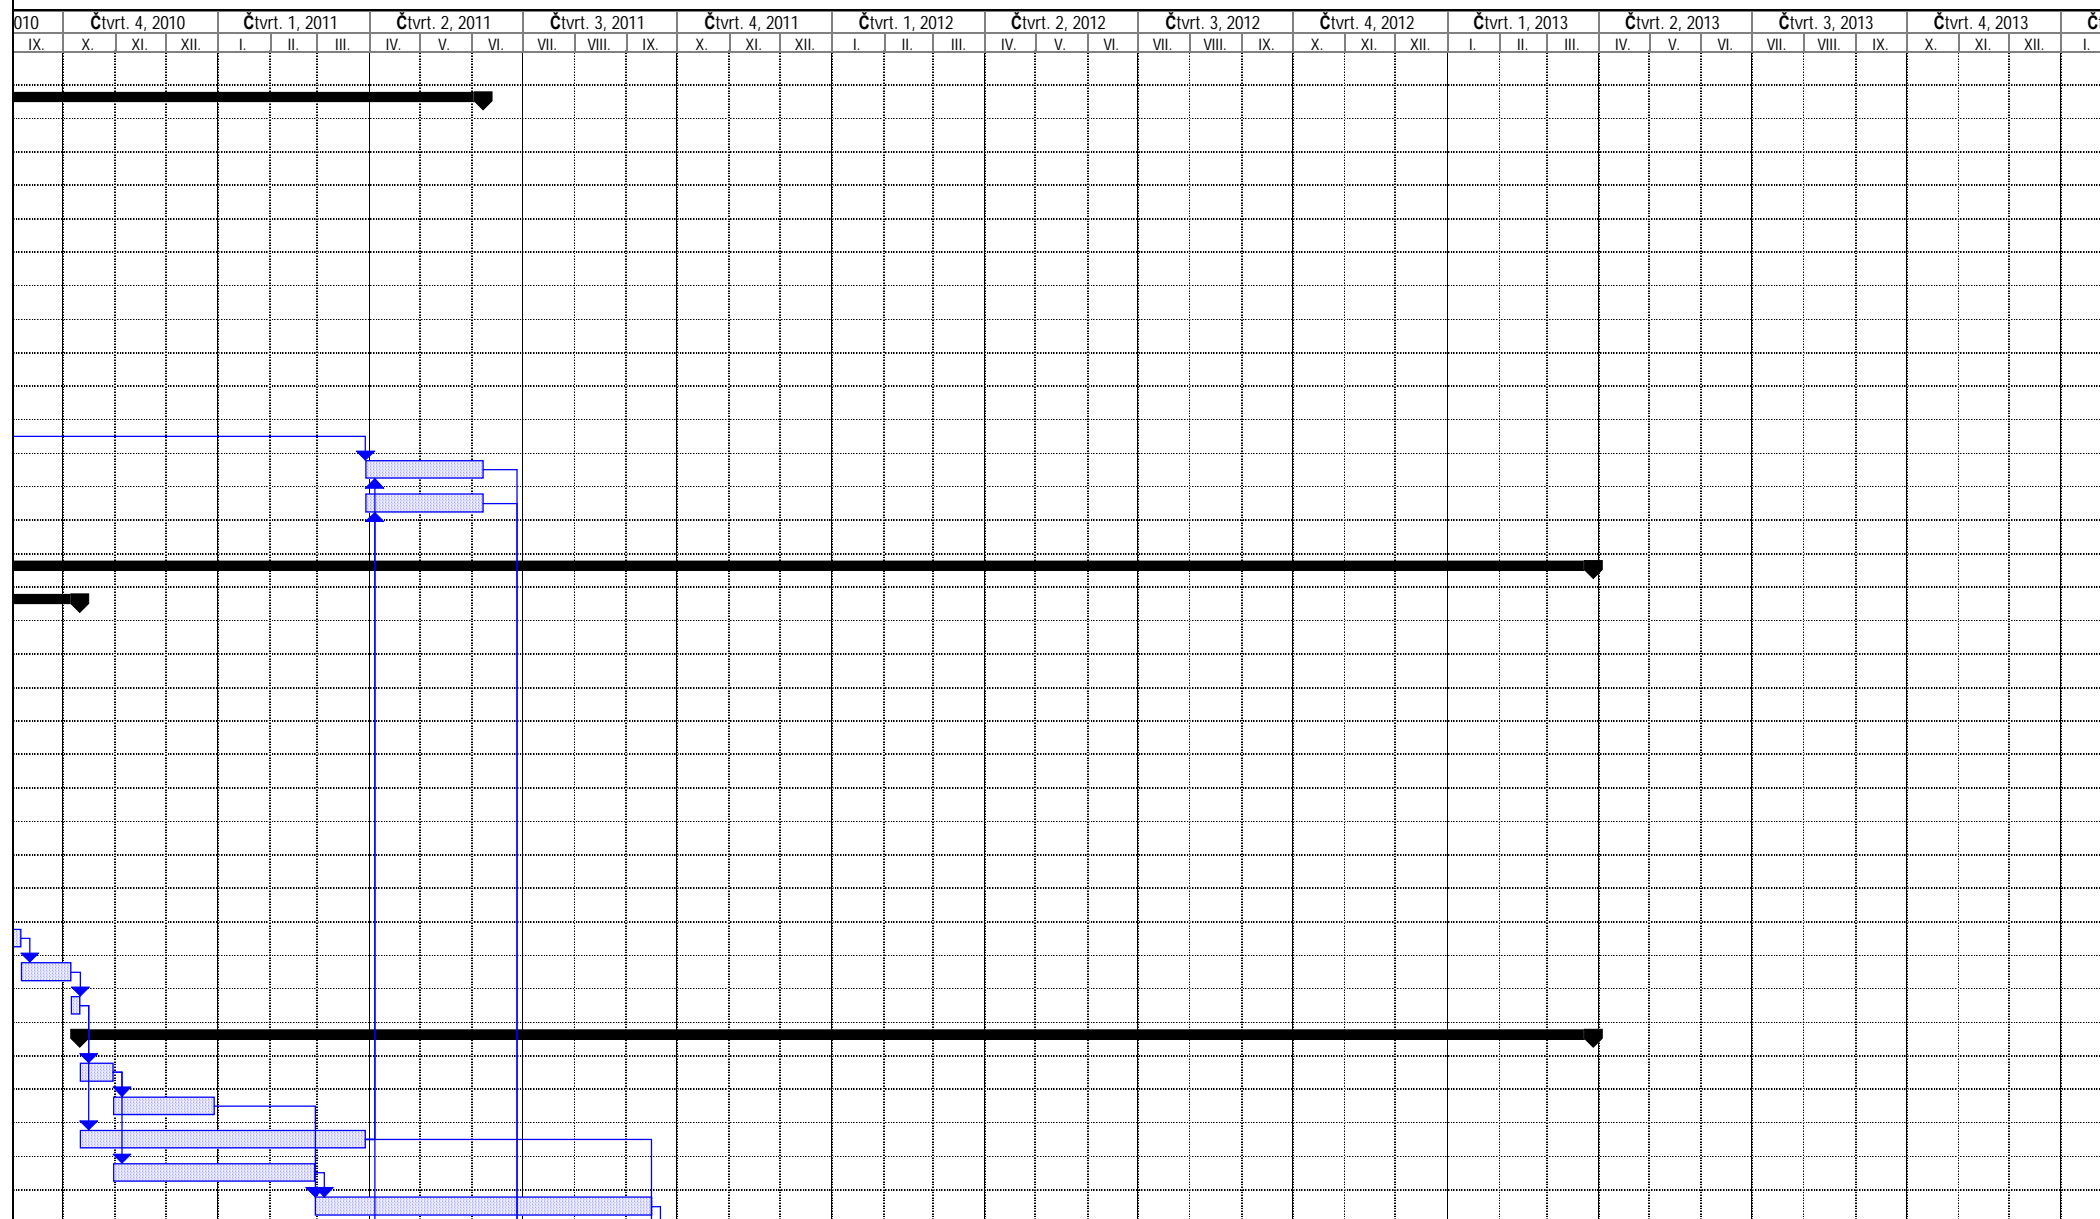





Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace






Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace






Řídicí harmonogram investičních akcí v areálu UKB MU


Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace

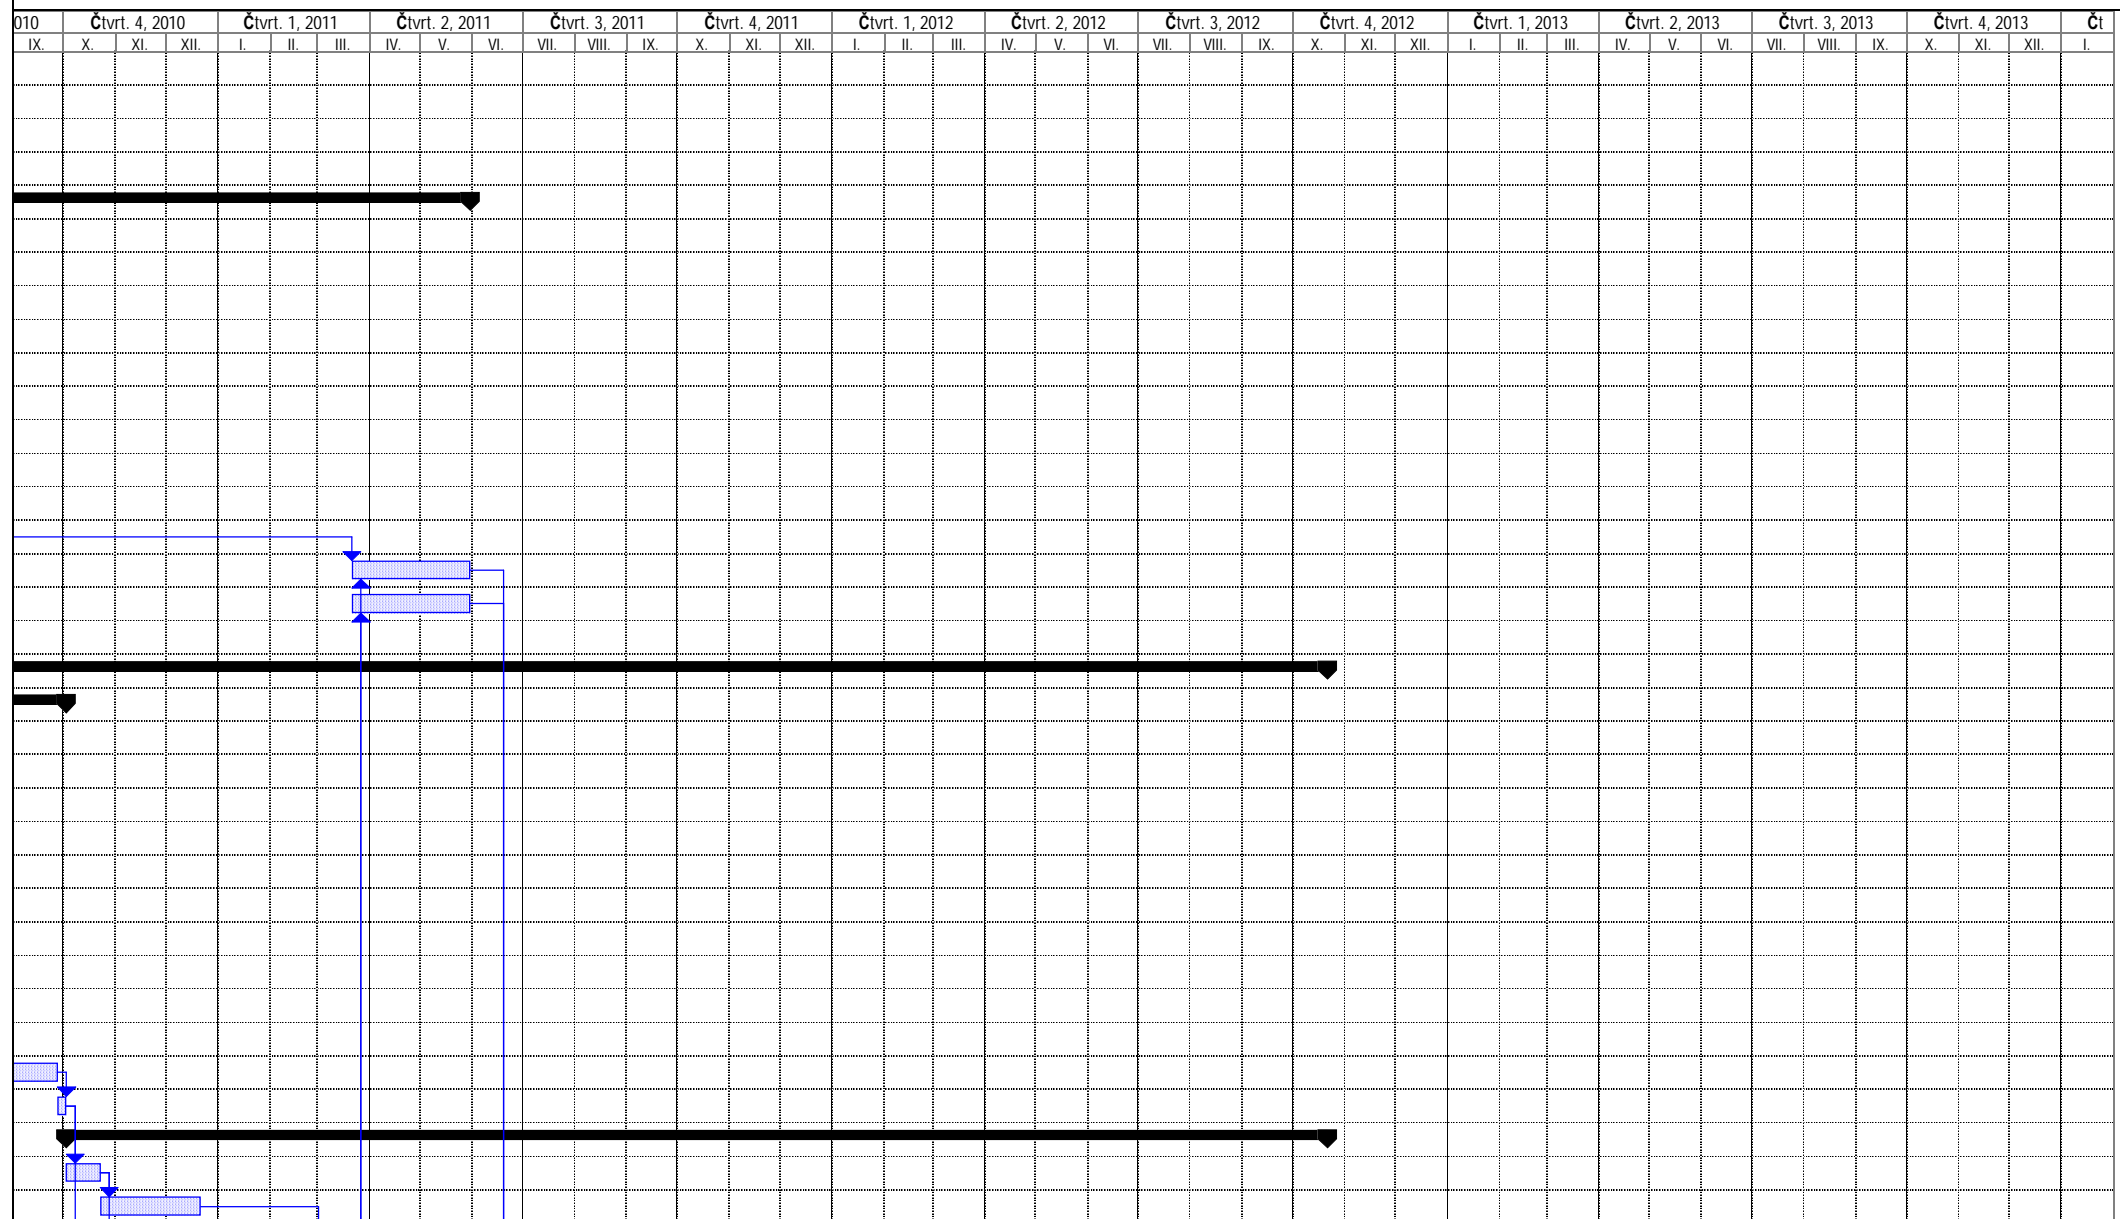



Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace





Řídící harmonogram investičních akcí v areálu UKB MU

Masarykova univerzita
Program Věda a výzkum pro inovace

