



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

III.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ZA ROK 2008

2008

Obsah:

1	IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU.....	3
2	PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU	11
2.1	Dosažený pokrok a jeho analýza	11
2.1.A	Informace o věcném pokroku operačního programu	11
2.1.B	Finanční údaje	15
2.1.C	Informace o rozpisu využití fondů	20
2.1.D	Pomoc podle cílových skupin	21
2.1.E	Vrácená nebo znovu použitá pomoc	21
2.1.F	Kvalitativní analýza.....	21
2.2	Informace o souladu s právními předpisy Společenství	23
2.3	Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění	25
2.4	Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu	26
2.5	Případná podstatná změna	26
2.6	Doplňkovost s jinými nástroji.....	26
2.7	Opatření k monitorování a evaluace	27
2.8	Případná národní výkonnostní rezerva	31
3	PROVÁDĚNÍ OP PODLE PRIORITNÍCH OS	32
3.1	Prioritní osa 1- Počáteční vzdělávání	32
3.1.1	Dosažený pokrok a jeho analýza	32
3.1.2	Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění.....	41
3.2	Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj	43
3.2.1	Dosažený pokrok a jeho analýza	44
3.2.2	Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění	45
3.3	Prioritní osa 3 – Další vzdělávání	46
3.3.1	Dosažený pokrok a jeho analýza	46
3.3.2	Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění.....	48
3.4	Prioritní osa 4a – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)	
	Prioritní osa 4b – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)	
	48	
3.4.1	Dosažený pokrok a jeho analýza	49
3.4.2	Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění	51
3.5	Prioritní osa 5a – Technická pomoc (cíl Konvergence).....	52
3.5.1	Dosažený pokrok a jeho analýza	53
3.5.2	Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění.....	54
4	PROGRAMY ESF: SOUDRŽNOST A ZAMĚŘENÍ	55
5	PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/ FOND SOUDRŽNOSTI.....	57
6	TECHNICKÁ POMOC.....	58
7	INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA.....	61
8	UŽÍVANÉ ZKRATKY	76

1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU

OPERAČNÍ PROGRAM	Dotčený cíl: Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
	Dotčená způsobilá oblast: NUTS II
	Střední Čechy CZ02
	Jihozápad CZ03
	Severozápad CZ04
	Severovýchod CZ05
VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ	Jihovýchod CZ06
	Střední Morava CZ07
	Moravskoslezsko CZ08
	Praha CZ01
	Programové období: 2007–2013
	Číslo programu (CCI): 2007CZ05UPO002
	Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
	Rok, za nějž se zpráva podává: 2008
	Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem: 17.6. 2009

Manažerské shrnutí

Výroční zpráva o provádění operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2008 podává podrobné informace o průběhu implementace OP VK v roce 2008. Zpráva v sedmi kapitolách zachycuje nejdůležitější aspekty implementace OP VK. Výroční zpráva je svou strukturou v souladu s požadavky Evropské komise a pokyny Národního orgánu pro koordinaci.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl jako jeden z prvních operačních programů schválen Evropskou komisí dne 12. října 2007. Celkový rozpočet OP VK představuje 2,15 mld. EUR, z toho 1,83 mld. EUR z ESF a 0,32 mld. EUR jako spolufinancování z národních zdrojů.

V roce 2008 bylo dosaženo významného pokroku především při vyhlásování výzev a schvalování projektů. V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo vyhlášeno celkem 57 výzev, z nichž 4 byly určeny ZS – krajům k předkládání globálních grantů, kterých bylo následně schváleno 39. Kraje vyhlásily a administrovaly v rámci GG 42 výzev pro předkládání grantových projektů, kterých bylo do konce roku 2008 schváleno 502. Zbýlých 11 výzev vyhlášoval Řídící orgán - pro předkládání individuálních projektů ostatních (5 výzev), individuálních projektů národních (4 výzvy) a projekty technické pomoci (2 výzvy). Schváleno bylo 48 projektů technické pomoci a 6 individuálních projektů národních. Celkem bylo v OP VK (mimo GG) předloženo 2856 projektových žádostí a schváleno 556 projektů za 112 218 460 EUR.

Z hlediska počtu schválených projektů dosáhla největšího pokroku PO 1 – Počáteční vzdělávání, kde bylo schváleno 502 projektů v celkovém objemu 87 569 021 EUR. Proces hodnocení a výběru projektů, který v roce 2008 začal, většinou pokračoval až do roku 2009. Souhrnný přehled dle typů projektů uvádí následující tabulka. Jednotlivým PO se dále věnují jednotlivé podkapitoly Výroční zprávy.

Tab. č. 1: Souhrnný přehled o implementaci OP VK

Typ projektu	Vyhlašovatel	Počet výzev	Předložené projektové žádosti	Počet schválených projektů	Schválené projekty v EUR
IPn	ŘO	4	12	6	19 347 805
IPo	ŘO	5	663	0	0
GP	ZS	42	2109	502	87 569 021
IP TP	ŘO	2	60	48	5 301 634
Celkem		53	2856	556	112 218 460

Typ projektu	Vyhlašovatel	Počet výzev	Předložené žádosti	Počet schválených GG	Schválené GG v EUR
GG	ŘO	4	39	39	248 480 444

Zdroj: ZS a ŘO

Do konce roku 2008 nebyly příjemcům schváleny ze strany řídicího orgánu žádné žádosti o platbu. První žádosti o platbu budou ŘO schváleny v prvním pololetí roku 2009.

Od EK byly přijaty celkem dvě předběžné platby, a to dne 20. listopadu 2007 ve výši 36 574 295,62 EUR a dne 23. 4. 2008 ve výši 54 861 443,43 EUR. Jednalo se o 1. a 2. předběžnou platbu odpovídající 2 % a 3 % alokace OP VK.

Důležitého pokroku bylo rovněž dosaženo v oblasti metodických podkladů OP VK. V roce 2008 došlo ke třem aktualizacím Manuálu OP VK, dvěma aktualizacím Příručky pro žadatele finanční podpory z OP VK a publikování první verze Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK. K první úpravě manuálu došlo ke konci prvního čtvrtletí, kdy byla přijata verze č. 2. Tato verze byla platná do poloviny roku, kdy byla zveřejněna verze č. 3. Ke konci roku pak byla přijata verze č. 4. V návaznosti na manuál OP VK byly průběžně aktualizovány Směrnice Zprostředkujících subjektů a postupy administrace IP. Příručka pro žadatele byla aktualizována koncem března, kdy byla schválena verze č. 2. Tato verze byla přílohou Manuálu OP VK. Od poloviny roku byla platná verze č. 3, která vyšla již samostatně nikoli jako příloha Manuálu OP VK. V září 2008 pak byla vydána verze č. 4. Tento termín byl společný i pro publikaci první verze Příručky pro příjemce, která nebyla do konce roku měněna. Během roku byly rovněž vydány a aktualizovány metodické dopisy, které upravují specifické oblasti týkající se jak celé IS OP VK tak žadatelů a příjemců.

Na základě 2. a 3. jednání Monitorovacího výboru, které se uskutečnilo 18. 6. 2008 a 9. 12. 2008 byl aktualizován také Prováděcí dokument OP VK. Na 3. zasedání Monitorovací výbor odsouhlasil, aby do doby oficiální úpravy OP VK (a schválení této úpravy ze strany Evropské komise) byli do cílových skupin v oblasti podpory 1.3 (pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení) zahrnováni také učitelé mateřských škol.

V roce 2008 byly nastavovány mechanismy pro koordinaci a realizaci synergických efektů, plynoucích z věcné komplementarity s dalšími tematickými operačními programy a návaznosti na Regionální operační programy

V oblasti monitorování probíhalo nastavování informačního systému Monit7+ a Benefit7. Pro potřeby administrace projektů byl vytvořen Hodnotitelský modul (HoMo CDH), který je doplňkem k systému Monit7+ v oblasti věcného hodnocení. Ke konci roku byla zahájena příprava aplikace Web Pomocník, který bude jedním z nástrojů publicity a bude sloužit pro komunikaci mezi ŘO a veřejností. V průběhu roku 2008 došlo k 1. zasedání pracovní skupiny pro evaluaci koordinované MMR, jejíž členem je rovněž zástupce OP VK.

Počátkem roku 2008 probíhal reaudit tzv. auditu shody, prováděný na zakázku Auditního orgánu auditorskou firmou PriceWaterhouseCoopers. Účelem reauditů bylo ověřit plnění opatření přijatých k řešení nedostatků zjištěných v rámci auditu uskutečněného v roce 2007. V rámci reauditů byly podrobně zkoumány veškeré postupy a procesy nastavené v Manuálu OP VK a jeho přílohách. V září 2008 bylo konstatováno, že všechny významné nesoulady systému OP VK s čl. 71 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, byly odstraněny a nastavení systému implementace OP VK je bez výhrad.

V září 2008 byl přes informační systém SFC2007 Evropské komisi odeslán Popis řídicích a kontrolních systémů OP VK, jehož schválení je předpokladem pro zahájení certifikace výdajů. Připomínky k Popisu řídicích a kontrolních systémů byly konzultovány s Evropskou komisí. ŘO k 31.12. 2008 neobdržel oficiální vyjádření.

Publicita OP VK byla zajištěna jak ze strany ŘO tak ze strany ZS v souladu s jednotlivými KoP. V roce 2008 byl v oblasti informovanosti, propagace a podpory absorpční kapacity využit tisk, rozhlas a internet, účast na konferencích a veletrzích, uspořádány informační semináře a odborné kulaté stoly, vydávány propagační předměty a informační materiály. Pro podporu úspěšné komunikace byl rozpracován jednotný vizuální styl programu. Informovanost o plánovaných akcích a dokončených materiálech byla zajištěna rovněž formou databázového mailingu registrovaným zájemcům, písemnou formou, telefonickým i osobním kontaktem, a to ze strany všech subjektů zapojených do implementace OP VK.

Problémy, které se vyskytly při implementaci programu, jsou dále popsány v této výroční zprávě. ŘO a ZS řešily průběžně tyto problémy a přijaly opatření k nápravě.

Identifikace operačního programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) se zaměřuje na podporu v oblastech, které přispějí k rozvoji potenciálu populace ČR, a na vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání a učení. OP VK definuje zaměření a hloubku intervencí v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení a utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulaci spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnou a výrobní sférou.

V rámci celkového finančního plánu alokace pro ČR pro Cíl Konvergence v letech 2007 – 2013 je na OP VK alokováno 7 % prostředků strukturálních fondů EU pro ČR, tj. 1 811 mil. €.

OP VK byl přijat Usnesením vlády ČR č. 821 ze dne 28. června 2006 a schválen usnesením vlády ČR č. 1302 ze dne 15. listopadu 2006. Dne 12. října 2007 byl pak schválen Evropskou komisí.

Program byl připraven v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a s Nařízením Rady (ES) č. 1081/2006 a je plně v souladu s usnesením vlády ČR č. 175/2006 ze dne 22. února 2006.

Při tvorbě programu byly reflektovány všechny základní dokumenty, které stanoví základní priority v oblasti politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti na evropské a národní úrovni. V první řadě se jedná o Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost, jejichž hlavní zásady byly současně uplatněny při tvorbě dokumentů na národní úrovni.

Zásadními národními dokumenty pro koncipování OP VK byl Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013 určující prioritní osy a specifické cíle. Dále se vycházelo z Národního Lisabonského programu 2005 - 2008 – Národního programu reformy ČR, Národního rozvojového plánu 2007 - 2013 a Strategie hospodářského růstu 2005-2013. Z materiálů, které se specificky věnují oblasti rozvoje lidských zdrojů, byly zásadními Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR a následný Program realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů.

Z hlediska naplňování cílů NSRR zajišťuje OP VK především plnění strategického cíle II – Otevřená flexibilní a soudržná společnost, a do určité míry i strategického cíle I – Konkurenceschopná česká ekonomika.

Samostatný OP VK je vázán na realizaci cíle NPR, ve kterém jsou stanovena opatření na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti v souladu s Lisabonskou strategií. Tato vazba je explicitně vyjádřena v globálním cíli programu. OP VK je z hlediska cílů provázán s dalšími operačními programy, které se rovněž podílejí na naplňování cíle Lisabonské strategie, tj. posílení znalostní ekonomiky, stimulace růstu zaměstnanosti a konkurenceschopnosti členských států EU.

OP VK přímo řeší otázky spojené s rozvojem potenciálu české populace prostřednictvím vzdělávání. Řešení této problematiky podpoří rovněž další operační programy, a to především OP Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu a především se soustřeďuje na podporu zaměstnanosti osob zaměstnaných i nezaměstnaných prostřednictvím vytváření pracovních míst, dalším vzděláváním a sociální integrací znevýhodněných skupin obyvatelstva. Investice do lidí prostřednictvím intervencí ESF v programu OP VK jsou navázány na další operační programy a to na OP Výzkum a vývoj pro inovace a OP Podnikání a Inovace, jejichž intervence podporované z Evropského fondu pro regionální rozvoj vytvářejí vhodné kapacity, pro které je rozvoj lidských zdrojů a s ním spojené vhodné nastavení intervencí do vzdělávání rozhodující. OP VK je věcně

komplementární rovněž s dalším tematickým operačním programem Životní prostředí a Operačním programem Praha Adaptabilita. Tato doplňkovost umožňuje vytvářet mezi projekty financovanými prostřednictvím některého z operačních programů synergické efekty.

Synergický efekt se dále umocňuje v prostředí jednotlivých regionálních operačních programů, které navazují na systém sektorových operačních programů a své dotační tituly směřují k řešení problémů vázaných na konkrétní region ČR.

Zacílení podpory na potřeby daného regionu zohledňuje rovněž decentralizovaný systém podpory OP VK. V souladu s čl. 42 43 Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 byly v průběhu prosince 2007 a ledna 2008 uzavřeny dohody o delegování činností mezi Řídícím orgánem a Zprostředkujícími subjekty. Zprostředkujícím subjektem implementační struktury OP VK pro potřeby realizace globálních grantů v rámci všech oblastí podpor prioritní osy 1 a oblasti podpory 3.2 prioritní osy 3 je 13 krajů ČR (mimo hl.m. Prahy).

Potřeby jednotlivých oblastí ČR jsou rovněž podpořeny Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM) , který umožňuje dosažení významné koncentrace investic a zajišťuje synergické působení jednotlivých projektů, kterými města realizují svoje strategické rozvojové cíle a priority.

Cíle OP VK

Globální cíl OP VK

Globálním cílem OP VK 2007 – 2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifické cíle OP VK

Specifické cíle představují cesty, které povedou k naplnění globálního cíle.

Specifickými cíli OP VK jsou:

1. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantující uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
2. Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativité absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.
3. Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.
4. Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

Specifické cíle spadají do rámce prioritní osy NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnost a Konkurenceschopná česká ekonomika. Všechny specifické cíle tvoří konzistentní celek obsahového návrhu a zaměření prioritních os OP VK.

Identifikace prioritních os OP VK

OP VK obsahuje pět prioritních os včetně technické pomoci, které jsou dále členěny do jednotlivých oblastí podpory. OP je koncipován jako víceúčelový program, což umožňuje financovat zásadní národní intervence a zajistit, že systémové akce mají jednotný charakter v obou cílech, které jsou relevantní pro území ČR. Víceúčelovost se týká prioritních os 4a a 4b zaměřených na vytvoření systémového rámce celoživotního učení a je realizována prostřednictvím systémových projektů na národní úrovni, které jdou napříč počátečním, terciárním i dalším vzděláváním. Víceúčelovost rovněž zahrnuje prioritní osy technické pomoci 5a a 5b.

Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání¹

Oblasti podpory:

- 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
- 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblasti podpory:

- 2.1 Vyšší odborné vzdělávání
- 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
- 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
- 2.4 Partnerství a sítě

Prioritní osa 3 - Další vzdělávání

Oblasti podpory:

- 3.1 Individuální další vzdělávání
- 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Prioritní osy 4a a 4b - Systémový rámec celoživotního učení

Oblasti podpory:

- 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání
- 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
- 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání

Prioritní osy 5a a 5b - Technická pomoc

Oblasti podpory:

¹ Pro účely této priority je pod termínem počáteční vzdělávání vnímáno primární a sekundární vzdělávání.

- 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
- 5.2 Informovanost a publicita programu
- 5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program

2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU

2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu

Monitorovací výbor

Dne 18. června 2008 se konalo 2. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (MV OP VK). Na jeho jednání byly projednány a schváleny aktualizace Prováděcího dokumentu OP VK, projednána a schválena Výroční zpráva OP VK za rok 2007. Výbor byl rovněž obeznámen s hlasováním „per rollam“ v uplynulém období a se změnou Statutu MV OP VK. Dále byl informován o průběhu implementace OP VK, čerpání Technické pomoci a realizaci Komunikačního plánu.

3. zasedání MV OP VK se uskutečnilo 9. prosince 2008. Na jeho jednání byla projednána a schválena další aktualizace Prováděcího dokumentu OP VK. Výbor byl obeznámen s Pololetní zprávou OP VK za období 1. 1. - 30. 6. 2008, hlasováním „per rollam“ v uplynulém období a se změnou Statutu MV OP VK. Dále byl informován o průběhu implementace OP VK, čerpání Technické pomoci, realizaci Komunikačního plánu a Evaluačním plánu, který se bude realizovat v roce 2009.

Zástupce EK seznámil přítomné s návrhem opatření, kterými chce EK řešit v rovině Strukturálních fondů dopady současné finanční krize (zjednodušení v oblasti nepřímých nákladů a také v oblasti nákladů přímých; navýšení záloh pro ČR nad rámec toho, co formou záloh zatím dostává; možnost změnit zaměření Operačních programů).

Manuál OP VK

Manuál OP VK navazuje na vyšší programové dokumenty, kterými jsou OP VK a Prováděcí dokument OP VK. Jde o dokument, který do detailů popisuje procesy a postupy implementace programu.

Manuál je průběžně revidován zpravidla dvakrát do roka tak, aby na jedné straně byla zajištěna flexibilita systému a na straně druhé jeho stabilita.

V březnu 2008 byla poradou vedení MŠMT projednána 2. verze Manuálu OP VK, která byla dne 25. března 2008 schválena ministrem školství, mládeže a tělovýchovy O. Liškou.

Dne 16. května 2008 firma PricewaterhouseCoopers zaslala MŠMT připomínky vzešlé z provedení dodatečných auditních prací, které byly zapracovány do 3. verze Manuálu OP VK. Z této verze Manuálu OP VK byla vyňata Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK a Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK. Z důvodu případných častějších revizí se tyto příručky staly samostatnými dokumenty.

V červnu 2008 byla vedením MŠMT projednána 3. verze Manuálu OP VK a dne 30. června 2008 byla schválena ministrem školství, mládeže a tělovýchovy O. Liškou.

V prosinci 2008 byla poradou vedení MŠMT projednána 4. verze Manuálu OP VK, která byla dne 8. prosince 2008 schválena ministrem školství, mládeže a tělovýchovy O. Liškou.

Indikátory OP VK

Následující tabulka obsahuje indikátory OP VK, na jejichž základě je posuzován pokrok v jeho realizaci. Program byl zahájen na konci roku 2007. Vzhledem k fázi implementace

programu a dostupnosti dat za rok 2008 není možné v této oblasti sledovat výrazný věcný pokrok operačního programu.

Tab. č. 2: Informace o věcném pokroku OP VK

Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	Cílová hodnota 2015	Celkem
062000 výstup	Podíl absolventů středního vzdělávání (maturita) ²	%	ÚIV ČSÚ	dosažená	57,52	59,52	N/A	59,52
				výchozí	58,90	57,52	N/A	N/A
				plánovaná	N/A	N/A	59	59
062500 výsledek	Podíl studujících v terciárním vzdělávání ³	%	ÚIV ČSÚ	dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A
				výchozí	45	N/A	N/A	N/A
				plánovaná	N/A	N/A	55	55
064100 výsledek	Podíl obyvatel ve věku 25-64 let účastnících se dalšího vzdělávání (Life- long learning) na populaci 25-64 let	%	ČSÚ Eurostat	dosažená	5,7	N/A ⁴	N/A	N/A
				výchozí	5,6	5,7	N/A	N/A
				plánovaná	N/A	N/A	10	10
064310 výstup	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů	počet	MS OP VK	dosažená	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	10 395	10 395
064330 dopady	Uplatnění absolventů podle typu dosaženého vzdělání	evaluační studie	externí zpracovatelé	dosažená	Provedení evaluační studie 3x za programovací období - na počátku roku 2008 ⁵ a v 2013 a 2015			
				výchozí				
				plánovaná				
074600 výstup	Počet úspěšně podpořených osob	počet	MS OP VK	dosažená	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	2 308 500	2 308 500

Zdroj: Data poskytnutá ÚIV, EUROSTAT, Výroční zprávy ZS

² Pouze za denní studium.

³ Na základě metodického nesouladu dat není možné daný indikátor v současnosti zjistit, ve výroční zprávě 2009 budou data dodána i zpětně.

⁴ Data k 10.4.2009 dostupná pouze za rok 2007, více viz.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073.46870091&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=TSDSC440

⁵ Dle uvedeného měly být zpracována evaluační studie týkající se uplatnění absolventů podle typu dosaženého vzdělání, vzhledem k pozdnímu nástupu procesu administrace by provedení studie nebylo relevantní

OP VK je dělen do pěti prioritních os včetně PO Technická pomoc a realizován prostřednictvím třech typů projektů: individuální projekty národní, individuální projekty ostatní a v rámci globálních grantů jsou realizovány grantové projekty. Speciálním typem projektů jsou individuální projekty technické pomoci předkládané jak Řídicím orgánem, tak zprostředkujícími subjekty v PO 5. Z tohoto důvodu následující tabulky uvádí přehled vyhlášených výzev za rok 2008 dle jednotlivých typů projektů a oblastí podpory. K výpočtu finančních ukazatelů byl použit doporučený kurz 26,63 EUR/CZK. Všechny výzvy byly vyhlášeny na souhrnné veřejné prostředky. V případě průběžných výzev jsou uvedena data dostupná k 31. 12. 2008.

Tab. č. 3: Přehled vyhlášených výzev na GP v op 1.1

Pořadí výzvy	ŘO/Kraj	Datum vyhlášení	Datum ukončení	Prioritní oblast	Alokace na výzvu EUR	Předložené žádosti		Schválené projekty	
						počet	EUR	počet	EUR
1	JČK	26.5.2008	7.7.2008	1.1	3 755 163	100	17 817 021	35	3 707 786
1	JMK	5.5.2008	18.6.2008	1.1	9 579 613	201	41 783 376	50	655 781
1	KK	29.4.2008	10.6.2008	1.1	2 290 650	45	8 281 735	14	2 290 636
1	KHK	5.5.2008	27.8.2008	1.1	3 379 647	50	15 175 309	11	3 345 498
1	LK	12.5.2008	26.6.2008	1.1	1 651 553	72	14 867 940	8	1 651 553
1	MSK	3.4.2008	19.5.2008	1.1	6 806 988	182	47 510 515	47	6 806 988
1	OL	16.5.2008	14.7.2008	1.1	9 698 298	202	47 403 549	20	5 006 685
1	PK	2.5.2008	16.6.2008	1.1	1 952 226	70	12 939 188	15	1 938 702
1	PLZ	19.6.2008	4.8.2008	1.1	3 755 163	71	19 823 144	21	3 415 902
1	SČK	2.5.2008	16.6.2008	1.1	9 087 495	132	32 537 575	52	9 083 902
1	ÚK	3.4.2008	30.4.2008	1.1	3 755 163	8	6 517 977	4	3 681 901
1	Vysočina	26.5.2008	12.9.2008	1.1	3 755 163	90	23 848 445	23	2 858 641
1	ZK	28.4.2008	23.5.2008	1.1	4 506 196	98	17 398 365	28	4 500 898
2	ÚK	7.7.2008	28.7.2008	1.1	5 069 471	51	18 954 838	10	4 944 214
Celkem					69 042 790	1 372	324 858 978	338	53 889 087

Zdroj: Zprostředkující subjekty

Tab. č. 4: Přehled vyhlášených výzev na GP v op 1.2

Pořadí výzvy	ŘO/Kraj	Datum vyhlášení	Datum ukončení	Prioritní oblast	Alokace na výzvu EUR	Předložené žádosti		Schválené projekty	
						počet	EUR	počet	EUR
1	JČK	26.5.2008	7.7.2008	1.2	938 791	16	2 734 324	8	803 023
1	JMK	5.5.2008	18.6.2008	1.2	3 585 909	50	9 619 240	11	1 943 590
1	KK	29.4.2008	10.6.2008	1.2	826 136	8	1 033 351	3	445 004
1	KHK	5.5.2008	27.8.2008	1.2	1 314 307	7	2 887 919	2	1 161 543
1	LK	12.5.2008	26.6.2008	1.2	600 565	16	2 975 084	4	600 565
1	MSK	3.4.2008	19.5.2008	1.2	2 475 268	43	7 400 614	10	1 111 123
1	OL	16.5.2008	14.7.2008	1.2	3 526 654	30	5 621 653	7	1 191 213
1	PK	2.5.2008	16.6.2008	1.2	709 900	14	2 180 050	4	583 618
1	PLZ	19.6.2008	4.8.2008	1.2	1 314 307	16	4 836 575	3	1 034 722
1	SČK	2.5.2008	16.6.2008	1.2	3 304 544	22	4 918 213	11	1 773 029
1	ÚK	3.4.2008	30.4.2008	1.2	1 877 582	3	2 799 052	2	1 846 641
1	Vysočina	26.5.2008	12.9.2008	1.2	1 351 859	20	3 798 568	4	808 697
1	ZK	28.4.2008	20.6.2008	1.2	1 614 720	23	3 829 584	6	711 349
2	ÚK	7.7.2008	28.7.2008	1.2	1 502 065	24	7 444 394	3	1 394 570
Celkem					24 942 608	292	62 078 623	78	15 408 686

Zdroj: Zprostředkující subjekty

Tab. č. 5: Přehled vyhlášených výzev na GP v op1.3

Pořadí výzvy	ŘO/Kraj	Datum vyhlášení	Datum ukončení	Prioritní oblast	Alokace na výzvu EUR	Předložené žádosti		Schválené projekty	
						počet	EUR	počet	EUR
1	JČK	26.5.2008	7.7.2008	1.3	938 791	33	6 534 480	6	848 223
1	JMK	5.5.2008	18.6.2008	1.3	4 388 508	58	11 735 286	9	1 327 192
1	KK	29.4.2008	10.6.2008	1.3	1 013 894	9	1 202 954	2	348 709
1	KHK	5.5.2008	27.8.2008	1.3	1 689 824	15	3 913 498	4	1 178 714
1	LK	12.5.2008	26.6.2008	1.3	750 706	33	5 520 276	5	750 706
1	MSK	3.4.2008	19.5.2008	1.3	3 094 086	36	9 598 418	9	1 927 887
1	OL	16.5.2008	14.7.2008	1.3	4 408 317	61	14 330 904	11	1 617 628
1	PK	2.5.2008	16.6.2008	1.3	887 375	18	3 730 978	4	887 304
1	PLZ	19.6.2008	4.8.2008	1.3	1 877 582	27	7 114 047	5	1 380 673
1	SČK	2.5.2008	16.6.2008	1.3	4 130 680	36	10 585 493	10	1 295 199
1	ÚK	3.4.2008	30.4.2008	1.3	1 877 582	7	5 097 686	2	1 699 524
1	Vysočina	26.5.2008	12.9.2008	1.3	1 689 824	30	5 646 592	3	315 534
1	ZK	28.4.2008	20.6.2008	1.3	2 065 340	51	9 619 179	11	2 065 340
2	ÚK	7.7.2008	28.7.2008	1.3	2 628 614	31	9 246 552	6	2 628 614
Celkem					31 441 121	445	103 876 342	87	18 271 248

Zdroj: Zprostředkující subjekty

Tab. č. 6: Přehled vyhlášených výzev na GG

Pořadí výzvy	ŘO/Kraj	Datum vyhlášení	Datum ukončení	Prioritní oblast	Alokace na výzvu EUR	Předložené žádosti		Schválené projekty	
						počet	EUR	počet	EUR
1	ŘO	12.12.2007	31.3.2008	1.1	136 664 244	13	136 664 244	13	136 664 244
2	ŘO	12.12.2007	31.3.2008	1.2	49 696 089	13	49 696 089	13	49 696 089
3	ŘO	12.12.2007	31.3.2008	1.3	1 654 258 559	13	62 120 111	13	62 120 111
10	ŘO	14.11.2008	31.12.2013	3.2	106 459 096	N/A	N/A	N/A	N/A
Celkem					1 840 618 892	39	248 480 444	39	248 480 444

Zdroj: IS MONIT7+

Tab. č. 7: Přehled vyhlášených výzev na TP

Pořadí výzvy	ŘO/Kraj	Datum vyhlášení	Datum ukončení	Prioritní oblast	Alokace na výzvu EUR ⁶	Předložené žádosti		Schválené projekty	
						počet	EUR	počet	EUR
4,5	ŘO	15.2.2008	31.10.2011	5.1, 5.2, 5.3	86 026 635	60	38 623 128	48	5 301 634
Celkem					86 026 635	60	38 623 128	48	5 301 634

Zdroj: IS MONIT7+, VZ odboru TP

Tab. č. 8: Přehled vyhlášených výzev na IPn

Pořadí výzvy	ŘO/Kraj	Datum vyhlášení	Datum ukončení	Prioritní oblast	Alokace na výzvu EUR	Předložené žádosti		Schválené projekty	
						počet	EUR	počet	EUR
6	ŘO	24.4.2008	31.12.2013	4.1a	71 348 104	9	45 901 912,93	3	5 063 252
6	ŘO	24.4.2008	31.12.2013	4.2a	24 784 078	3	14 284 553	3	14 284 553
6	ŘO	24.4.2008	31.12.2013	4.3a	40 555 764	0	0	0	0
11	ŘO	15.12.2008	31.12.2013	3.2	11 265 490	N/A	N/A	N/A	N/A
Celkem					136 687 946	12	60 186 466	N/A	N/A

Zdroj: IS MONIT7+, VZ odboru CERA

⁶ Výzva byla vyhlášena v EUR, bez stanoveného směnného kurzu.

Tab. č. 9: Přehled vyhlášených výzev na IPO

Pořadí výzvy	ŘO/Kraj	Datum vyhlášení	Datum ukončení	Prioritní oblast	Alokace na výzvu EUR	Předložené žádosti		Schválené projekty	
						počet	EUR	počet	EUR
7	ŘO	19.5.2008	19.9.2008	2.2	45 399 925	493	200 127 144	N/A	N/A
8	ŘO	21.7.2008	30.10.2008	1.1	22 530 980	97	74 483 606	N/A	N/A
8	ŘO	21.7.2008	30.10.2008	1.2	7 510 327	73	34 325 696	N/A	N/A
8	ŘO	21.7.2008	30.10.2008	1.3	11 265 490	88	50 502 759	N/A	N/A
9	ŘO	13.10.2008	12.12.2008	2.3	41 306 797	235	104 770 275	N/A	N/A
Celkem					75 441 232	663	308 936 445	N/A	N/A

Zdroj: IS MONIT7+, VZ odboru CERA

2.1.B Finanční údaje

Do konce roku 2008 nebyly příjemcům schváleny ze strany řídicího orgánu žádné žádosti o platbu. První žádosti o platbu budou ŘO schváleny v prvním pololetí roku 2009.

Od EK byly přijaty celkem dvě předběžné platby, a to dne 20. listopadu 2007 ve výši 36 574 295,62 EUR a dne 23. 4. 2008 ve výši 54 861 443,43 EUR. Jednalo se o 1. a 2. předběžnou platbu odpovídající 2 % a 3 % alokace OP VK.

Křížové financování nebylo v průběhu let 2007 a 2008 využito.

Tab. č. 10 Prioritní osy podle zdrojů financování

	Výdaje zaplacené příjemci zahrnuté v žádostech o platby zaslaných řídicímu orgánu	příslušný příspěvek z veřejných zdrojů	Výdaje zaplacené subjektem odpovědným za platby příjemcům	Celkové platby obdržené od Komise (EUR)
Prioritní osa 1				30 603 886,91
Fond ESF				
výdaje typu ESF	0	0	0	
výdaje typu ERDF	0	0	0	
Prioritní osa 2				31 326 813,40
Fond ESF				
výdaje typu ESF	0	0	0	
výdaje typu ERDF	0	0	0	
Prioritní osa 3				14 494 766,18
Fond ESF				
výdaje typu ESF	0	0	0	
výdaje typu ERDF	0	0	0	
Prioritní osa 4a				10 543 130,55
Fond ESF				
výdaje typu ESF	0	0	0	
výdaje typu ERDF	0	0	0	
Prioritní osa 4b				811 010,03
Fond ESF				

výdaje typu ESF	0	0	0	
výdaje typu ERDF	0	0	0	
Prioritní osa 5a				3 623 691,57
Fond ESF				
výdaje typu ESF	0	0	0	
výdaje typu ERDF	0	0	0	
Prioritní osa 5b				32 440,42
Fond ESF				
výdaje typu ESF	0	0	0	
výdaje typu ERDF	0	0	0	
Celkový součet	0	0	0	91 435 739,05
Úhrn v regionech s přechodnou podporou v celkovém součtu	-	-	-	-
Úhrn v regionech bez přechodné podpory v celkovém součtu	-	-	-	-
Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, je-li operační program spolufinancován ESF	0	0	0	-

Zdroj: IS OP VK

Tab. č. 11 Finanční plán OP VK na programové období 2007-2013

Prioritní osa/ oblast podpory	Název prioritní osy/oblasti podpory	Fond	Podíl na celkové alokaci OP v %	Příspěvek EU v EUR	Veřejné prostředky celkem v EUR
1	Počáteční vzdělávání	ESF	33,5%	612 077 738	720091457
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	ESF	17,4%	318 087 643	374220757
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	ESF	7,2%	132 192 268	155520315
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	ESF	8,8%	161 797 827	190350385
2	Terciární vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	ESF	34,3%	626 536 268	737101492
2.1	Vyšší odborné vzdělávání	ESF	4,1%	75 735 153	89100180
2.2	Vysokoškolské vzdělávání	ESF	12,0%	220 320 446	259200525
2.3	Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji	ESF	11,3%	206 550 418	243000492
2.4	Partnerství a sítě	ESF	6,8%	123 930 251	145800295
3	Další vzdělávání	ESF	15,9%	289 895 324	341053322
3.1	Individuální další vzdělávání	ESF	7,9%	144 947 662	170526661
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	ESF	7,9%	144 947 662	170526661
4	Systémový rámec celoživotního učení	ESF	12,4%	227 082 812	267156249
4a	Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)	ESF	11,5%	210 862 611	248073660
4.1	Systémový rámec počátečního vzdělávání	ESF	4,2%	76 423 655	89910182
4.2	Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji	ESF	3,4%	61 965 125	72900147
4.3	Systémový rámec dalšího vzdělávání	ESF	4,0%	72 473 831	85263331
4b	Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)	ESF	0,9%	16 220 201	19082589
4.1	Systémový rámec počátečního vzdělávání	ESF	0,3%	5 878 743	6916168
4.2	Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji	ESF	0,3%	4 766 548	5607703
4.3	Systémový rámec dalšího vzdělávání	ESF	0,3%	5 574 910	6558718

5	Technická pomoc	ESF	4,0%	73 122 639	86026635
5a	Technická pomoc (cíl Konvergence)	ESF	4,0%	72 473 831	85263331
5.1	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	ESF	3,6%	65 226 448	76736998
5.2	Informovanost a publicita programu	ESF	0,2%	3 623 692	4263167
5.3	Absorpční kapacita subjektů implementujících program	ESF	0,2%	3 623 691	4263166
5b	Technická pomoc (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)	ESF	0,0%	648 808	763304
5.1	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	ESF	0,0%	583 927	686973
5.2	Informovanost a publicita programu	ESF	0,0%	32 441	38166
5.3	Absorpční kapacita subjektů implementujících program	ESF	0,0%	32 440	38165
Celkem	-	ESF	100,0%	1 828 714 781	2151429155
celkem cíl Konvergence		ESF	99,1%	1 811 845 772	2131583262
celkem cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost		ESF	0,9%	16 869 009	19845893

Zdroj: PD OP VK ke dni 9.12. 2008

Předběžné platby

V letech 2007 a 2008 byly poskytnuty Evropskou komisí zálohové platby celkem celkové výši 91 435 739,05 EUR. Seznam předběžných plateb:

- 20.11.2007 předběžná platba ve výši € 36 574 295,62
- 23.4.2008 předběžná platba ve výši € 54 861 443,43

Naplňování pravidla N+3/N+2

Krátkodobým opatřením k dodržení pravidla N+3/N+2 a zabránění automatickému zrušení závazku je:

1. dodržení pravidla N+2, čímž dojde pro rok 2010 ke snížení minimálního nutného objemu certifikovaných prostředků o poskytnutou zálohu.
2. splnění plánu výzev pro rok 2009. Splnění tohoto plánu zásadně ovlivní čerpání prostředků v nejbližších dvou až třech letech

Ve středně a dlouhodobém horizontu bude důležité správně nastavit finanční parametry jednotlivých výzev. Tyto parametry se budou odvíjet od kvalitativních analýz a zájmu ze strany žadatelů, proto lze v tuto chvíli plánovat pouze celkové finanční objemy výzev za operační program jako celek. Klíčové pak bude zajistit hladký průběh realizace projektů (podpora příjemcům, zajištění dostatečné administrativní kapacity řídicího orgánu). Z důvodu

zajištění hladké realizace projektů a naplnění absorpční kapacity byla koncem roku 2008 na počátek roku následujícího naplánována realizace „Analýzy informovanosti potencionálních žadatelů OP VK o možnostech čerpání prostředků ESF v rámci OP VK a o konkrétních postupech při tvorbě a realizaci projektů v rámci OP VK“ a „Analýza výzev OP VK uskutečněných v roce 2008“.

Tab. č. 12: Naplňování pravidla N+3/N+2

Naplňování pravidla N+3/N+2

stav roku	alokace na rok n	schválené projekty*		proplacené prostředky příjemcům		certifikované prostředky	
	a) EUR	b) EUR	%b/a	c) EUR	%c/a	d) EUR	%d/a
2007	227 070 511	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2008	465 244 082	273 129 883	58,7%	0	0,0%	0	0,0%
2009	714 569 956	508 882 883	71,2%	15 000 000	2,1%	15 000 000	2,1%
2010	975 568 389	956 660 883	98,1%	155 925 000	16,0%	105 925 000	10,9%
2011	1 248 245 632	1 320 310 883	105,8%	710 531 000	56,9%	515 600 000	41,3%
2012	1 532 560 369	1 690 310 883	110,3%	1 159 181 000	75,6%	874 000 000	57,0%
2013	1 828 714 781	2 040 310 883	111,6%	1 509 181 000	82,5%	1 240 000 000	67,8%
2014	1 828 714 781	2 040 310 883	111,6%	1 830 000 000	100,1%	1 600 000 000	87,5%
2015	1 828 714 781	2 040 310 883	111,6%	1 830 000 000	100,1%	1 828 714 781	100,0%
celkem	1 828 714 781	2 040 310 883	111,6%	1 830 000 000	100,1%	1 828 714 781	100,0%

použit kurz EUR/CZK=26,63


2007-2008: skutečnost

2009-2015: odhad

*Do schválených projektů jsou zahrnuty GG a projekty TP a IPn

Zdroj: MSC2007, odhad Odboru řízení OP VK

Graf. č. 1: Odhad čerpání OP VK

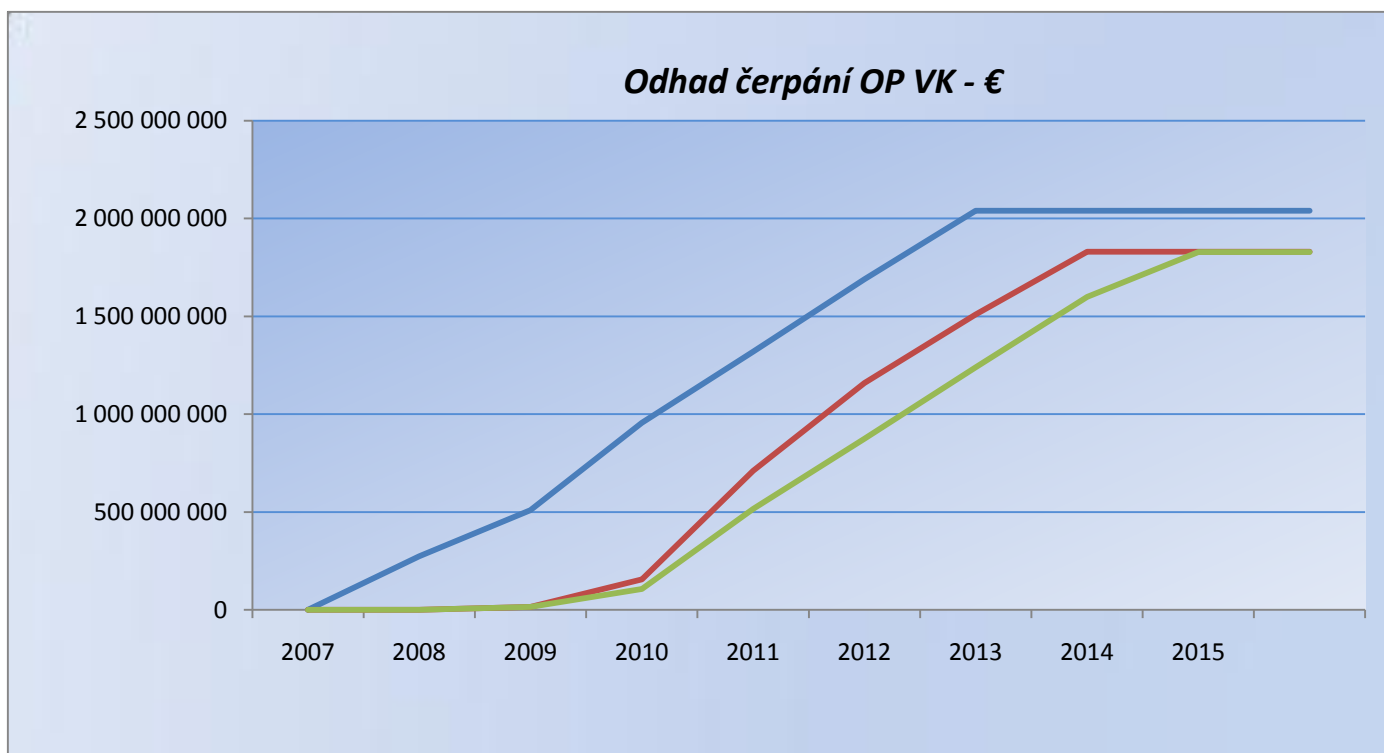

Zdroj: MSC2007, odhad Odboru řízení OP VK

2.1.C Informace o rozpisu využití fondů

Níže uvedená tabulka znázorňuje alokaci finančních prostředků dle prioritních oblastí, formy financování, typu území, hospodářské činnosti a zeměpisné polohy dle přílohy II Nařízení komise (ES) č. 1828/2006.

Tab. č. 13 Kumulativní rozdělení alokací z příspěvku Společenství podle kategorií ve výroční a závěrečné zprávě o provádění

Téma 1 Prioritní téma	Téma 2 Forma financování	Téma 3 Typ území	Téma 4 Hosp. činnost	Téma 5 Zeměpisná poloha	Částka EUR
62	1	1	18	CZ0	115 209 033
62	1	5	18	CZ0	49 375 299
72	1	1	18	CZ0	768 846 436
72	1	5	18	CZ0	329 505 614
73	1	1	18	CZ0	38 403 010
73	1	5	18	CZ0	16 458 433
74	1	1	18	CZ0	209 168 396
74	1	5	18	CZ0	89 643 598
81	1	1	18	CZ0	110 088 631
81	1	5	18	CZ0	47 180 841
85	1	1	18	CZ0	30 704 241
85	1	5	18	CZ0	13 158 960
86	1	1	18	CZ0	7 680 602
86	1	5	18	CZ0	3 291 687

Referenční číslo EK: . CCI 2007 CZ 05U PO 002

Název OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2.1.D Pomoc podle cílových skupin

V rámci prioritních os 5a a 5b bylo v roce 2008 podpořeno 2 612 účastníků cílové skupiny. Cílovou skupinou těchto prioritních os jsou pracovníci Řídícího orgánu a Zprostředkujících subjektů, Monitorovací výbor, příjemci a veřejnost.

V dalších prioritních osách nebyly podpořeny žádné cílové skupiny.

Vzhledem k tomu, že struktura účastníků dle přílohy XXIII Nařízení č. 1828/2006 neodpovídá cílovým skupinám a zaměření operačního programu není možné data o jednotlivých účastnících vykazovat v indikátorové tabulce „Údaje o účastnících operačního programu ESF dle priorit“.

2.1.E Vrácená nebo znovu použitá pomoc

Za rok 2008 nedošlo k využití vrácené ani znovu použité pomoci po zrušení podpory ve smyslu čl. 57 a čl. 98 odst. 2 Nařízení (ES) č. 1083/2006.

2.1.F Kvalitativní analýza

Za rok 2008 bylo celkem schváleno 556 projektů v prioritních osách PO 1 Počáteční vzdělávání, PO 4a – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) a PO 4b – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) a PO 5 Technická pomoc. V ostatních prioritních osách byly vyhlašovány výzvy, (viz 2.1 tabulky vyhlášených výzev) a administrovány předložené projekty.

Největšího pokroku bylo dosaženo v PO 1, kde bylo schváleno 502 grantových projektů v celkové hodnotě 87 497 314 EUR. V PO 5 bylo schváleno 48 individuálních projektů technické pomoci v hodnotě 112 146 753 EUR a v PO 4a a PO 4b bylo schváleno 6 individuálních projektů národních za 19 347 805 EUR.

Tab.č. 14: Reálný pokrok OP

Prioritní osa	schválené projekty		ukončené projekty do 2008		% podíl všech ukončených projektů na alokaci
	počet	v EUR	počet	v EUR	
1.	502	87 569 021	0	0	0
2.	N/A	N/A	0	0	0
3.	N/A	N/A	0	0	0
4.	6	19 347 805	0	0	0
5.	48	5 301 634	0	0	0
Celkem	556	112 218 460	0	0	0

Zdroj: Zprostředkující subjekty, IS MONIT7+

Tab.č. 15: Pokrok v naplňování Lisabonského indikátoru

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná	Zdroj	Hodnota	2006	2007	2008 ⁷	Cílová	Celkem
---------	------------------	-------	-------	---------	------	------	-------------------	--------	--------

⁷ Oficiální data za rok 2008 budou dostupná na www.uiv.cz, dne 1.5.2009.

Kód EU/Lisabon Typ indikátoru		jednotka						hodnota 2015 ⁸	
068812 kontext	Podíl veřejných výdajů na základní vzdělávání na celkových veřejných výdajích na vzdělávání.	%	ÚIV	dosažená	33,71%	31,29%	N/A*	N/A	N/A
				výchozí	33,74%	33,71%	N/A	N/A	33,74%
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
068813 kontext	Podíl veřejných výdajů na střední vzdělávání na celkových veřejných výdajích na vzdělávání.	%	ÚIV	dosažená	22,05%	31,29%	N/A	N/A	N/A
				výchozí	22,52%	22,05%	N/A	N/A	22,52%
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
068814 kontext	Podíl veřejných výdajů na vzdělávání VOŠ a VŠ na celkových veřejných výdajích na vzdělávání.	%	ÚIV	dosažená	20,31%	22,62%	N/A	N/A	N/A
				výchozí	20,29%	20,31%	N/A	N/A	20,29%
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání, dostupné online na www.uiv.cz

*N/A značí, že data nejsou k dispozici

Horizontální cíle

Naplňování specifických cílů OP VK je realizováno při respektování horizontálních témat Rovných příležitostí a Udržitelného rozvoje. Tato témata byla sledována při výběru projektů a jejich naplňování bude dále sledováno v realizační fázi projektů a bude rovněž předmětem kontroly na místě.

Rovné příležitosti

Významnou prioritou nejen v oblasti vzdělávání je zajištění rovných příležitostí bez ohledu na druh postižení nebo sociálního znevýhodnění, např. zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického, podle pohlaví či státní příslušnosti. V rámci OP VK jsou v rámci všech prioritních os podporovány projekty, které pomohou odstranit bariéry účasti na projektech z hlediska pohlaví, rasového a etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženství, sexuální orientace, socioekonomického prostředí. Rovným příležitostem je věnována v rámci OP VK samostatná oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na tuto oblast podpory byly vypisovány výzvy jak ZS – kraji k předkládání GP tak ŘO k předkládání IPo. Do konce roku bylo v této oblasti podpory schváleno 78 grantových projektů.

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je klíčovým aspektem sociálního a ekonomického rozvoje společnosti a je analogicky i klíčovým aspektem vzdělávání. V OP VK jsou principy udržitelného rozvoje prosazovány prostřednictvím začleňování environmentálního vzdělávání při tvorbě nových vzdělávacích programů pro studenty i pedagogy a výchovou k vývoji a užívání moderních a k životnímu prostředí šetrných technologií.

⁸ Cílová hodnota 2015 není v operačním programu uvedena.

Udržitelný rozvoj je podporován zejména v PO 1, kde jsou mimo jiné, vypisovány výzvy přímo zaměřené na podporu udržitelného rozvoje a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Koncem roku 2008 zadal ŘO zpracování „Analýzy stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ jejíž výsledky budou známy během roku 2009 a dále využity pro efektivnější zaměření výzev.

Princip partnerství

Silnou stránkou OP VK bylo již v ex-ante evaluaci vyhodnoceno uplatňování principu partnerství při tvorbě programu. Princip partnerství je uplatňován i nadále při implementaci programu, monitorování a jeho evaluaci.

MV OP VK je ustanoven na principu partnerství, rovných příležitostí a jeho členy jsou zástupci NOK, partnerských ministerstev, krajů, sociálních partnerů, NNO, EK, a dalších subjektů.

Zástupci IS OP VK jsou členy PS integrující zástupce dalších ŘO jako jsou např. PS pro záležitosti romských komunit a Pracovní skupina pro evaluaci.

Do procesu tvorby a aktualizace dokumentů spadajících do systému Řízené dokumentace (Manuál OP VK, Metodické dopisy, apod.) i mimo ni (Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce) jsou zapojeni všichni relevantní partneři.

Rovněž do přípravy výzev k předkládání IPn, IPo, GP a GG jsou zapojeny všechny relevantní subjekty.

2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství

V roce 2008 nebyly při provádění OP VK zjištěny žádné případy nesouladu s právními předpisy Evropského společenství, a to ani na straně řídicího orgánu či zprostředkujících subjektů, tak ani na straně příjemců pomoci z operačního programu.

Řídicí orgán vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace OP VK, který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální stránce klade důraz na soulad s pravidly:

- hospodářské soutěže,
- veřejných zakázek,
- ochrany životního prostředí,
- podpory rovných příležitostí.

Pravidla hospodářské soutěže

Prostředky na realizaci OP jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se také vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy.

Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou

soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou dále zakotveny ve Smlouvě o ES.

V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 272/1996 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Řádné dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno v nastavení OP. V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace je také zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory.

Veřejné zakázky

V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace OP pro všechny příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES a současně podle doplňujících pravidel OP. Zadávání veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany Řídicího orgánu.

Na základě uskutečněných auditů a zkušeností z období 2004-2006 přistoupilo Ministerstvo pro místní rozvoj (NOK) ve spolupráci s Ministerstvem financí (PCO) k vytvoření základního minima v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem. Cílem dokumentu „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013“ je proto stanovit pro všechny subjekty zapojené do procesu implementace kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek nespádajících pod zákonnou úpravu. Tento dokument byl schválen Usnesením vlády ČR dne 12. ledna 2009 č. 48. Tyto závazné postupy budou sloužit také jako podklad při tvorbě metodického pokynu pro Územní finanční orgány při výkonu kontroly zadávání zakázek.

Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy ES musí být striktně dodržován, kontrolován a při jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné danou problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu nerespektování stanovených principů přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jedná-li se o zakázky ne/spádající pod zákonnou úpravu.

Ochrana životního prostředí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Podpora rovných příležitostí

Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 6 – Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace.

Tato kapitola výroční zprávy informuje o souladu legislativy ČR s legislativou EU. Popis zakomponování těchto klíčových oblastí do nastavení OP je uveden v kvalitativní analýze výroční zprávy, tj. v kapitole 2.1.F.

2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

V prvním pololetí 2008 byly budovány administrativní kapacity na jednotlivých úrovních implementace OP VK. Nízký počet systemizovaných míst pro OP VK na MŠMT se podařilo v červnu 2008 vyřešit využitím zdrojů technické pomoci k navýšení počtu zaměstnanců. Nárůst pro jednotlivé útvary implementační struktury OP VK byl promítnut do Příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.11/2008, který vyšel dne 3. 6. 2008.

V prvním pololetí 2008 byla administrace žádostí o finanční podporu značně ovlivněna nedostatečnou stabilitou monitorovacího systému (Benefit7/Monit7+). Nestabilita systému byla dne 21. 6. 2008 odstraněna přestěhováním do nové serverovny v budově Centra pro regionální rozvoj ČR, s nímž má MŠMT uzavřenu smlouvu o provozování. Dílčí problémy spojené s realizací jednotlivých prioritních os jsou uvedeny v části 3. Informační systémy v roce 2008 značně ovlivnilo průběžné doplňování a oprava funkcionalit, jejichž potřeba a nevhodné nastavení se projeví až při administraci projektů.

Na začátku roku 2008 probíhal reaudit tzv. Auditů shody subjektů implementačních struktur ČR zapojených do čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů (ERDF, ESF) a FS pro programové období 2007 - 2013, prováděný na zakázku Auditního orgánu auditorskou firmou PriceWaterhouseCoopers. Účelem reauditů bylo ověřit plnění opatření přijatých k řešení nedostatků zjištěných v rámci auditu prováděného v roce 2007. V rámci reauditů byly podrobně zkoumány veškeré postupy a procesy nastavené v Manuálu OP VK a jeho přílohách. Hlavními zjištěnými nedostatky bylo nedokončení záložního pracoviště pro provoz monitorovacího systému a neexistence základního návrhu systémového řešení havarijních situací. Tento problém je řešen Centrem pro regionální rozvoj ČR, se kterým má OP VK uzavřenou smlouvu o poskytování kompletních servisních služeb monitorovacího systému. Dalším odstraněným nedostatkem bylo dokončení testování mezi MSC2007 a IS ŘO. Intenzivně se pracovalo na zautomatizování úloh systému Monit7+ a Benefit7 a byla tak zajištěna základní administrace projektů. Rovněž byl vyřešen nedostatek kapacit pracovníků PAS. V září 2008 bylo konstatováno, že všechny významné nesoulady systému OP VK s čl. 71 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, byly odstraněny a nastavení systému OP VK je bez výhrad.

K 30. 6. 2008 byl dokončen Popis řídicích a kontrolních systémů OP VK, který byl začátkem září odeslán přes systém SFC Evropské komisi.

Pro zhodnocení a analýzu již proběhnutých výzev bude zpracována studie „Analýza výzev Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008“, její výstup bude zhotoven externím dodavatelem v polovině roku 2009. Analýza se bude zabývat nejčastějšími důvody vyřazování projektů při hodnocení přijatelnosti, zaměřením projektů dle oblastí podpor (přetlak x nízký zájem), tématy výzev, o které nebyl zájem, či byl minimální, tématy, kde byl zájem vysoký a bylo v nich schváleno nejvíce projektů, sledováním typu žadatele v jednotlivých tématech výzev, apod. Studie přispěje k optimalizaci budoucích výzev, umožní jak ŘO tak ZS shrnout již uskutečněné výzvy a vyvarovat se případných zjištěných nedostatků.

S nízkým zájmem potenciálních příjemců finanční podpory se nesetkal ŘO a ZS u žádné z vyhlášených výzev. Naopak enormní zájem byl zaznamenán u výzev v oblasti podpory 1.1 ve všech krajích, nejvyšší v Libereckém kraji (892 %) a naopak „nejnižší“ v kraji Ústeckém (289 %), viz Tabulka „Počet předložených projektů a nárokové prostředky žadatelů“

2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu

Na 3. zasedání MV OP VK, které se uskutečnilo 9. prosince 2008 Monitorovací výbor odsouhlasil, aby do doby oficiální úpravy OP VK (a schválení této úpravy ze strany Evropské komise) byli do cílových skupin v oblasti podpory 1.3 (pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení) zahrnováni také učitelé mateřských škol.

Žádné další změny či aktivity, které by byly v rozporu se schváleným textem programu z 12. října 2007 Evropskou komisí, nebyly provedeny.

2.5 Případná podstatná změna

Po schválení OP VK dne 12. října 2007 Evropskou komisí nebyla v tomto dokumentu navržena ani provedena žádná podstatná změna podle čl. 57 obecného nařízení.

2.6 Doplnkovost s jinými nástroji

Synergie s ostatními OP

OP VK je věcně komplementární s dalšími operačními programy, což umožňuje vytvářet mezi projekty financovanými prostřednictvím některého dalšího operačního programu synergické efekty. Jedná se především o sektorové operační programy OP VaVpI, OP LZZ, OP ŽP a OP PA. Synergický efekt se dále umocňuje v prostředí jednotlivých ROP, které navazují na systém sektorových operačních programů a své dotační tituly směřují k řešení problémů vázaných na konkrétní region ČR.

V roce 2008 byly nastavovány mechanismy pro koordinaci a realizaci synergických efektů.

Koordinační mechanismy OP VK pro realizaci synergií s ostatními operačními programy jsou založeny na třech základních pilířích:

1. **Informovanost o vyhlášených výzvách** a to jak mezi řídicími orgány a zprostředkujícími subjekty navzájem, tak směrem k žadatelům/ příjemcům (web, tisk, apod.). Na webu MŠMT jsou pro žadatele k dispozici odkazy na stránky s výzvami ostatních tematických a regionálních operačních programů.
2. **Bonifikace synergických projektů - Specifická kritéria** – subkritéria (specifické požadavky) stanovuje vždy vyhlášovatel výzvy pro každou výzvu zvlášť. Bonifikace synergických projektů je ze strany ŘO doporučeným specifickým kritériem pro všechny vyhlášovatele výzev (tzn. bonifikace projektů, které mají návaznost na doplňující schválený projekt téhož žadatele v jiném operačním programu pro léta 2007-13).
3. **Informování o realizovaných projektech** navzájem jak mezi řídicími orgány, tak zprostředkujícími subjekty a následné informování Monitorovacích výborů o synergických projektech, tzn. o projektech jiných operačních programů navazujících na OP VK a naopak. V jednání je zatím vhodný způsob evidence těchto synergických projektů.

K dohodě v realizaci synergických efektů v tomto smyslu došlo koncem roku 2008 s ROP, kde byly dohodnuty i další způsoby spolupráce. V rámci pravidelných jednání PS AKČR pro Evropské fondy bude dvakrát ročně začleněna koordinační schůzka se zástupci OP VK. Dále bylo dohodnuto jmenování kontaktní osoby pro vyjednávání ROP a OP VK a možnost účasti zástupců ESF programů na seminářích pro žadatele ROP.

K výrazné spolupráci dochází především mezi kraji, jakožto zprostředkujícími subjekty a jednotlivými regiony soudržnosti. Představitelé implementačních struktur, zejména regionálních pracovišť tematických OP a pracovišť ROP mají možnost se účastnit významných informačních akcí týkajících se GG OP VK. V některých krajích jsou za účelem koordinace výzev a posílení synergických efektů před vyhlášením výzvy uskutečňovány se zástupci ROP pracovní schůzky.

S OP VaVpI budou jednání o koordinaci probíhat v následujícím roce 2009 vzhledem ke zpožděnému zahájení realizace programu. Rovněž hlubší spolupráce s OP PI je plánována na rok 2009.

S OP PŽ je OP VK silně provázán, neboť environmentální vzdělávání, osvěta a výchova k udržitelnému rozvoji jsou zohledňovány jako horizontální téma i jako samostatné aktivity při implementaci všech oblastí podpor. V druhém pololetí roku 2008 byla vytvořena PS pro synergie tvořená zástupci MŠMT a MŽP, která se bude scházet jednou ročně. Ze strany OP VK bude postupováno dle výše zmíněného postupu.

V rámci technické pomoci OP VK se uvažuje o využití možnosti čerpání z OP TP. V současné době jsou hrazeny z tohoto programu pouze náklady na pracovníky PAS.

Koordinace programů spolufinancovaných z ESF probíhá prostřednictvím Monitorovacích výborů dotčených OP a schůzek Koordinační skupiny ŘO programů ESF. Vzájemná informovanost o projektech je umožněna prostřednictvím MSC 2007. Nadále pokračují v činnosti PS založené již v předchozím programovém období (např. Pracovní skupina pro evaluaci a Pracovní skupina pro záležitosti romských komunit), viz kapitola 4.

IPRM

V rámci OP VK je udílěna 10% bonifikace u projektů, které prokázaly při předložení do procesu hodnocení, že jsou součástí a v souladu se schváleným IPRM. V průběhu roku 2008 docházelo postupně k prvnímu schvalování IPRM a projektů v nich zahrnutých. Od května do prosince 2008 byla v průběhu vyhlášených výzev udílěna první bonifikace předložených projektů.

2.7 Opatření k monitorování a evaluaci

Opatření pro monitorování

Monitorování je v rámci OP nastaveno v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006. Datové potřeby pro centrální úroveň vycházejí především z požadavků legislativy ES a ČR a následně z požadavků NOK a MF, které jsou odpovědné za celkové monitorování pomoci EU a správu prostředků poskytnutých ČR ze SF.

Veškerá data o projektech a programech (včetně definovaných indikátorů) jsou ukládána v Informačním systému pro monitorování programů pro programové období 2007-2013 (dále jen „ms2007“), který je využíván na všech úrovních implementace programu především k monitoringu, vyhodnocování a řízení projektů a programu, přičemž slouží také jako nástroj pro zajištění reportů pro EK, MV ČR, MF ČR, Vládu ČR, parlament apod.

Používáním ms2007 jsou naplňovány požadavky na monitorování realizovaných programů a projektů a předávání příslušných dat do souvisejících informačních systémů (IS) v elektronické podobě. Monitorovací systém strukturálních fondů ms2007 je využíván na všech úrovních implementace a spolufinancování projektů, jeho uživateli jsou pracovníci Řídicího orgánu, Zprostředkujících subjektů a žadatelé/příjemci.

Monitorovací systém ms2007 se skládá ze tří integrovaných celků (úrovní):

- 1) Centrální/řídicí** – monitorovací systém Central (MSC2007)
- 2) Výkonná** – informační systém Řídicího orgánu/Zprostředkujícího subjektu (Monit7+)
- 3) Úroveň příjemce** – informační systém žadatele/příjemce (Benefit7)

Ad 1) MSC2007 slouží jako základní softwarový nástroj Řídicího orgánu OP VK a je určen ke kompletní podpoře vrcholových a řídicích funkcí realizovaných nad systémem monitorování strukturálních fondů ČR. Je napojen na podřízenou aplikaci Monit7+. Do této aplikace poskytuje centrálně pořízená data, nezbytná pro zajištění administrace vlastních projektů a z nich získává data o realizaci projektů v rámci jednotlivých OP. Všechny uvedené přenosy probíhají automaticky. MSC2007, jehož uživateli jsou zejména NOK, ŘO OP a útvary MF, tak centrálně shromažďuje aktuální data o nástrojích strukturální politiky EU v ČR.

Ad 2) IS Monit7+ slouží především jako základní softwarový nástroj ŘO a Zprostředkujících subjektů. Monit7+ je integrovanou součástí ms2007 pro zajištění věcného a finančního monitorování především na úrovni jednotlivých projektů. IS Monit7+ je napojen na podřízený IS Benefit7 určený pro žadatele/příjemce. Z tohoto IS jsou získávána data od příjemců - žádosti o podporu, žádosti o platby, monitorovací zprávy, apod. Monit7+ je současně napojen na MSC2007, do kterého předává data o realizaci projektů OP VK.

Ad 3) IS Benefit7 je určen k podpoře výkonných funkcí Monitorovacího systému SF a FS ČR realizovaných na úrovni jednotlivých žadatelů/příjemců. Inovace této aplikace je v tom, že komunikace mezi ŘO/ZS a příjemci je on-line. Jedná se o procesy podávání žádostí o podporu, proces podávání žádostí o platbu, proces podávání monitorovacích zpráv o realizaci projektu/GG apod. Benefit7 z IS Monit7+ získává odpovídající data potřebná pro vyplnění žádosti OP VK. Benefit7 předává do úrovně Monit7+ (jeho prostřednictvím také do úrovně MSC2007) informace z žádosti o podporu, monitorovací zprávě a žádosti o platbu.

Rozhodnutím 1. místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj č. 145/2007 ze dne 14. srpna 2007 byla zřízena Pracovní skupina pro monitorování, která byla poradním orgánem Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast koordinace monitorování pomoci v rámci fondů EU v ČR. V ustanovené pracovní skupině byla aktualizovaná Metodika monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007-2013, která definuje centrálně závazný datový rozsah monitorovacího systému, stanoví jednotnou terminologii a definuje obsah jednotlivých centrálně závazných datových položek.

Pro koordinaci a řízení úprav monitorovacího systému byla rozhodnutím č. 238/2007 ministra pro místní rozvoj, ze dne 6. listopadu 2007, o ustanovení Optimalizační skupiny pro rozvoj monitorovacího systému pro programové období 2007-2013, zřízena Optimalizační skupina pro rozvoj monitorovacího systému, ve které jsou zastoupeni zástupci všech řídicích orgánů operačních programů cíle Konvergence, cíle Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, cíle Evropské územní spolupráce a OP Rybářství. Optimalizační skupina se zabývá rozvojem, nastavením, funkcionalitami a optimalizací monitorovacího systému operačních programů, vytváří základní návrh pro zadání na aktualizaci monitorovacích systémů (Informační systém Monit7+, webová žádost Benefit7), podílí se na přípravě návrhů

na rozvoj Centrálního monitorovacího systému (MSC2007) a rovněž vytváří platformu pro výměnu zkušeností při realizaci společného rozvoje informačních systémů řídicích orgánů (Monit7+ , SAP, ISOP) a jejich webových žádostí.

Pracovní skupina pro monitorování a Optimalizační skupina byly rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 141/2008 dne 11.8.2008 sloučeny do Pracovní skupiny pro jednotný monitorovací systém pro programové období 2007-2013. Pracovní skupina pro jednotný monitorovací systém pro programové období 2007-2013 vznikla za účelem koordinace a řízení rozvoje jednotného monitorovacího systému a jsou v ní zapojeni zástupci všech řídicích orgánů operačních programů cíle Konvergence, cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, cíle Evropské územní spolupráce, OP Rybářství, dále zástupce Platebního a certifikačního orgánu, Auditního orgánu, zástupci Odboru řízení a koordinace NSRR, Odboru správy monitorovacího systému a Odboru publicity a administrativní kapacity NSRR a Centra pro regionální rozvoj ČR.

Na základě smlouvy⁹ mezi dodavatelem informačních systémů – Centrem pro regionální rozvoj ČR a MŠMT byla vytvořena webová žádost Benefit7 pro globální granty a žadatele/příjemce o individuální/grantové projekty OP VK na internetové adrese www.eu-zadost.cz a www.eu-zadost.eu. Po celé sledované období probíhal rozvoj základních funkcí monitorovacího systému tak, aby byla nastaven bezproblémový proces administrace žádostí a následné realizace projektů.

Indikátory

Ačkoliv byly první výzvy na GG vyhlášeny v prosinci roku 2007, nedošlo k 31. 12. 2008 k naplňování indikátorů s výjimkou prioritní osy 5 Technická pomoc. Důvodem nenaplňování indikátorů je pomalejší nástup implementace OP VK, která však nijak neovlivní jejich naplňování v dalších letech programovacího období 2007 – 2013. Průběžné hodnoty indikátorů příjemci dodávají do informačního systému formou monitorovací zprávy, které jsou přijímány přibližně tři měsíce od zahájení realizace projektu.

Koncem roku 2008 byla ze strany NOK oznámena realizace projektu „Dokončení optimalizace Národního číselníku indikátorů“, který proběhne v první polovině roku 2009. Tento projekt by měl vyřešit nesoulad v indikátorové soustavě jednotlivých OP a zajistit korektnost v agregační mapě OP.

Evaluace

Hodnocení OP VK je prováděno v souladu s povinnostmi ustanovenými čl. 47 až 49 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v souladu s metodickými pokyny EK a v souladu s metodickými pokyny Národního orgánu pro koordinaci. Řídicí orgán je zodpovědný za organizaci celého hodnotícího procesu. Je dále zodpovědný za formulaci zadání hodnocení, za výběr nezávislých externích hodnotitelů a za monitoring plnění úkolů v rámci hodnocení. Výsledky jednotlivých hodnocení budou veřejně přístupné tak, aby byla zabezpečena transparentnost realizace programu a přenos získaných zkušeností.

Podle čl. 48 odst. 2 a 3 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 se jedná o:

⁹ „Smlouva o poskytování kompletních servisních služeb zajišťujících řádné provozování SW produktu Monit7+ a provozování webové žádosti Benefit7 v modifikaci pro užití pro OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“

- hodnocení předběžné (ex ante)
- průběžné (on-going) hodnocení, hodnocení v průběhu implementačního období dle okamžité potřeby (ad hoc) v návaznosti na zjištění monitoringu (odchylky od cílů, požadavky revizí apod.)
- souhrnné hodnocení pro strategické zprávy podle čl. 29 odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

ŘO OP VK má zástupce v Pracovní skupině Evaluace, která je koordinovaná Ministerstvem pro místní rozvoj. Členové pracovní skupiny projednávají všechny úrovně evaluací, zejména Evaluační plán NSRR pro období 2007 – 2013. V průběhu roku 2008 proběhlo 1. zasedání této skupiny.

Tabulka na další straně znázorňuje přehled evaluační činnosti uskutečněné v roce 2008. K 31. 12. 2008 byly zpracovány a odevzdány ŘO 3 závěrečné zprávy jako výstup daných evaluací.

Studie proveditelnosti ISKA byla využita v rámci individuálního projektu národního a implementace „Národní soustavy kvalifikací“ (NSK 2), a bude dále využívána při jeho realizaci.

Podkladová studie „Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání“ byla následně využita jako vstupní materiál pro přípravu individuálního projektu národního „Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání“, jehož zahájení se předpokládá v polovině roku 2009.

Tab.č. 16: Přehled evaluační činnosti OP VK k 31.12.2008

Název studie/analýzy	Stav
Výzkum mezi zaměstnavateli k podpoře systému práce s talentovanými dětmi a mládeží	v realizaci
Výzkum k realizaci IPn "Klíče pro život"	v realizaci
Analýza EVVO/školy	v realizaci
Příprava Národní soustavy kvalifikací pro terciární vzdělávání	závěrečná zpráva odevzdána 15.9.2008
Sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí, žáků, žáků a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí	v realizaci
Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami	v realizaci
Studie proveditelnosti ISKA	závěrečná zpráva odevzdána 17.12.2008
Analýza připravenosti prostředí v ČR a možnosti rozvoje komunitních škol	závěrečná zpráva odevzdána 16.12.2008

Řešení vrstevnických vztahů na základních školách	Pozastaveno z důvodu nerealizace IpN na která měla analýza navazovat.
Simulační model pro varianty implementace změn financování vzdělávací činnosti v oblasti terciárního vzdělávání.	v realizaci
Možnosti implementace nového informačního systému o terciárním vzdělávání	v realizaci
Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání	bude znovu vyhlášeno výběrové řízení
Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání (Výzva II)	v realizaci
Analýza informovanosti žadatelů OP VK o možnostech čerpání prostředků ESF v rámci OP VK a o konkrétních postupech při tvorbě a realizaci projektu v rámci OP VK	v realizaci

Zdroj: Odbor řízení OP VK

2.8 Případná národní výkonnostní rezerva

V roce 2008 bez vazby na OP VK.

3 PROVÁDĚNÍ OP PODLE PRIORITYNÍCH OS

3.1 Prioritní osa 1- Počáteční vzdělávání

Prioritní osa je zaměřena na rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání, resp. na nastavení samotného systému počátečního vzdělávání tak, aby byl akceptován rovný přístup s důrazem na podporu klíčových dovedností, zajištění kvality vzdělávání pedagogických pracovníků a se zohledněním individuálního talentu každého jednotlivce, aby se zvýšila uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce a zároveň bylo dosaženo pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání.

Globální cíl prioritní osy 1:

Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Specifické cíle prioritní osy 1:

1. Zvýšení kvality počátečního vzdělávání.
2. Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
3. Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

V prioritní ose 1 jsou formulovány tři oblasti podpory:

- 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.
- 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
- 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Tab.č. 17: Finanční plán

Číslo oblasti podpory	Název oblasti podpory	Podíl na alokaci v P1	EU	SR	Celkové zdroje	Míra spolufinancování		Pro informaci	
						EU	ČR	EIB	Soukromé
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	52%	318 087 643	56 133 114	374 220 757	85%	15%	0	0
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	22%	132 192 268	23 328 047	155 520 315	85%	15%	0	0
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	26%	161 797 827	28 552 558	190 350 385	85%	15%	0	0

Zdroj: PD OP VK

3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.1.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO

V období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 byly vyhlášeny výzvy jak na grantové projekty tak na projekty individuální ostatní. Celková alokace na všechny vyhlášené výzvy (k předkládání GP a IPo) v rámci prioritní osy 1 činila 166 733 316 EUR. Přehled a podrobnější informace jsou uvedeny v tabulkách v kapitole 2.1.A.

Tab.č. 18: Věcný pokrok prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání

Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	Cílová hodnota 2015	Celkem
064310 výstup	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů	počet	MS OP VK	dosažená	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	6300	6300
074600 výstup	Počet úspěšně podpořených osob	počet	MS OP VK	dosažená	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	368 100	368 100
060401 výsledky	Podíl žáků zapojených do vzdělávacích aktivit v projektech na celkovém počtu žáků ve školách a školských zařízeních	%	MS OP VK ÚIV	dosažená	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	70	70
060402 výsledky	Podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd na celkovém počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	%	MS OP VK ÚIV	dosažená	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	55	55
074113 výsledky	Podíl úspěšně podpořených pracovníků škol a školských zařízení na celkovém počtu pracovníků škol a školských zařízení	%	MS OP VK ÚIV	dosažená	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	90	90

Zdroj: Výroční zprávy ZS

K 31. 12. 2008 nebyl na rozdíl od grantových projektů zatím schválen žádný individuální projekt ostatní. Z toho důvodu není naplněn žádný z monitorovacích indikátorů.

3.1.1.B Kvalitativní analýza

Vzhledem k tomu, že po celé období, za které je výroční zpráva zpracována, probíhal proces administrace a projekty zahájily realizaci nejdříve ke konci roku 2008 (pouze vybrané kraje), nebyla ke konci roku 2008 předložena žádá žádost o platbu.

Tab.č. 19: Reálný pokrok prioritní osy 1 v EUR¹⁰

Prioritní osa	Celková alokace podpory 2007 - 2013	Prostředky kryté rozhodnutím/Smlouvou z alokace 2007 - 2013	Předložené výdaje z alokace na roky 2007 - 2013	Realizované výdaje z alokace na roky 2007 - 2013	Proplacené prostředky příjemcům	Prostředky předložené k certifikaci	Certifikované výdaje EK
1	742 778 526,10	188 850 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdroj: MSC210 „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků“

Individuální projekty ostatní

Dne 21. července 2008 byla vyhlášena 1. výzva prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání ve všech oblastech podpory pro předkládání individuálních projektů ostatních. Celková alokace na danou výzvu byla 1 100 000 000 Kč (41 306 797 €). Výzva byla ukončena dne 30. října 2008.

Do výzvy bylo podáno 258 projektů v hodnotě 159 312 061 €. Nejčastějšími žadateli v této oblasti podpory byly NNO, školy a školská zařízení, VŠ a ÚOSS.

¹⁰ Byl použit doporučený měnový kurz EUR/CZK ve výši 26,63.

Globální granty

Výzvy k předkládání globálních grantů krajů v rámci Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání (oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3) byly vyhlášeny 12. prosince 2007. Návrhy globálních grantů byly kraji předloženy ve dnech 5. - 6. února 2008. V daném termínu bylo předloženo všech 39 návrhů globálních grantů krajů, které budou realizovány v rámci Prioritní osy 1- Počáteční vzdělávání.

Tab.č. 20: Přehled alokací schválených GG

Alokace na výzvy na GG dle krajů	Výše alokace na GG v EUR		
	Oblast podpory 1.1	Oblast podpory 1.2	Oblast podpory 1.3
Středočeský kraj	15 686 955	5 704 347	7 130 434
Jihočeský kraj	9 686 146	3 522 235	4 402 793
Plzeňský kraj	7 882 999	2 866 545	3 583 181
Karlovarský kraj	4 587 716	1 668 260	2 085 325
Ústecký kraj	12 684 184	4 612 431	5 765 538
Liberecký kraj	6 476 680	2 355 156	2 943 946
Královéhradecký kraj	8 426 836	3 064 304	3 830 380
Pardubický kraj	7 808 903	2 839 601	3 549 501
Vysočina	8 019 899	2 916 327	3 645 409
Jihomoravský kraj	17 089 940	6 214 524	7 768 155
Olomoucký kraj	9 698 298	3 526 654	4 408 317
Zlínský kraj	9 167 151	3 333 509	4 166 887
Moravskoslezský kraj	19 448 538	7 072 196	8 840 244
CELKEM na GG	136 664 244	49 696 089	62 120 111

Zdroj: Výroční zprávy ZS

Všechny předložené návrhy globálních grantů byly hodnotitelskými komisemi doporučeny poradě vedení MŠMT a ministři školství, mládeže a tělovýchovy ke schválení. Dne 21. března 2008 Mgr. Ondřej Liška, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, schválil 39 globálních grantů předložených v rámci Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání.

V průběhu měsíce června 2008 byla ze strany krajů iniciována jednání mezi zástupci Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zástupci krajů k problematice limitů mzdové regulace a případného zrušení jejich vykazování v projektech OP VK. Jednání probíhala i v průběhu měsíce července 2008, kdy došlo ke schválení znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty ze strany všech zúčastněných stran. Následně bylo vyjednané znění o poskytnutí dotace na GG schvalováno v orgánech krajů (Radách a Zastupitelstvech). Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla ze strany MŠMT vydávána v průběhu měsíců července – září 2008.

V souladu se s nastavenými pravidly byly Zprostředkujícím subjektům poskytnuty zálohové platby. Příjmy jednotlivých globálních grantů (tzn. poskytnuté zálohové platby ze strany ŘO OP VK) dosahují výše 62 108 938 EUR, což představuje 25 % alokace realizovaných globálních grantů v Prioritní ose 1. Zprostředkující subjekty v roce 2008 již také zaslaly první zálohové platby příjemcům pomoci v celkové výši 8 260 142 EUR.

V návaznosti na změny finanční alokace Komunikačního plánu, resp. Technické pomoci a posléze po schválení těchto změn v orgánech krajů (Radách a Zastupitelstvech) byly v průběhu měsíců května – června 2008 uzavírány Dodatky č. 1 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace OP VK, ve kterých byla provedena realokace finančních prostředků v rámci jednotlivých oblastí podpory Prioritní osy 5 – Technická pomoc.

I v průběhu 2. pololetí 2008 MŠMT ve spolupráci se zástupci krajů pokračovala jednání k problematice vykazování limitů mzdové regulace při realizaci globálních grantů a grantových projektů v rámci OP VK. Usnesením vlády ČR č. 1194 ze dne 22. září 2008 byla povinnost vykazovat limity mzdové regulace při realizaci globálních grantů a grantových projektů odstraněna. V návaznosti na tuto skutečnost byly ze strany Řídícího orgánu OP VK vydána Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která zrušila povinnost vykazovat výše uváděné limity mzdové regulace. Po vydání Rozhodnutí o změně došlo k úpravám znění Smluv o realizaci grantových projektů, příp. k vydání dodatků ke smlouvám o realizaci grantových projektů.

V říjnu 2008 se uskutečnily volby do krajských zastupitelstev. S ohledem na změnu ve vedení krajů došlo v některých ke zpomalení procesu schvalování grantových projektů a nedodržení časového harmonogramu včetně závazných termínů stanovených pro uzavírání právních aktů s úspěšnými předkladateli grantových projektů.

Z hlediska typů projektů v prioritní ose 1 a pokroku v jejich realizaci lze konstatovat následující:

Globální granty, resp. grantové projekty – V návaznosti na schválení globálních grantů byly v krajích vyhlášeny výzvy k předkládání grantových projektů v Prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3. Vyhlášení jednotlivých výzev krajů (průběžných nebo kolových), počet nárokových finančních prostředků a počty předložených projektů jsou uváděny v tabulkách této kapitoly a kapitoly 2.1.A.

Na první výzvy k předkládání grantových projektů v rámci globálních grantů krajů Prioritní osy 1 bylo celkem alokováno 125 614 277 EUR, což představuje 50,55 % objemu finančních prostředků schválených globální granty krajů. Na oblast podpory 1.1 bylo v prvních výzvách krajů vyčleněno 69 042 790 EUR, což představuje 51 % z celkové alokace na schválené globální granty. Výše alokace na oblast podpory 1.2 dosahuje 24 942 608 EUR, což představuje 51 % z celkové alokace schválených globálních grantů v dané oblasti podpory. V neposlední řadě na vyhlášenou oblast podpory 1.3 bylo v rámci prvních výzev alokováno celkem 31 441 121 EUR, což činí 51 % ze schválených GG. Alokace vymezené na výzvy v jednotlivých krajích uvádí tabulky v kapitole 2.2.1.

První výzvy krajů k předkládání grantových projektů se setkaly se značným zájmem ze strany žadatelů, jejichž předložené projekty, resp. nárokové finanční prostředky mnohonásobně převyšovaly finanční alokace stanovené na první výzvy krajů. Ze strany žadatelů bylo předloženo 2109 (je-li započteno i 2. kolo výzev ÚK) projektů. Nárokové prostředky a počty předložených projektů jsou uváděny v následující tabulce.

Tab.č. 21: alokované a žádané prostředky v rámci výzvy

Pořadí výzvy	Kraj	oblast podpory 1.1			oblast podpory 1.2			oblast podpory 1.3		
		Alokace na výzvu EUR	Celkem požadováno EUR	Požadované / alokované fin. prostředky (v %)*	Alokace na výzvu EUR	Celkem požadováno EUR	Požadované / alokované fin. prostředky (v %)*	Alokace na výzvu EUR	Celkem požadováno EUR	Požadované / alokované fin. prostředky (v %)*
1	JČK	3 755 163	17 817 021	474	938 791	2 734 324	291	938 791	6 534 480	696
1	JMK	9 579 613	41 783 376	436	3 585 909	9 619 240	268	4 388 508	11 735 286	267
1	KK	2 290 650	8 281 735	362	826 136	1 033 351	125	1 013 894	1 202 954	119
1	KHK	3 379 647	15 175 309	449	1 314 307	2 887 919	220	1 689 824	3 913 498	232
1	LK	1 651 553	14 867 940	900	600 565	2 975 084	495	750 706	5 520 276	735
1	MSK	6 806 988	47 510 515	698	2 475 268	7 400 614	299	3 094 086	9 598 418	310
1	OL	9 698 298	47 403 549	489	3 526 654	5 621 653	159	4 408 317	14 330 904	325
1	PK	1 952 226	12 939 188	663	709 900	2 180 050	307	887 375	3 730 978	420
1	PLZ	3 755 163	19 823 144	528	1 314 307	4 836 575	368	1 877 582	7 114 047	379
1	SČK	9 087 495	32 537 575	358	3 304 544	4 918 213	149	4 130 680	10 585 493	256
1	ÚK	3 755 163	6 517 977	174	1 877 582	2 799 052	149	1 877 582	5 097 686	272
1	Vysočina	3 755 163	23 848 445	635	1 351 859	3 798 568	281	1 689 824	5 646 592	334
1	ZK	4 506 196	17 398 365	386	1 614 720	3 829 584	237	2 065 340	9 619 179	466
2	ÚK	5 069 471	18 954 838	374	1 502 065	7 444 394	496	2 628 614	9 246 552	352
Celkem		69 042 790	324 858 978	471	24 942 608	62 078 623	249	31 441 121	103 876 342	330

Zdroj: Výroční zpráva ZS

*% vyjadřuje poměr mezi celkovým objemem prostředků, které žadatelé požadovali v předkládaných projektech ku celkové alokaci na danou výzvu.

Tab.č. 22: – Počet kontrahovaných projektů a objem finančních prostředků

Kontrahované projekty						
Kraj	Oblast podpory 1.1		Oblast podpory 1.2		Oblast podpory 1.3	
	Schválené fin. prostředky (Kč)	Počet projektů	Schválené fin. prostředky (Kč)	Počet projektů	Schválené fin. prostředky (Kč)	Počet projektů
JČK	-	-	-	-	-	-
JMK	-	-	-	-	-	-
KK	60 999 633	14	11 850 456	3	9 285 706	2
KHK	88 800 562	11	30 931 889	2	31 389 160	4
LK	43 980 839	8	15 902 480	3	19 972 536	5
MSK	176 583 069	46	29 462 619	10	51 339 628	9
OL	-	-	-	-	-	-
PK	38 055 447	14	15 541 741	4	23 628 900	4
PLZ	-	-	-	-	-	-
SČK	213 915 990	50	47 215 763	11	32 114 419	9
ÚK	229 713 439	14	86 313 452	5	115 258 326	8
Vysočina	-	-	-	-	-	-
ZK	119 858 919	28	-	-	-	-
CELKEM	971 907 899	185	237 218 401	38	282 988 675	41

Zdroj: Výroční zpráva ZS

V rámci prvních (Ústecký kraj také 2. výzva) výzev k předkládání grantových projektů bylo předloženo celkem 2003 projektových žádostí. Ke konci sledovaného období k 31. prosinci 2008 byly projektové žádosti v jednotlivých krajích zaregistrovány, zhodnoceny v rámci hodnocení formálního, přijatelnosti i věcného, předloženy výběrovým komisím k projednání (k doporučení/nedoporučení orgánům kraje ke schválení) a následně byly orgány kraje (Radami a Zastupitelstvy) schváleny k realizaci. S ohledem na změny politického vedení krajů došlo v období říjen – prosinec 2008 v některých krajích ke zpomalení fáze kontrahování schválených projektů. Ke konci roku 2008 nedošlo k uzavření právních aktů všech schválených grantových projektů. V rámci prvních výzev (v případě Ústeckého kraje první i druhé výzvy) bylo v rámci globálních grantů schváleno k realizaci celkem 502 grantových projektů v celkové výši 93 399 082 EUR. Nicméně v roce 2008 se nepodařilo uzavřít se všemi úspěšnými žadateli smlouvy o realizaci grantových projektů, a to také z důvodu výše uváděných. Celkem bylo v roce 2008 kontrahováno 264 projektů, což představuje 53% schválených projektů. Objem finančních prostředků kontrahovaných projektů činí 56 031 355 EUR.

Na základě předložených grantových projektů se ve struktuře žadatelů grantových projektů ukazuje, že v rámci výzev v roce 2008 byli zastoupeni všichni oprávnění žadatelé tak, jak je definuje Prováděcí dokument OP VK.


Tab.č. 23: Struktura žadatelů grantových projektů za PO 1

Forma žadatele v oblasti podpory	Oblast podpory 1.1	Oblast podpory 1.2	Oblast podpory 1.3
Školy a školská zařízení	270	54	38
z toho ZŠ	94	42	5
Vysoké školy	7	3	13
Sdružení a asociace škol	2	1	0
Právnícké osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství	26	1	-
Města, obce a svazky obcí	6	0	4
Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení	0	-	-
Hospodářská komora	5	-	-
Zaměstnavatelé	2	-	-
Nestátní neziskové organizace	19	17	17
Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže	-	2	-
Ostatní vzdělávací instituce	-	-	15
CELKEM	337	78	87

Zdroj: Výroční zprávy ZS


Velmi pozitivním aspektem je skutečnost, že více než 80% úspěšných žadatelů je tvořeno školami a školskými zařízeními v oblasti podpory 1.1. Struktura žadatelů dle jednotlivých oblastí podpory za všechny kraje, je také znázorněna v grafech, které ukazují procentní zapojení úspěšných žadatelů/příjemců v rámci všech realizovaných globálních grantech v Prioritní ose 1.

Graf č. 2: Struktura žadatelů schválených grantových projektů – oblast podpory 1.1

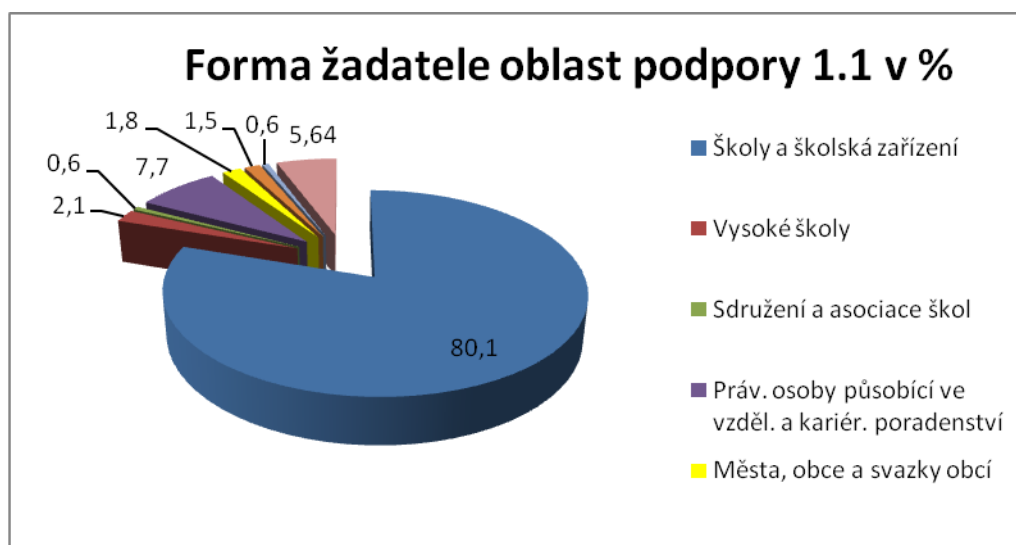


Zdroj: Výroční zprávy ZS

Graf č. 3: Struktura žadatelů podpořených grantových projektů – oblast podpory 1.2

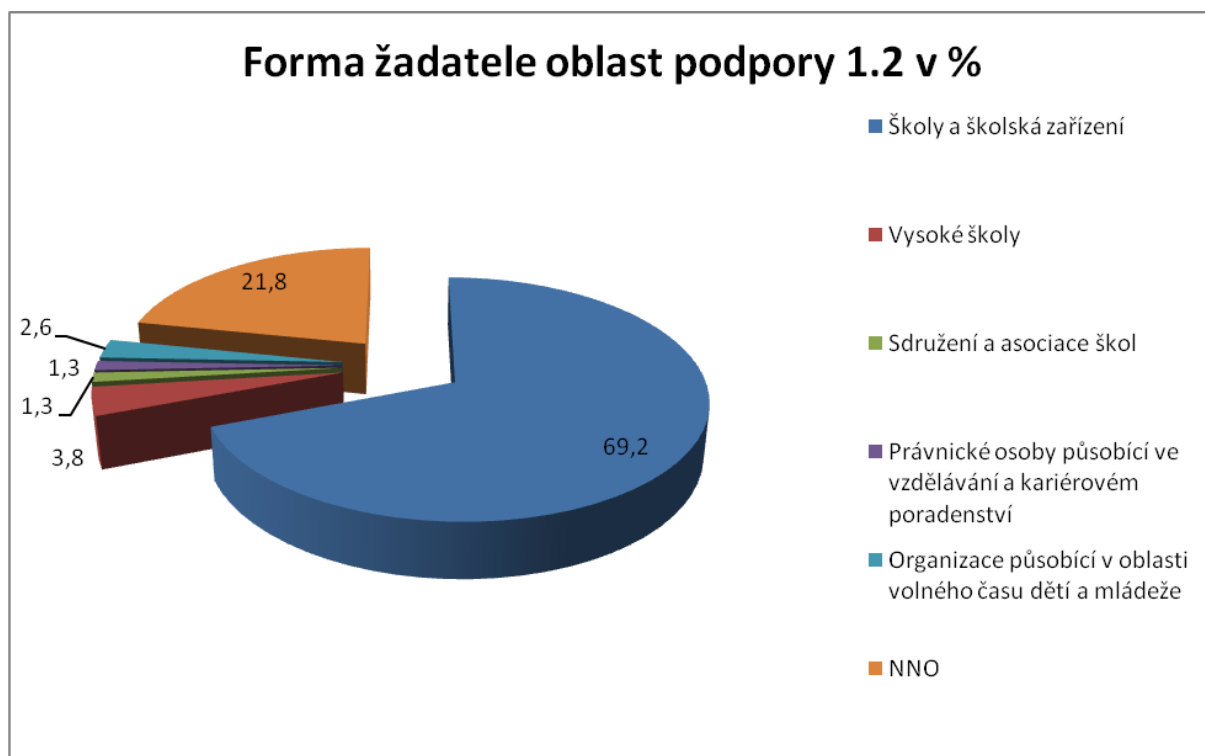

Zdroj: Výroční zprávy ZS

Graf č. 4: – Struktura žadatelů podpořených grantových projektů – oblast podpory 1.3

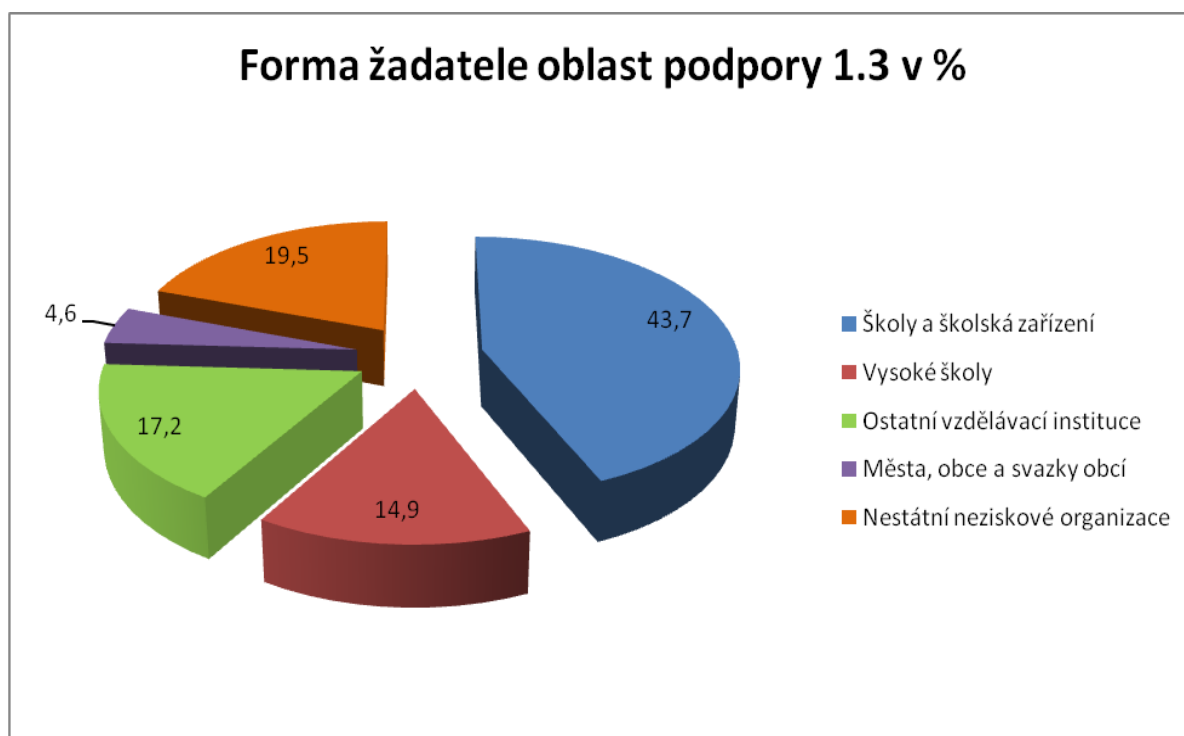

Zdroj: Výroční zprávy ZS


V souladu s cíli schválených GG úspěšní žadatelé realizují nebo budou realizovat projekty zejména zaměřené na níže uváděné podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu ve členění jednotlivých oblastí podpory.

Nejčastěji realizované podporované aktivity v GP v oblasti podpory 1.1

- Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech
- Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, včetně tvorby výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí
- Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků
- Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů
- Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů

Kvalitativní vyhodnocování naplňování cílů jednotlivých GG bude však možné vzhledem ke krátké době realizace grantových projektů až v následujícím roce 2009.

Graf č. 5: Nejčastěji realizované podporované aktivity GP – oblast podpory 1.1

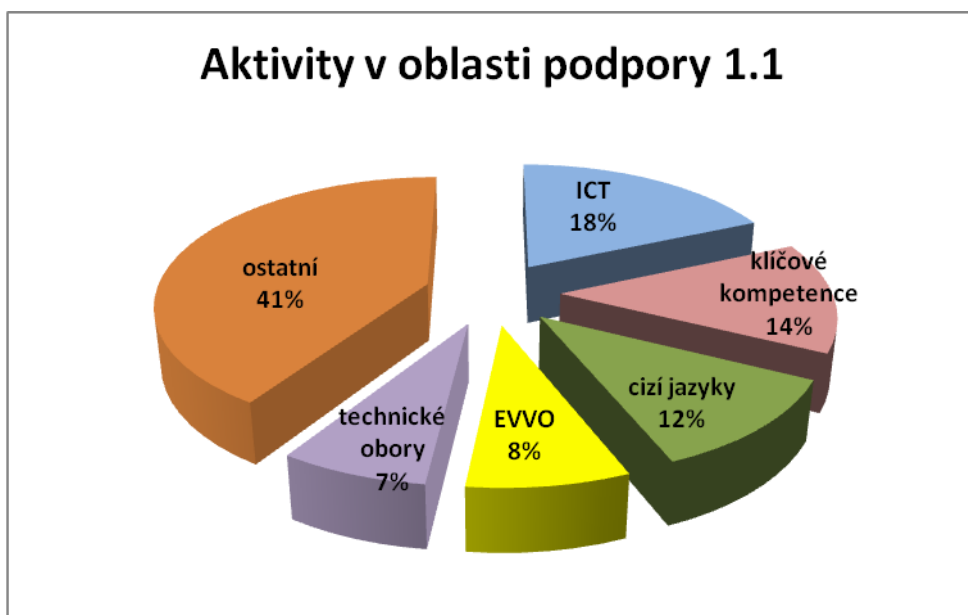

Zdroj: Výroční zpráva ZS


Nejčastěji realizované podporované aktivity v GP v oblasti podpory 1.2

- Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací
- Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání
- Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání
- Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním

Kvalitativní vyhodnocování naplňování cílů jednotlivých GG bude však možné vzhledem ke krátké době realizace grantových projektů až v následujícím roce 2009.

Graf č. 6: Nejčastěji realizované podporované aktivity GP – oblast podpory 1.2

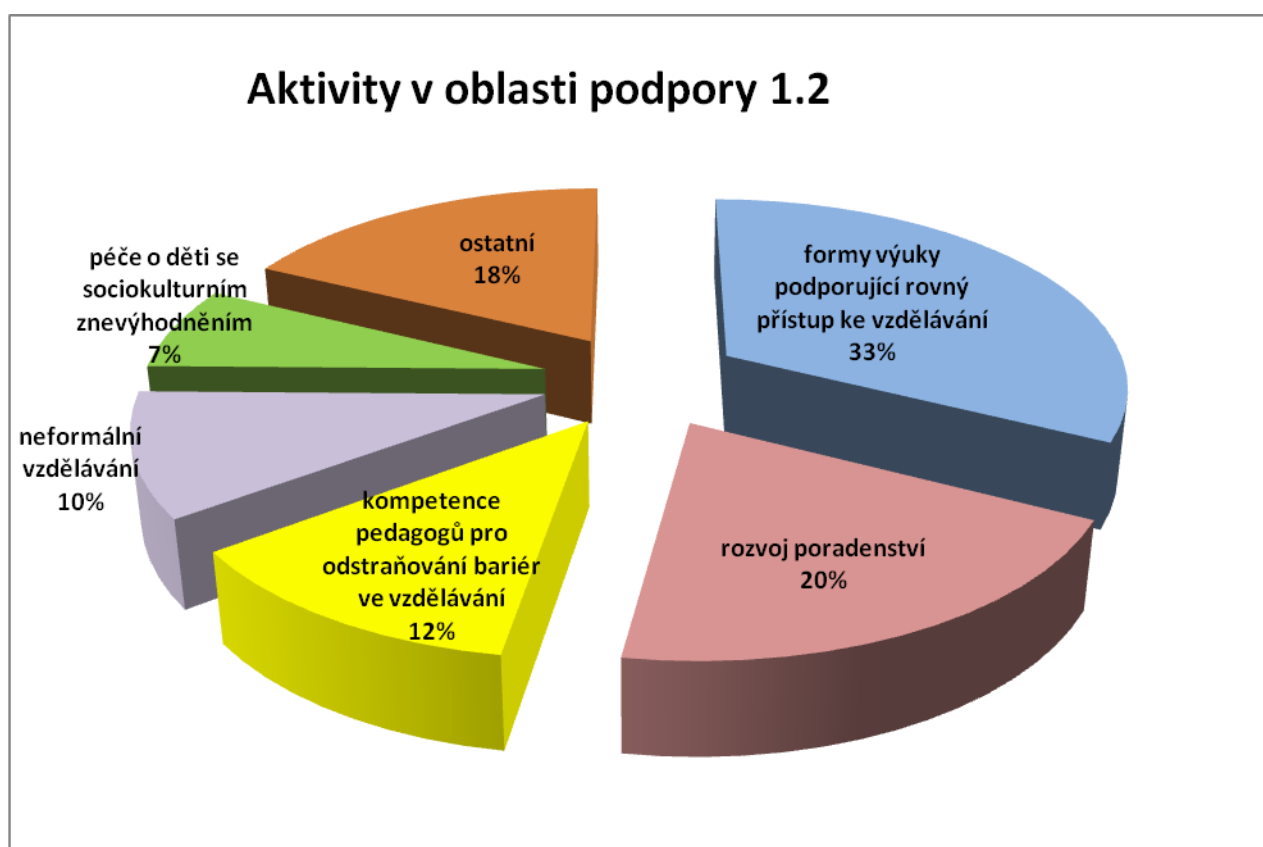

Zdroj: Výroční zprávy ZS


Nejčastěji realizované podporované aktivity v GP v oblasti podpory 1.3

- DVPP škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání
- Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky

- Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol

Kvalitativní vyhodnocování naplňování cílů jednotlivých GG bude však možné vzhledem ke krátké době realizace grantových projektů až v následujícím roce 2009.

Graf č. 7: Nejčastěji realizované podporované aktivity GP – oblast podpory 1.3

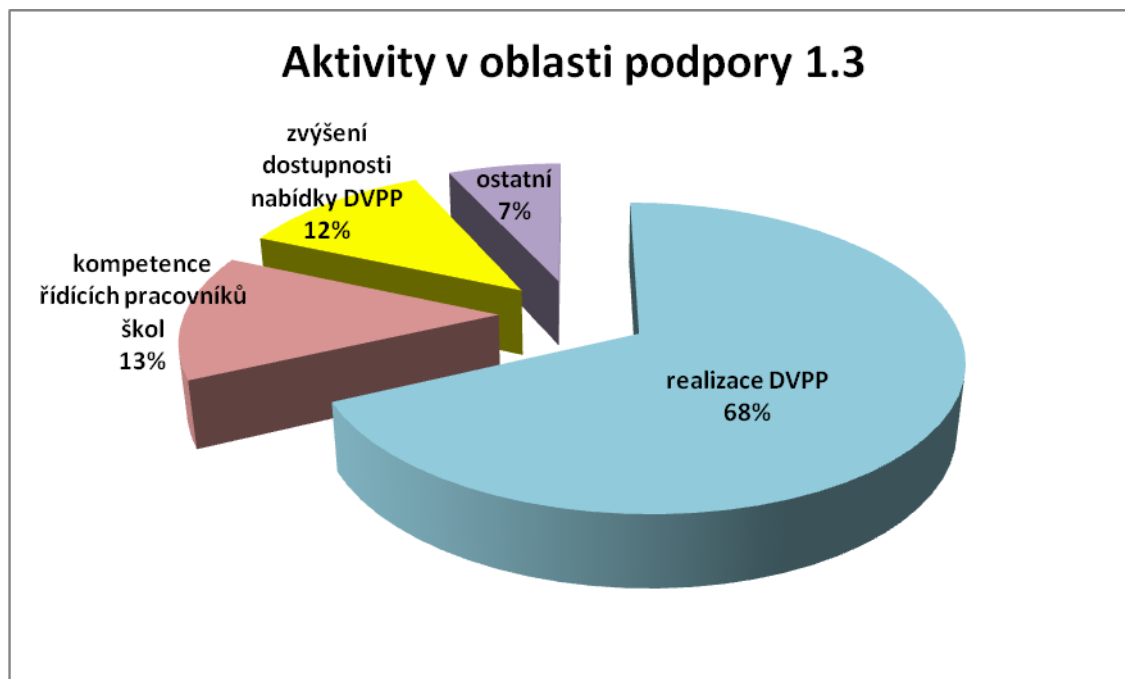

Zdroj: Výroční zprávy ZS

Pomoc podle cílových skupin

V globálních grantech realizovaných v oblasti podpory 1.1 jsou v podpořených projektech hlavní cílovou skupinou žáci škol, k nimž je směřována hlavní podpora v rámci grantových projektů. Sekundární cílovou skupinou ve většině podpořených projektů jsou pedagogičtí pracovníci škol, nicméně podpora pro tuto cílovou skupinu přinese další přidanou hodnotu žákům, tj. učitelé získají další znalosti a dovednosti, které jim umožní kvalitněji pracovat s primární cílovou skupinou – žáky nejen v podpořených projektech, ale také v rámci každodenního vyučování. Vzdělávací produkty vytvářené ve většině projektů rovněž slouží ke zkvalitnění vzdělávání primární cílové skupiny.

V grantových projektech realizovaných v rámci globálních grantů v oblasti podpory 1.2 jsou hlavní cílovou skupinou žáci škol a školských zařízení se speciálními vzdělávacími potřebami. Převažujícím zaměřením podpořených grantových projektů je pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami směřující k překonání jejich problémů a umožňující jejich zapojení do vzdělávacího procesu. Sekundární cílovou skupinou v části podpořených projektů jsou pracovníci škol a školských zařízení, jimž získaná podpora umožní kvalitně pracovat s primární cílovou skupinou, čímž umožní právě primární cílové skupině získat kvalitnější vzdělávání.

V neposlední řadě ve všech globálních grantech, resp. grantových projektech v oblasti podpory 1.3 jsou hlavní cílovou skupinou pracovníci škol a školských zařízení a to především v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávací produkty vytvářené ve

značné většině projektů slouží ke zkvalitnění vzdělávání právě této cílové skupiny. Je tedy možné říci, že všechny vybrané projekty v GG se zaměřují na podporu hlavní cílové skupiny.

3.1.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Globální granty

V průběhu ledna 2008 se objevily vážné nedostatky ve zpracování webové žádosti pro globální granty, které znemožnily předkládání návrhů GG k původně stanovenému termínu 16. ledna 2008. Předložení návrhů globálních grantů bylo po schválení ministrem školství, mládeže a tělovýchovy odloženo na 5. - 6. února 2008.

V dubnu 2008 ŘO OP VK ve spolupráci se ZS Moravskoslezského kraje požádal Ministerstvo financí o jednoznačné stanovisko k problematice uzavírání finančního partnerství a finančních tocích mezi příjemcem, partnery a poskytovatelem dotace v projektech OP VK. Problematika finančního partnerství bude řešena v rámci novely zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Zvýšená náročnost administrace globálních grantů, resp. grantových projektů byla dána povinností vykazovat v projektech OP VK tzv. limity mzdové regulace. V návaznosti na četná jednání mezi zástupci MŠMT, MF a krajů byla problematika stále diskutována v průběhu 1. pololetí 2008, což také ovlivnilo časový harmonogram spojený s vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty. Usnesením vlády ČR č. 1194 ze dne 22. září 2008 byla povinnost vykazování limitů mzdové regulace v globálních grantech a grantových projektech OP VK zrušena.

Grantové projekty

V rámci realizace grantových projektů byly identifikovány problémy, které úzce souvisejí s počátky nastavení a zahájení realizace OP VK. Zprostředkující subjekty definovaly níže uváděné problémy spojené s administrací GG a GP:

- změny řízené kopie Manuálu OP VK a jeho příloh, Příručky pro žadatele OP VK v průběhu výzev k předkládání projektových žádostí grantových projektů, příp. neexistence Příručky pro příjemce v 1. polovině 2008. Toto riziko bude do budoucna eliminováno prostřednictvím stabilizace postupů a procesů na základě zkušeností prvních výzev;
- změny Prováděcího dokumentu OP VK k 18. červnu 2008 – v návaznosti na tuto skutečnost bylo nutné upravit podmínky již vyhlášených výzev;
- technické problémy s aplikací Monit7+ při zadávání dat a změně stavů u projektů v rámci procesu administrace, věcného hodnocení. Veškeré problémy byly ihned řešeny s poskytovatelem aplikace, který však mnohdy požadavky řešil se zpožděním. Tím docházelo ke zbytečným časovým prodlevám a problematickému plnění stanovených povinností ze strany ZS. Na základě výše zmíněného byly ZS nuceny požádat ŘO o prodloužení termínu při administraci GP. Výjimky ze strany ŘO OP VK byly uděleny;
- v rámci věcného hodnocení výstupy hodnocení individuálními hodnotiteli neodpovídaly stanoveným požadavkům. Hodnotitelé museli v souladu s uzavřenou smlouvou hodnocení dopracovat (týkalo se komentářů k jednotlivým bodovým ohodnocením). Ze strany ŘO

OP VK bude provedeno opětovné proškolení hodnotitelů v problémových oblastech, příp. spolupráce bude pokračovat pouze s hodnotiteli, jejichž výsledky práce jsou kvalitní a v souladu se stanovenými pravidly a požadavky OP VK;

- krátké termíny stanovené v řízené dokumentaci - Manuálu OP VK pro administraci projektů (hodnocení formální, přijatelnosti, věcné). ŘO OP VK v souvislosti s administrativní náročností při administraci GP a možnosti nesplněných termínů stanovených v řízené dokumentaci udělil výjimky ze stanovených postupů po řádném zdůvodnění žádosti ze strany Zprostředkujícího subjektu (termíny v Manuálu OP VK jsou v souladu mj. i s vyššími dokumenty – např. Metodikou monitorování, jakékoli další prodlužování termínů by vedlo k prodloužení doby od podání do schválení projektu a žadatel by tak dotaci získal např. až rok od vyhlášení výzvy, kdy se podmínky pro realizaci projektu mohou významně změnit);
- nepochopení ze strany žadatelů definici monitorovacích indikátorů příp. nejasné definice monitorovacích indikátorů. Během výzev nebyly k dispozici závazné definice jednotlivých monitorovacích indikátorů, které by jednoznačně popisovaly jejich význam a způsob naplňování. Z toho důvodu chápalo mnoho žadatelů jednotlivé indikátory odlišně a docházelo k situacím, kdy díky nepřesnému pochopení byly v projektech nesprávně stanoveny jak indikátory samotné, tak jejich předpokládané hodnoty;
- problematika poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. není pro potřeby realizace projektů spolufinancovaných z EU a státního rozpočtu ČR řešena na národní úrovni. Povinnost poskytovat dle výše uváděného zákona veškeré informace vztahující se např. k hodnocení předkládaných projektů může ohrozit transparentnost celého výběrového procesu včetně porušení podmínek rovného zacházení (v případě zneužití know-how subjektů předkládajících kvalitní a inovativní projekty). Nevyřešenou otázkou zůstává, zda zveřejněním těchto informací nedochází k porušení hospodářské soutěže, příp. práva soutěžního nebo obchodního tajemství.

3.2 Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 naplňuje druhý specifický cíl OP VK a je zaměřena na modernizaci terciárního vzdělávání, včetně zatraktivnění systému vyššího odborného vzdělávání. Prioritní osa se dále zaměřuje na zatraktivnění oblasti výzkumu a vývoje a upevnění partnerství a sítě mezi veřejným a soukromým sektorem.

Globální cíl prioritní osy 2

Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.

Specifické cíle prioritní osy 2

1. Zkvalitnění vzdělávání na vyšších odborných školách.
2. Zvýšení kvality a prohloubení diverzifikace vysokých škol s důrazem na požadavky znalostní ekonomiky.
3. Zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje včetně zlepšení odborné přípravy a podmínek pracovníků a využití vhodných motivačních a propagačních nástrojů.
4. Posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými institucemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy (včetně propagačních aktivit).

V prioritní ose 2 jsou formulovány čtyři oblasti podpory:

- 2.1 Vyšší odborné vzdělávání
- 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
- 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
- 2.4 Partnerství a sítě

Tab. č. 24: Finanční plán

V €

Číslo oblasti podpory	Název oblasti podpory	Podíl na alokaci v P2	EU	SR	Celkové zdroje	Míra spolufinancování		Pro informaci	
						EU	ČR	EIB	soukromé
2.1	Vyšší odborné vzdělávání	12%	75 735 153	13 365 027	89 100 180	85%	15%	0	0
2.2	Vysokoškolské vzdělávání	35%	220 320 446	38 880 079	259 200 525	85%	15%	0	0
2.3	Lidské zdroje ve VaV	33%	206 550 418	36 450 074	243 000 492	85%	15%	0	0
2.4	Partnerství a sítě	20%	123 930 251	21 870 044	145 800 295	85%	15%	0	0

Zdroj: PD OP VK

3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

V roce 2008 byly vyhlášeny v rámci této prioritní osy dvě výzvy, a to pro oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání a 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Výzva pro oblast podpory 2.2 byla vyhlášena dne 19. května 2008 v celkové alokaci 1 209 000 000 Kč (45 399 925 EUR) a termín jejího ukončení byl 19. září 2008. Výzva pro oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji byla vyhlášena dne 13. října 2008 s celkovou alokací 1 100 000 000 Kč (41 306 797 EUR).

3.2.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO**Tab. č. 25: Věcný pokrok prioritní osy 2 Terciární vzdělávání**

Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru	Název indikátoru		Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	Cílová hodnota 2015	Celkem
074100 výstupy	Počet podpořených osob celkem		počet	MS OP VK	dosažená	0	0	N/A	0
					výchozí	0	0	N/A	0
					plánovaná	N/A	N/A	140 400	140 400
074101 výstupy	v tom	Počet podpořených osob - studentů celkem	počet	MS OP VK	dosažená	0	0	N/A	0
					výchozí	0	0	N/A	0
					plánovaná	N/A	N/A	126 500	126 500
074102 výstupy		Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání	počet	MS OP VK	dosažená	0	0	N/A	0
					výchozí	0	0	N/A	0
					plánovaná	N/A	N/A	13 900	13 900
074170 výstupy	z toho	pracovníci ve VaV	počet	MS OP VK	dosažená	0	0	N/A	0
					výchozí	0	0	N/A	0
					plánovaná	N/A	N/A	6 000	6 000
074270 výstupy	Počet zapojených partnerů		počet	MS OP VK	dosažená	0	0	N/A	0
					výchozí	0	0	N/A	0
					plánovaná	N/A	N/A	450	450
074210 výsledky	Podíl úspěšně podpořených osob - studentů v terciárním vzdělávání na celkovém počtu podpořených osob v terciárním vzdělávání		%	MS OP VK ÚIV	dosažená	0	0	N/A	0
					výchozí	0	0	N/A	0
					plánovaná	N/A	N/A	90	90
074240 výsledky	Podíl úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání na celkovém počtu podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání		%	MS OP VK ÚIV	dosažená	0	0	N/A	0
					výchozí	0	0	N/A	0

				plánovaná	N/A	N/A	90	90
074250 výsledky	Podíl úspěšně podpořených osob - pracovníků ve VaV na celkovém počtu podpořených osob - pracovníků ve VaV	%	MS OP VK IS VaV	dosažená	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	90	90
074280 výsledky	Udržitelnost vytvořených partnerství	%	ŘO OP VK	dosažená	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	20	20

Zdroj: Monitorovací zprávy ZS

K 31. 12. 2008 nebyl v rámci této prioritní osy schválen žádný individuální projekt ostatní. Z toho důvodu není naplněn žádný z monitorovacích indikátorů.

3.2.1.B Kvalitativní analýza

Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období probíhaly pouze výzvy a ke konci roku nebyl dokončen proces hodnocení, nebyla zahájena realizace projektů a nebyla ke konci roku 2008 předložena žádná žádost o platbu.

Tab. č. 26: Reálný pokrok prioritní osy 2 v EUR

Prioritní osa	Celková alokace podpory 2007 - 2013	Prostředky kryté rozhodnutím/Smlouvou z alokace 2007 - 2013	Předložené výdaje z alokace na roky 2007 - 2013	Realizované výdaje z alokace na roky 2007 - 2013	Proplacené prostředky příjemcům	Prostředky předložené k certifikaci	Certifikované výdaje EK
2	760 324 477,24	193 311 973,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdroj: MSC210 „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků“

3.2.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

V druhé polovině roku 2008 se problematickou oblastí stala třetí fáze hodnocení projektových žádostí, tzv. věcné hodnocení, které je prováděno individuálními externími hodnotiteli. Pro zajištění transparentnosti, objektivitu a snížení významných rozdílů v jednotlivých hodnoceních budou v roce 2009 zpřísněna kritéria pro výběr hodnotitelů a změněna struktura školení hodnotitelů. Vedle úvodního školení budou hodnotitelé absolvovat specifická školení k jednotlivým výzvám. Bude zpracována analýza práce hodnotitelů, jejichž výsledků bude využito pro posouzení další spolupráce s hodnotitelem. Rovněž bude přistoupeno k většímu využívání hodnotitelských komisí.

V rámci administrace projektových žádostí byla problémem nedostatečná personální kapacita a vysoká vytiženost pracovníků implementační struktury zajišťujících administraci projektových žádostí.

3.3 Prioritní osa 3 – Další vzdělávání

V rozvinutých ekonomikách představuje vzdělanost a flexibilita klíčovou konkurenční výhodu jak pro jednotlivce, tak udržitelný rozvoj celé společnosti. Znalosti a dovednosti osvojené v procesu počátečního vzdělávání v důsledku rychlých technologických a dalších změn již nestačí a další vzdělávání spojené s doplňováním, zvyšováním nebo změnou kvalifikace se stává nezbytností.

Globální cíl prioritní osy 3:

Posílit adaptabilitu a flexibilitu lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.

Specifické cíle prioritní osy 3:

1. Usnadnění individuálního přístupu obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a zvýšení jejich motivace k celoživotnímu učení.
2. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání.

V prioritní ose 3 jsou formulovány dvě oblasti podpory:

3.1 Individuální další vzdělávání

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Tab. č. 27: Finanční plán

v €

Číslo oblasti podpory	Název oblasti podpory	Podíl na alokaci v P3	EU	SR	Celkové zdroje	Míra spolufinancování		Pro informaci	
						EU	ČR	EIB	soukromé
3.1	Individuální další vzdělávání	50%	144 947 662	25 578 999	170 526 661	85%	15%	0	0
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	50%	144 947 662	25 578 999	170 526 661	85%	15%	0	0

Zdroj: PD OP VK

3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

Oblast podpory 3.1 - Individuální další vzdělávání

V roce 2008 nebyly vyhlášeny v rámci této prioritní oblasti žádné výzvy. Vyhlásování výzvy je plánováno na rok 2009.

Oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Výzva pro tuto oblast podpory byla vyhlášena 15. 12. 2008. Jednalo se o průběžnou výzvu, která byla určena Skupině II MŠMT k předkládání IPn. Do konce roku v rámci této výzvy nedošlo k předložení žádného projektu, proto nelze uvést věcné naplňování indikátorů ani finanční čerpání. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 300 mil. Kč (11 265 490 EUR).

Dne 14. listopadu 2008 byla v rámci oblasti podpory 3.2 vyhlášena průběžná výzva k předkládání globálních grantů z OP VK, oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Celková alokovaná částka pro tuto výzvu činí 2 835 005 720 Kč (106 459 096 €).

Do konce roku v rámci těchto výzvy nedošlo k předložení žádného projektu, proto nelze uvést věcné naplňování indikátorů ani finanční čerpání.

3.3.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO

Tab. č. 28: Věcný pokrok prioritní osy 3 Další vzdělávání

Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	Cílová hodnota 2015	Celkem
074600 výstupy	Počet úspěšně podpořených osob celkem	počet	MS OP VK	dosažená	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	1 800 000	1 800 000
064310 výstupy	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů	počet	MS OP VK	dosažená	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	2 300	2 300
060351 výsledky	Podíl účastníků jednotlivých akcí dalšího vzdělávání / počet osob v dalším vzdělávání (k celkovému počtu obyvatel ve věku 25-64 let)	%	MS OP VK ÚIV	dosažená	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	30	30

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých krajů

K 31. 12. 2008 nebyl schválen žádný individuální projekt ostatní ani grantový projekt. Z toho důvodu není naplněn žádný z monitorovacích indikátorů.

3.3.1.B Kvalitativní analýza

Tab. č. 29: Reálný pokrok prioritní osy 3 v EUR¹¹

Prioritní osa	Celková alokace podpory 2007 - 2013	Prostředky kryté rozhodnutím/Smlouvou z alokace 2007 - 2013	Předložené výdaje z alokace na roky 2007 - 2013	Realizované výdaje z alokace na roky 2007 - 2013	Proplacené prostředky příjemcům	Prostředky předložené k certifikaci	Certifikované výdaje EK
3	351 798 487,78	89 444 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdroj: MSC210 „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků“

Vzhledem k tomu, že celé období, za které je výroční zpráva zpracována, probíhal proces administrace nebyla ke konci roku 2008 předložena žádná žádost o platbu.

¹¹ Byl použit doporučený měnový kurz EUR/CZK ve výši 26,63.

3.3.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

V roce 2008 se nevyskytly žádné problémové oblasti v souvislosti s implementací PO 3.

3.4 *Prioritní osa 4a – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)* *Prioritní osa 4b – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)*

Cílem těchto prioritních os je realizace národních systémových aktivit dotýkajících se všech výše uvedených věcných priorit, a to na území celé ČR včetně území hlavního města Prahy. Jedná se o specifické vícecílové prioritní osy vytvořené za účelem podpory a financování aktivit podporujících budování systému na úrovni počátečního, terciárního i dalšího vzdělávání.

Prioritní osa 4a zahrnuje podíl systémových aktivit programu v regionech Konvergence. Prioritní osa 4b zahrnuje podíl systémových aktivit programu v regionech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Globální cíl prioritních os 4a a 4b:

Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

Specifické cíle prioritních os 4:

1. Vytvoření systému podporujícího zvýšení kvality počátečního vzdělávání.
2. Vytvoření systémového a institucionálního rámce pro oblast terciárního vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumné a vývojové činnosti.
3. Dokončení ucelené koncepce, systémového a institucionálního rámce dalšího vzdělávání a zajištění jeho propojení s počátečním vzděláváním.

V prioritních osách 4a a 4b jsou formulovány tři oblasti podpory:

- 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání
- 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
- 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání

Tab. č. 30: Finanční plán

V €

Číslo oblasti podpory	Název oblasti podpory	Podíl na alokaci v P4a/4b	EU	SR	Celkové zdroje	Míra spolufinancování		Pro informaci	
						EU	ČR	EIB	soukromé
4a 1 (Konvergence)	Systémový rámec počátečního vzdělávání	36%	76 423 655	13 486 527	89 910 182	85%	15%	0	0
4b 1 (RKZ)			5 878 743	1 037 425	6 916 168	85%	15%	0	0

4a 2 (Konvergence)	Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji	29%	61 965 125	10 935 022	72 900 147	85%	15%	0	0
4b 2 (RKZ)			4 766 548	841 155	5 607 703	85%	15%	0	0
4a 3 (Konvergence)	Systémový rámec dalšího vzdělávání	34%	72 473 831	12 789 500	85 263 331	85%	15%	0	0
4b 3 (RKZ)			5 574 910	983 808	6 558 718	85%	15%	0	0

Zdroj: PD OP VK

3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

V roce 2008 byla vyhlášena průběžná výzva č. 6 pro všechny oblasti podpory prioritní osy 4 Systémový rámec celoživotního učení v celkové alokaci 3 640 000 000 Kč (136 680 946 €). Do konce roku 2008 bylo předloženo celkem 12 individuálních projektů národních: 9 v oblasti podpory 4.1, a 3 projekty do oblasti podpory 4.2. V obou oblastech podpory byly schváleny tři projekty, viz tab. č.7. Ve sledovaném období nedošlo k realizaci projektů, nelze tak uvádět **věcné naplňování indikátorů** ani **výši vyplacených finančních prostředků**. První schválené projekty jsou realizovány od 1.1. 2009.

Ve schválených projektech budou podpořeny následující cílové skupiny:

- Projekt: **Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů**
- studenti doktorských studijních programů a výzkumní zaměstnanci všech institucí
- Projekt: **Koordinátor S1 - Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol** na tvorbu a realizaci ŠVP
- vedoucí pracovníci středních odborných škol a koordinátoři ŠVP na SŠ
- Projekt: **Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání**
- pracovníci škol a školských zařízení
- vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
- žáci
- Projekt: **Metodická podpora růstu kvality učitelské profese**
- pedagogové základních, základních uměleckých a středních škol, vč. vedoucích pracovníků a školských zařízení
- Projekt: **Reforma terciárního vzdělávání**
- studenti v terciárním vzdělávání a studenti současných vyšších odborných škol
- aktuální i potenciální uchazeči o studium v sektoru terciárního vzdělávání či na některé z vyšších odborných škol
- absolventi vysokých škol

- zaměstnanci vysokých škol, vyšších odborných škol a výzkumných a rozvojových institucí

- Projekt: **Podpora technických a přírodovědných oborů** má následující cílové skupiny:
 - Potenciální zájemci o studium a studenti technických a přírodovědných oborů vysokých škol
 - Reprezentanti subjektů spoluvytvářejících postoje a ovlivňujících rozhodování první cílové skupiny

3.4.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO

Ve sledovaném období nebyly naplněny žádné indikátory OP VK, více viz. tabulka.

Tab. č. 31: Věcný pokrok prioritní osy 4 Systémový rámec celoživotního vzdělávání

Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	Cílová hodnota 2015	Celkem
064321 výstup	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů vedoucí ke zvyšování kvality počátečního vzdělávání	počet	MS OP VK	dosažená	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	108	108
064322 výstupy	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů v oblasti terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve VaV	počet	MS OP VK	dosažená	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	87	87
064311 výstupy	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů v dalšího vzdělávání a produktů podporující zajištění propojení dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním	počet	MS OP VK	dosažená	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	1400	1400
064320 výsledky	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s celostátním dopadem	počet	MS OP VK	dosažená	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	63	63

Zdroj: Monitorovací zprávy jednotlivých krajů

3.4.1.B Kvalitativní analýza

Tab. č. 32: Reálný pokrok prioritní osy 4 v EUR¹²

Prioritní osa	Celková alokace podpory 2007 - 2013	Prostředky kryté rozhodnutím/Smlouvou z alokace 2007 - 2013	Předložené výdaje z alokace na roky 2007 - 2013	Realizované výdaje z alokace na roky 2007 - 2013	Proplacené prostředky příjemcům	Prostředky předložené k certifikaci	Certifikované výdaje EK
4a	255 889 424,20	65 059 708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	19 683 800,59	5 348 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdroj: MSC210 „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků“

3.4.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

V roce 2008 se nevyskytly žádné problémové oblasti v souvislosti s implementací PO 4.

¹² Byl použit doporučený měnový kurz EUR/CZK ve výši 26,63.

3.5 *Prioritní osa 5a – Technická pomoc (cíl Konvergence)* *Prioritní osa 5b – Technická pomoc (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)*

V rámci prioritních os Technická pomoc budou financovány akce zaměřené na posílení administrativní kapacity implementačních orgánů OP VK a na podporu přípravy programových dokumentů nového programového období. V neposlední řadě akce zaměřené na posílení absorpční kapacity subjektů pro čerpání prostředků z OP VK.

Prioritní osa 5a zahrnuje podíl aktivit programu v regionech Konvergence.

Prioritní osa 5b zahrnuje podíl aktivit programu v regionech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Globální cíl prioritních os 5a a 5b:

Dosažení úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu.

Specifické cíle prioritních os 5a a 5b:

1. Zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluace) programu, včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury.
2. Zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu
3. Zvýšit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů.

V prioritních osách 5a a 5b jsou formulovány tři oblasti podpory:

- 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
- 5.2 Informovanost a publicita programu
- 5.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program

Tab. č. 33: Finanční plán

V €

Číslo oblasti podpory	Název oblasti podpory	Podíl na alokaci v P5a/5b	EU	SR	Celkové zdroje	Míra spolufinancování		Pro informaci	
						EU	ČR	EIB	soukromé
5a 1 (Konvergence)	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	90%	65 226 448	11 510 550	76 736 998	85%	15%	0	0
5b 1 (RKZ)			583 927	103 046	686 973	85%	15%	0	0
5a 2 (Konvergence)	Informovanost a publicita programu	5%	3 623 692	639 475	4 263 167	85%	15%	0	0
5b 2 (RKZ)			32 441	5 725	38 166	85%	15%	0	0

5a 3 (Konvergence)	Zvýšení absorpční kapacity	5%	3 623 691	639 475	4 263 166	85%	15%	0	0
5b 3 (RKZ)			32 440	5 725	38 165	85%	15%	0	0

Zdroj: PD OP VK

3.5.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.5.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO

Prioritní osa Technická pomoc se rozděluje dle cíle Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost na 5a a 5b. Výzvy jsou však vypisovány současně pro oba cíle z důvodu obtížného rozlišení cílů vzhledem k jednotlivým aktivitám. Proto i následující tabulka obsahuje plnění indikátorů a dosažený pokrok dohromady za obě prioritní osy 5a a 5b. Pro zajištění možnosti čerpání prostředků TP byly 15. 2. 2008 vyhlášeny průběžné výzvy TP OP VK v prioritní ose 5a a 5b pro oblasti podpory 5.1, 5.2, 5.3. Vzhledem ke změnám alokací na jednotlivé oblasti podpory byly výzvy 5. 5. 2008 doplněny. V rámci výzvy byly předkládány projekty jak ŘO, tak ZS. Celkem bylo schváleno 48 projektů. viz tab. kapitola 2.1.A. U schválených projektů došlo k vyplacení žádaných záloh a nebyla proplacena žádná žádost o platbu. Podrobně se PO 5 Technická pomoc věnuje kapitola 6.

Tab. č. 34: Věcný pokrok prioritní osy 5 Technická pomoc

Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	Cílová hodnota 2015 ¹³	Celkem
480500 výstup	Počet nově vytvořených produktů (realizace studií a zpráv)	počet	MS OP VK	dosažená	0	6	N/A	6
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	200	200
481100 výstup	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí	počet	MS OP VK	dosažená	0	120	N/A	120
				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	1 000	1 000
485000 výsledek	Míra spokojenosti příjemců podpory	%	MS OPVK	dosažená	0	91,3	N/A	91,3 ¹⁴

¹³ Plánovaná cílová hodnota 2015 je dána jako součet cílové hodnoty 2015 za cíl konvergence a cílové hodnoty 2015 za cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

¹⁴ Výsledná hodnota je vypočtena jako průměr daného indikátoru na úrovni 3 krajů, které tento indikátor vykazovaly.

				výchozí	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	70	70

Zdroj: Výroční zpráva odboru technické pomoci za realizaci individuálních projektů TP OP VK 2008

3.4.1.B Kvalitativní analýza

Tab. č. 35: Reálný pokrok prioritní osy 5 v EUR¹⁵

Prioritní osa	Celková alokace podpory 2007 - 2013	Prostředky kryté rozhodnutím/Smlouvou z alokace 2007 - 2013	Předložené výdaje z alokace na roky 2007 - 2013	Realizované výdaje z alokace na roky 2007 - 2013	Proplacené prostředky příjemcům	Prostředky předložené k certifikaci	Certifikované výdaje EK
5a	87 949 622,20	22 361 130,68	290 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5b	787 352,52	213 934,31	26 589,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdroj: MSC210 „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků“

3.5.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Problémy při administraci projektů technické pomoci souvisely se zaváděním TP OP VK (neověřené postupy, noví pracovníci, nekompletnost Příruček pro žadatele a příjemce a Příručky pro provádění TP). Tyto problémy byly řešeny dopracováním vnitřních postupů a kompetencí v Příručce pro provádění technické pomoci a to v průběhu celého roku.

Problematickou oblastí byla dále projektová žádost Benefit7, která v době vyhlášení výzev nebyla finálně dopracována, nefunkčnost systému monitorovacích zpráv a ŽoP v systému Monit7+. Monitorovací systém byl poruchový a působil problémy. Situace byla řešena podáváním hlášení poruchovosti na firmu Tesco, předkládáním MZ v tištěné formě dokumentu word. Poruchovost systému pokračovala v průběhu celého roku.

Komplikací při realizaci projektů byla potřeba vyhlášení nadlimitních výběrových řízení, na které neměl odbor technické pomoci odborné kapacity. Odbor zažádal o možnost výběru kompetentní poradenské firmy, žádost byla zaslána vedení MŠMT k odsouhlasení. Situace nebyla k 30. 6. 2008 vyřešena. Proto docházelo ke zpoždění realizace projektů s nadlimitními veřejnými zakázkami. Od září byla situace vyřešena využitím poradenské firmy vysoutěžené MŠMT.

Podmínky pro práci pracovníků ŘO byly ztíženy stěhováním - změnou pracoviště celé Sekce řízení operačních programů EU. Přetrvávajícím problémem byla vysoká vytíženost pracovníků implementační struktury, která neumožňuje rychlejší optimalizaci procesů.

¹⁵ Byl použit doporučený měnový kurz EUR/CZK ve výši 26,63.

4 PROGRAMY ESF: SOUDRŽNOST A ZAMĚŘENÍ

Koordinace programů financovaných z Evropského sociálního fondu

V programovém období 2007 – 2013 je finanční podpora z ESF realizována prostřednictvím tří operačních programů OP LZZ, OP VK a OP PA, tj. implementace je zajišťována prostřednictvím tří řídicích orgánů – Ministerstva práce a sociálních věcí, MŠMT a hlavního města Prahy. Vzájemná provázanost a synergie operačních programů spolufinancovaných z ESF jak z hlediska obsahového, tak i časového je zajištěna na základě spolupráce a vzájemné koordinace aktivit především pomocí následujících mechanismů:

- monitorovací výbory jednotlivých programů ESF jsou, tam kde je to vhodné, navzájem provázány prostřednictvím zástupců shodných členských organizací;
- v jednotlivých monitorovacích výborech jsou též zastoupeny řídicí orgány ostatních dvou programů Evropského sociálního fondu;
- za účelem identifikace a řešení společných problémů je ustavena koordinační skupina řídicích orgánů programů Evropského sociálního fondu;
- centrální část monitorovacího systému MSC2007 všech tří operačních programů je zpřístupněna řídicím orgánům k náhledu tak, aby byla zajištěna vzájemná informovanost o realizovaných projektech;
- v rámci komunikační strategie jednotlivých operačních programů jsou zahrnuta společná témata, jako např. jednotné prvky vizuální identity, pokračování správy společné webové stránky Evropského sociálního fondu v ČR (www.esfcr.cz), založené v rámci předchozího programového období atd;
- nadále pokračují činnosti společných pracovních skupin, založených v předchozím programovém období.

V souladu s usnesením vlády č. 159/1998 je koordinační rolí pro Evropský sociální fond pověřeno Ministerstvo práce a sociálních věcí, členem Výboru pro Evropský sociální fond za ČR je vzhledem k působnosti resortu Ministerstva práce a sociálních věcí zástupce řídicího orgánu OP LZZ. Alternátem je pak zástupce OP VK.

Koordinační mechanismy pro Evropský sociální fond jsou naplňovány prostřednictvím společné přípravy na jednání Výboru pro Evropský sociální fond, koordinací přípravy podkladů, následným informováním o výsledcích včetně realizace úkolů vyplývajících z daných jednání. Zásadní, které přímo ovlivňují problematiku ESF v ČR, jsou řešeny v rámci koordinační skupiny řídicích orgánů programů OP VK, OP LZZ a OP PA.

Konzistence OP VK se strategickými dokumenty

Strategie OP VK je plně v souladu se základními strategickými dokumenty ČR a ES. OP VK vychází z Národního strategického referenčního rámce 2007-2013 a opírá se o Národní Lisabonský program 2005-2008, resp. NPR, a také o SHR a Národní inovační politiku. Současně OP VK podporuje hlavní linie Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílou knihu) a oblasti vymezené v Dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2002 a především 2005. OP VK v neposlední řadě reflektuje závěry a doporučení

strategických dokumentů vytyčujících politiku v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kterými jsou SRLZ 2003 a na ní navazující PR SRLZ z roku 2005.

OP VK dále respektuje politiku soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady SOZS, Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Integrované směry pro růst a zaměstnanost a Nařízení o Evropském sociálním fondu.

Následující tabulka zaznamenává podíl priorit Lisabonské strategie na prioritách OP VK.

Tab. č. 36: Earmarking OP VK¹⁶

Prioritní téma	Kategorie výdajů	Alokace v EUR 2007 - 2013	Vyčerpáno 2008 v % vzhledem k alokaci 2007 - 2013
Téma 1	62	164 584 332	0
	72	1 098 352 050	0
	73	54 861 443	0
	74	298 811 994	0
	81	157 269 472	0
	85	43 863 201	0
	86	10 972 289	0
Téma 2	1	1 828 714 781	0
Téma 3	1	1 280 100 349	0
	5	548 614 432	0
Celkem		5 486 144 343	0

Zdroj: OP VK

Vzhledem ke stále počáteční fázi implementace OP VK není možné sledovat příspěvek OP VK k naplňování cílů definovaných výše zmíněnými dokumenty a s nimi provázanými strategiemi.

¹⁶ Přehled o podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách ESF programů, tzv. earmarking.

PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/ FOND SOUDRŽNOSTI

V rámci OP VK nejsou realizovány velké projekty.

5 TECHNICKÁ POMOC

Pro zajištění TP OP VK byly v roce 2008 uskutečněny následující kroky:

Stabilizace TP a nastavení vnitřních postupů TP - V rámci zajištění technické pomoci OP VK byl v 1. pololetí 2008 kladen důraz na nastavení funkčních postupů TP a stabilizace odboru technické pomoci, včetně vymezení kompetencí a sladění se systémem postupů a směrnic MŠMT. Průběžně se scházely pracovní skupiny řešící problematiku dané oblasti PS pro Monitorování, interní PS pro postupy TP, PS Technická pomoc, PS RLZ. Výstupem je dopracovaná Příručka pro provádění TP OP VK, nastavení vnitřních postupů a organizační struktury pracovníků TP OP VK a technické zajištění OP VK.

V druhém pololetí byl v rámci zajištění a stabilizace TP doplněn stav zaměstnanců v odboru a byly precizovány metodické postupy. V rámci zajištění hladkého průběhu čerpání a monitorování projektů TP proběhlo na podzim jednání Pracovní skupiny pro TP OP VK.

Vyhlášení výzev pro TP OP VK - Pro zajištění možnosti čerpání prostředků TP byly 15. 2. 2008 vyhlášeny průběžné výzvy TP OP VK v prioritní ose 5a, 5b oblasti podpory 5.1, 5.2, 5.3. Vzhledem ke změnám alokací na jednotlivé oblasti podpory byly výzvy 5. 5. 2008 doplněny. V souvislosti s vyhlášenými výzvami byly krajům poskytovány informace a konzultace.

V druhém pololetí pokračovala otevřená výzva, v rámci které byly předkládány projekty Řídicího orgánu i Zprostředkujících subjektů.

Hodnocení a administrace projektů TP OP VK - V souladu s nastavenými postupy prošly předložené projekty technické pomoci ZS a ŘO připomínkovým řízením, a to v rámci pracovní skupiny pro Publicitu OP VK (28. 2. 08) a pracovní skupiny Technická pomoc OP VK (4. 2. 08) a implementační strukturou OP VK v rámci MŠMT (projekty ŘO). Po příjmu žádostí a formálním hodnocení proběhla 4 hlasování Hodnotitelské komise TP.

Na 1. zasedání HK 16. 5. 08 bylo předloženo 17 projektů (12 ZS, 5 ŘO), 4 z nich byly schváleny bez připomínek, 10 s připomínkami a 3 neschváleny.

Na 2. zasedání HK dne 20. 6. 08 bylo předloženo 29 projektů (24 ZS a 5 ŘO), 13 projektů bylo schváleno bez připomínek, 9 s připomínkami, 7 neschváleno.

Na 3. zasedání HK 31. 7. 2008 bylo předloženo 10 projektů (9 ZS, 1 ŘO), 7 z nich bylo schváleno bez připomínek a 3 s připomínkami.

Na 4. zasedání HK, které bylo uskutečněné formou hlasování per rollam (hlasování bylo ukončeno ke dni 11. 9. 2008, výsledky 1. 10. 2008), byly předloženy 2 projekty ZS, 1 z nich byl schválen bez připomínek, 1 s připomínkami. Byla schválena pololetní zpráva TP OP VK.

Celkem bylo v roce 2008 schváleno 48 projektů TP, viz tab. kapitola 2.1.A. U schválených projektů došlo k vyplacení žádaných záloh a nebyla proplacena žádná žádost o platbu.

Realizace projektů TP OP VK - ZS realizovaly projekty zaměřené na implementaci globálních grantů. ŘO realizoval projekty v rámci celého operačního programu, tzn. projekty zaměřené na monitorovací systém, hodnotící systém, informovanost a publicitu programu, absorpční kapacitu subjektů, zajištění zaměstnanců implementační struktury, vzdělávání, technické zajištění, studie a analýzy a doplňkové aktivity.

Počet uskutečněných seminářů, školení, workshopů a konferencí podpořených z prostředků TP OP VK činil 120. Míra spokojenosti příjemců dosáhla 91,3 %.

ŘO v roce 2008 zaměstnával 69 pracovníků placených z technické pomoci.

Projekty TP v roce 2008 významně přispěly k implementaci OP VK, a to zejména personálním zajištěním pracovníků, technickým vybavením. Došlo tak k podpoře ŘO a celé implementační soustavy OP VK, možnosti realizovat další aktivity, jako je dopracování systémů, metodik, podpora pracovních skupin, vyhlášení výzev, podpora žadatelů a příjemců atd.

Z Manuálu OP VK vyplývá povinnost informovat a propagovat aktivity a projekty OP VK. Odbor technické pomoci na základě požadavků jednotlivých odborů zajišťuje naplnění Komunikačního plánu řídicího orgánu (KoP ŘO), a to prostřednictvím realizace aktivit. V roce 2008 byly v rámci TP OP VK realizovány informační aktivity, kterým je věnována kapitola 7.

Ve sledovaném období monitorovací indikátory dosáhly souhrnně za všechny oblasti podpory PO 5 následujících hodnot¹⁷.

V roce 2008 byli v rámci TP podpořeni zástupci následujících cílových skupin OP VK:

1. **Pracovníci implementační struktury**, kteří byli vzděláváni na prvních seminářích v oblasti monitorovacího systému, ICT dovedností, informací o OP VK, byli vybavováni pro svou práci technickým zabezpečením.
2. **Zástupci monitorovacího výboru, a dalších pracovních skupin**, kteří byli v rámci aktivit O 41 na pracovních jednáních seznamováni s problematikou OP VK a byli tak zapojeni do implementace OP VK.
3. **Zástupci příjemců**, kterým byly poskytovány prostřednictvím realizovaných seminářů informace o možnosti čerpání z prostředků OP VK. V rámci zajištění informovanosti byly vytištěny Příručky a další informační materiály. Ve spolupráci se zástupci OP RLZ byla realizována konference k problematice ESF.
4. **Široká i odborná veřejnost** byla informována o dění v OP VK prostřednictvím cílených informačních článků, seminářů, konferencí věnovaných OP VK, viz kapitola

Tab. č.: 37 Monitorovací indikátory za oblasti podpory 5.1, 5.2, 5.3

Indikátor Č.	popis	Hodnota ZS + ŘO = celkem
49.11.05	Počet podpořených projektů v prioritní ose TP	1 + 48 = 49
48.05.00	Počet nově vytvořených produktů (realizace studií a zpráv)	3 + 3 = 6
48.11.00	Počet uskutečněných školení, sem., workshopů, konferencí	105 + 15 = 120
48.12.00	Z toho akcí na mezinárodní úrovni	0 + 1 = 1
48.16.00	Počet podpořených osob v prioritní ose TP	2612 + 0 = 2612
48.18.00	Počet úspěšně podpořených osob	14 + 276 = 290

¹⁷ Vzhledem k tomu, že monitorovací indikátory u projektů TP nebyly striktně vyžadovány, mají nízkou vypovídací hodnotu. Na základě potřeby evidovat ukazatele KoP byly vytvořeny indikátory KoP, které vypovídají o aktivitách a kvalitativním posunu.

00.00.02	Počet osob poskytujících služby	0 + 69 = 69
48.50.00	Míra spokojenosti příjemců podpory	73,9
Výsledek		

Zdroj: Výroční zpráva Odboru technické pomoci

6 INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA

Řídícímu orgánu OP VK vyplývá z článku 69 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 povinnost zajištění komunikačních aktivit a informovanosti, a to v souladu s prováděcími pravidly Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006.

V oblasti komunikačních aktivit se postupovalo následovně:

- v červnu 2008 byl EK definitivně schválen Komunikační plán OP VK (KoP) na programové období 2007-2013, současně jeho specifikace na rok 2007/2008, vč. související metodiky pro zajištění publicity a informovanosti;
- o pokroku v implementaci KoPu byl informován MV OP VK (červen a prosinec 2008) a je uváděn i v této výroční zprávě;
- naplňování, účinnost, věcnost, efektivnost a relevance KoPu OP VK je vyhodnocována (externí průběžné hodnocení);
- výsledky hodnocení informačních a propagačních aktivit budou uváděny v souladu s článkem 4, odst. 2 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ve Výroční zprávě za rok 2010 a v Závěrečné zprávě OP VK.

Komunikační aktivity a informovanost jsou v rámci OP VK zajišťovány na úrovni:

- ŘO – který je odpovědný za provádění komunikace, včetně související tvorby a naplňování KoPu. V rámci ŘO OP VK je odpovědnou a kontaktní osobou pro provádění komunikačních, informačních a propagačních opatření operačního programu komunikační úředník. ŘO spravuje centrální webové stránky <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013>, kde aktualizuje informace o programu OP VK a projektech;
- ZS – na něž ŘO deleguje realizace informačních a propagačních opatření na úrovni jednotlivých oblastí podpory OP VK, které jsou v jeho působnosti. Informační a propagační opatření realizovaná ZS jsou specifikována v metodických dokumentech operačního programu. ZS je povinen jmenovat odpovědnou a kontaktní osobu, která bude při implementaci informačních a propagačních opatření spolupracovat s ŘO OP VK;
- příjemců – kteří zajišťují informovanost a publicitu na základě metodických pokynů k zajištění publicity a informovanosti na úrovni jednotlivých projektů (dle právních aktů, Příručky pro příjemce atd.), a zároveň poskytují ŘO informace o projektech.

Pro dosažení komplexního a propojeného vnímání při propagaci ES, ESF, OP VK a projektů je dodržována jednotná vizuální identita, která je specifikována v Manuálu vizuální identity ESF v ČR a Manuálu vizuální identity OP VK, všemi subjekty implementační struktury OP VK.

Dle Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, čl. 4 odst. 2 písm. b) jsou v rámci realizace informačních a propagačních aktivit zveřejňovány seznamy příjemců, názvy operací i s výší částky přidělených operacím z veřejných zdrojů. Tyto údaje jsou zveřejňovány na webových stránkách <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vysledky> i na stránkách jednotlivých ZS.

Realizace komunikačních opatření na úrovni programu je hrazena ze zdrojů technické pomoci OP VK. Realizace komunikačních opatření na úrovni projektu je hrazena ze zdrojů samotného projektu.

Komunikační plán OP VK

Poskytování kvalitních informací o možnostech využívání Evropského sociálního fondu (dále ESF), jednoho ze strukturálních fondů EU, v oblasti školství a vzdělávání je klíčovým předpokladem pro úspěšnou realizaci projektů vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávání v České republice. Za tímto účelem a v návaznosti na komunikační plán pro úroveň NSRR byl zpracován KoP OP VK (vychází z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti).

KoP OP VK navazuje na Komunikační akční plán OP RLZ v období 2004–2006, resp. na komunikační akční plány Zprostředkujícího subjektu pro opatření 3.1 a 3.2 OP RLZ, a dále vychází z jednotlivých analýz zaměřených na informační a komunikační aktivity v období 2004–2006 i zahraničních zkušeností. Směřuje tím k zefektivnění poskytování informací o pomoci poskytované ze strukturálních fondů, zejména z ESF, na oblast školství a vzdělávání.

Komunikační plán OP VK rozpracovává komunikační strategii pro pomoc z ESF v oblasti vzdělávání a školství. Vychází z komunikační strategie pro NSRR, kterou vypracoval koordinační a metodický orgán Národního rámce politiky soudržnosti (NRPS), a je s ní konzistentní.

KoP OP VK rovněž respektuje Usnesení vlády č. 159/1998, na jehož základě je koordinační rolí pro oblast ESF (vzhledem ke specifické povaze implementace programů ESF) pověřeno MPSV. ŘO OP VK spolupracuje s MPSV, a to zejména tak, že do informačních a propagačních aktivit OP VK zahrnuje společná témata jako např. jednotné prvky vizuální identity (logo ESF a vlajky EU), publikování na společné webové stránky ESF v ČR (www.esfcr.cz) apod.

KoP OP VK obsahuje údaje o cílech, cílových skupinách, obsahu, o strategii a nástrojích informačních a propagačních aktivit, financování, řízení a implementaci, hodnocení a subjektech podílejících se na jeho řízení.

Na základě KoP OP VK jsou předkládány ŘO a ZS roční komunikační plány, které specifikují nejen aktivity realizované v daném roce, ale popisují také způsoby hodnocení aktivit, monitorovací indikátory atd.

Jednotlivé informační a propagační aktivity realizované v roce 2008 ŘO OP VK a ZS vycházely z plánovaných aktivit ročních KoPů, přičemž byly financovány z dílčích projektů TP OP VK.

V roce 2008 byl v oblasti publicity a podpory absorpční kapacity využit tisk, rozhlas a internet, účast na konferencích a veletrzích, uspořádány informační semináře a odborné kulaté stoly, vydávány propagační předměty a informační materiály. Pro podporu úspěšné komunikace byl rozpracován jednotný vizuální styl programu.

Konkrétní příklady realizovaných akcí a aktivit:

- prezentace OP VK v dubnu na veletrhu Schola Nova 2008, v rámci vlastního stánku MŠMT zaměřeného na představení využívání prostředků ESF ve vzdělávání a školství v ČR. Součástí byla i prezentace OP VK v rámci doprovodného programu veletrhu. (Praha)

- prezentace v dubnu prostřednictvím infostánku na konferenci CIP EQUAL
- prezentace programu v dubnu v rámci konference Výroční setkání k Evropskému sociálnímu fondu - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2008. Vystoupili zástupci MŠMT, krajů, realizátorů projektů a partnerů. (Praha)
- prezentace programu v říjnu na Konferenci k využití ESF ve vzdělávání. Informace poskytovány na stánku OP VK, v rámci přednášek a tří workshopů. (Praha)
- informování o realizaci KoPu OP VK v červnu 2008 na druhém zasedání MV OP VK a v prosinci 2008 na třetím zasedání.
- účast zástupce ŘO v rozhlasovém vysílání v březnu 2008 na Rádiu Česko
- v dubnu až listopadu 2008 proběhlo dvanáct seminářů pro žadatele IP ostatních (Praha, Brno, Liberec), čtyři semináře pro žadatele IP národní, na nichž byli informováni o možnostech čerpání podpory z OP VK, deset kulatých stolů pro odbornou i laickou veřejnost k IP národním (Praha). Dále se uskutečnily dva semináře pro IS GG OP VK (Praha).
- v období duben až listopad 2008 byly v celostátním odborném i denním tisku publikovány články k výzvám (obecné i věnované konkrétním prioritním osám), o administraci prvních projektů a aktuálnímu dění v OP VK. Přehled periodik: Deník, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta, Právo, Učitelské noviny
- pravidelné zprávy o programu ve čtvrtletníku MŠMT distribuovaném do všech škol a školských zařízení
- komunikace se žadateli, odbornou i širokou veřejností skrze pravidelně aktualizované webové stránky www.msmt.cz (monitoring návštěvnosti), informace pravidelně doplňovány i na stránky www.esfcr.cz a www.strukturalni-fondy.cz
- distribuce letáků a plakátů prostřednictvím Eurocenter, krajských úřadů, odborného tisku a během prezentací na konferencích
- výroba propagačních předmětů (např. diáře, kožené desky, propisovací tužky)
- brožury OP VK v české i anglické verzi (tištěné i na CD), připravena Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce, brožura Dobrá praxe.

Registrovaným zájemcům byly zasílány informace k akcím i dokončeným materiálům k OP VK formou databázového mailingu, zájemcům byly poskytovány konzultace písemnou formou prostřednictvím emailových adres opvzdelavani@msmt.cz a esf@msmt.cz, telefonickým i osobním kontaktem, a to ze strany všech subjektů zapojených do implementace OP VK.

Zprostředkujícími subjekty (jednotlivými krajskými úřady) pak byla realizace OP VK a zejména globálních grantů propagována v rámci následujících vlastních informačních a propagačních aktivit.

- v průběhu prvních výzev byly realizovány informační semináře pro žadatele, následně příjemce finanční podpory. V některých krajích se také uskutečnily pracovní workshopy k vyhodnocení a poučení se z chyb prvních výzev;
- o možnostech využití finanční podpory byla také v mnoha krajích informována odborná veřejnost (např. ředitelé škol a školských zařízení);

- výzvy k předkládání projektů a globální granty byly propagovány v tisku, rozhlasu a taktéž na webových stránkách kraje;
- pravidelně jsou potenciálním žadatelům poskytovány osobní i telefonické konzultace k přípravě projektových žádostí a následně také metodická podpora při realizaci projektů;
- k informování potenciálních žadatelů nebo příjemců pomoci je využíván mailing;
- některé ZS také v průběhu roku 2008 zhotovily propagační tiskoviny i předměty.



Pro ilustraci je v následující tabulce uveden orientační přehled vytvořených informačních a propagačních předmětů šesti ZS.

Tab.č. 38: Ukázka propagačních a informačních předmětů

Propagační předměty krajů: Jihomoravského, Karlovarského, Královéhradeckého, Libereckého, Plzeňského, Středočeského	
Druh	Počet
Bloky, desky	7300
Psací potřeby	6450
Samolepky s logy	4350
Informační letáky	2470
Vizitky	2000
Brožury OP VK	1000

Výroční zpráva Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2008

Pochutiny	600
Papírové tašky s potiskem	400
Nápojové sety, šálky, termohrnky	380
USB disky	340
Osušky, ručníky (vč.potisku)	300
Omega Silver - blue rubber frost	300
Laserové ukazovátko	300
Deštníky vč.potisku	250
Kalkulačky	200
Atletické bundy	160
Sportovní tašky	160
Samolepky (vlajka EU)	150
Kalendáře, diáře	135
Psací podložky s klipem	100
Nástěnky s potiskem	100
Dřevěné krabice s příslušenstvím k vínu	100
Příručky pro žadatele OP VK	50
Příručky pro příjemce OP VK	50
CD OP VK	50
Roll-up OP VK	2
Informační banner	1
CELKEM	2698

Zdroj: Výroční zprávy ZS

Níže uvedená tabulka shrnuje jednotlivé akce, které ZS realizovaly v průběhu roku 2008.

Tab. č. 39: Semináře, konference a další akce realizované ZS

Propagační akce, semináře	Kraj													Celkem
	JČK	JMK	KK	KHK	LK	MSK	OL	PK	PLZ	SČK	ÚK	Vys	ZK	
Seminář pro žadatele	3	4	5	12	8	9	5	1	3	13	3	8	4	78
Seminář pro hodnotitele, školení		4		1		1		1	1	2	3	2		15
Seminář pro příjemce					1					2			2	5
Porady s řediteli škol a školských zařízení, školskými příspěvkovými organizacemi	ANO	1			5	2	2	2				2	1	15
Porada s obcemi	ANO	2		1	1	1								5
Porada s výchovnými poradci					1									1
Seminář "Poučení se z chyb první výzvy", výsledky první výzvy, výroční konference, výjezdní zasedání		1			1	3		ANO		1		1		7
Představení GG na jednání Výborů a Rad krajů		2				3						3	1	9
Semináře, konference o využití dotačních programů		4				17	2		9			3	3	38
CELKEM	3	18	5	14	17	36	9	4	13	18	6	19	11	169

Zdroj: Výroční zprávy ZS

Specifické aktivity jednotlivých Zprostředkujících subjektů jsou uvedeny v popisu níže:

Jihočeský kraj

V prvním čtvrtletí 2008 byly vytvořeny webové stránky <http://opvk.kraj-jihocesky.cz>. Tyto stránky jsou v celém monitorovacím období aktualizovány a jsou na nich poskytovány pravidelné informace o průběhu administrace GP, stránky slouží i k informování široké veřejnosti a potencionálních žadatelů. Dále byla vytvořena e-mailová adresa opvk@kraj-jihocesky.cz pro zodpovídání dotazů. Pro zjištění zájmu o 1. výzvu OP VK v JČK byly distribuovány dotazníky zaměřené na předběžný zájem o GP prostřednictvím mailingu. Operační program byl představen na pravidelném setkání se starosty v JČK, na pracovních setkáních ředitelů škol a školských zařízení a pracovníků OŠMT a také Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje.

V návaznosti na vyhlášení I. výzvy bylo uskutečněno několik informačních akcí. Byly vydány inzeráty v regionálním tisku MF Dnes, informace o výzvě byla také zveřejněna v informačním listu JČK, který je vydáván v elektronické i tištěné podobě. Dále bylo využito internetové zpravodajství JČK (Zvukové noviny, 22. 5. 2008 http://rozhlas.kraj-jihocesky.cz/?p=p_200). Výzvy ve zkrácené podobě byly zavěšeny na úřední desku KÚ. Informace o výzvách a seminářích byly uveřejněny i na speciálních neveřejných internetových stránkách pro školy v JČK.

Jihomoravský kraj

- realizace seminářů pro žadatele
- realizace školení pro hodnotitele

Dále bylo poskytnuto

- 210 e-mailových konzultací projektových záměrů a konzultací o možnostech čerpání z OP VK, informace na poradách starostů obcí Jihomoravského kraje, poradách tajemníků obcí Jihomoravského kraje, poradách škol v Jihomoravském kraji a 145 osobních konzultací (v délce 30 – 90 minut).
- informace o OP VK jsou zveřejňovány na webových stránkách JMK (www.kr-jihomoravsky.cz) a zde jsou také pravidelně doplňovány a aktualizovány

Publicita GG:

- 5.5.2008 2x vydána inzerce v MF Dnes – zveřejnění výzvy OP VK
- 5.5.2008 2x vydána inzerce v deníku Právo – zveřejnění výzvy OP VK
- 15.4.2008 vydán informativní článek v Jihomoravských ekolistech
- zpracování tří modelových projektů (podklady pro semináře na téma „Čerpání finančních prostředků z OP VK“

Karlovarský kraj

V průběhu monitorovacího období ve vazbě na připravovanou/vyhlášenou výzvu proběhlo několik akcí směřujících k informování a publicitě GG OP VK..

Již v rámci přípravy návrhu GG byla zpracována databáze potenciálních příjemců z OP VK (např., školy, NNO, Hospodářské komory, právnické osoby – vzdělávací instituce, obce, atd.). Těmto subjektům byly zasílány informace formou e-mailu o plánovaných aktivitách (např. semináře, vyhlášení výzvy). Tato databáze kontaktů je aktualizována a bude využívána po celou dobu realizace GG.

V průběhu celého období probíhaly četné konzultace s potenciálními žadateli, které poskytovali pracovníci Oddělení grantových schémat telefonicky, emailem a osobně na KÚKK. Aktuální informace jsou stále dostupné na webových stránkách Karlovarského kraje.



V rámci vyhlášení 1.kola výzvy byly podány dva inzeráty do regionálního tisku:

- inzerát v regionální příloze středečního vydání deníku MF DNES pro Karlovarský kraj dne 30.4.2008,
- inzerát v regionálním denním tisku v Karlovarském kraji – páteční vydání (Karlovarský deník, Sokolovský deník, Chebský deník) dne 2.5.2008.

Informace týkající se OP VK jsou k dispozici na internetových stránkách Karlovarského kraje (www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/), které jsou pravidelně aktualizovány.

Z propagačních materiálů byly pořízeny propisovací tužky s logem, které byly předávány účastníkům v rámci prezentace OP VK na všech seminářích.

Královéhradecký kraj

Provádění medializační kampaně v tisku (Hradecký deník, regionální příloha MF dnes) i v regionálních rádiích (čtrnácti denní kampaň, 48 spotů, Rádio OK, Rádio Magic, Rádio Life) za účelem zvýšení absorpční kapacity. V roce 2008 uspořádal ZS 12 seminářů pro žadatele.

Liberecký kraj

Při plnění informovanosti a publicity v roce 2008 vycházel Liberecký kraj z Komunikačního plánu Globálních grantů OP VK pro rok 2008, který určuje strategii a nástroje informačních a propagačních aktivit zprostředkujícího subjektu.

Vzhledem k faktu, že rok 2008 byl začátkem realizace OP VK a Globálních grantů OP VK LK, stal se pro Liberecký kraj prioritou cíl první KoP GG OP VK, tj. zvýšení povědomí veřejnosti. Liberecký kraj se prostřednictvím informování o existenci OP VK a GG snažil vyvolat zájem o možnostech OP VK a GG u relevantních cílových skupin.

Zprostředkující subjekt:

- pravidelně informoval o stavu GG LK v měsíčníku Liberecký kraj (šest článků);
- pravidelně informoval o stavu GG LK v regionální televizi Genus (čtyři spoty);
- publikovat texty výzev pro předkládání žádostí (5 deníků);
- vytvořil doménu třetího řádu na internetových stránkách Libereckého kraje vyčleněnou pouze pro GG OP VK: <http://opvk.kraj-lbc.cz>;
- vytiskl informační letáky o GG LK OP VK a distribuoval je na relevantní místa v Libereckém kraji (Eurocentrum Liberec,);

- nechala vyrobit propagační materiály (pastelky, bloky, tužky,).

Cílem KoP je také ozřejmit existenci příležitostí v OP VK, vyvolat zájem o nabídku danou oblastmi podpory OP VK a podpořit kvalitu zpracování projektových žádostí :

- v rámci porad s řediteli škol a školských zařízení Libereckého kraje, porad s obcemi Libereckého kraje, porad s výchovnými poradci v Libereckém kraji představil GG LK OP VK (7 porad);
- uspořádal seminář pro příjemce (1 seminář);
- uspořádal výroční konferenci GG LK OP VK;
- zřídil databázový mailing o novinkách v GG LK OP VK.

Moravskoslezský kraj

ZS MSK v roce 2008 plynule navázal na aktivity, které v oblasti publicity začal realizovat v roce 2007, kdy byla vytvořena kontaktní e-mailová adresa opvk@kr-moravskoslezsky.cz pro zasilání dotazů žadatelů a dále byli zaměstnanci ZS zváni na semináře a konference, aby zde vystoupili s informacemi o GG realizovaných MSK v rámci OP VK. Následně počátkem roku 2008 byly aktualizovány webové stránky NUTS2 Moravskoslezsko http://www.nuts2moravskoslezsko.cz/op_vk_05.html, kde byly umístěny aktuální informace o GG, dokumenty (např. Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce, Operační program), texty výzev, veřejné zakázky vyhlášené úspěšnými žadateli z prvních výzev, kontakty na zaměstnance ZS MSK apod. ZS MSK pořádal v roce 2008 24 seminářů pro celkem 1.554 účastníků, aby tak podpořil informovanost o GG a usnadnil žadatelům hladké čerpání finančních prostředků z OP VK. I nadále se účastnil konferencí či seminářů, na které byli zaměstnanci zváni za účelem šíření povědomí o GG, potažmo OP VK.

Olomoucký kraj

Dne 23. května 2008 realizována inzerce v denním tisku k vyhlášení prvních výzev v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Inzerát byl uveřejněn v regionální příloze deníku Mladá fronta DNES Střední Morava a dále v rámci Olomouckého deníku, resp. v každé z jeho regionálních mutací v rámci Olomouckého kraje.

Začátkem června 2008 proběhlo 5 informativních a vzdělávacích seminářů k vyhlášeným 1. výzvám v rámci GG, kterých se celkem zúčastnilo 332 osob. Dále byly poskytovány osobní, telefonické i e-mailové konzultace k připravovaným žádostem o GP.

Byly vytvořeny webové stránky zaměřené na GG Olomouckého kraje v OP VK. Tyto webové stránky byly zprovozněny v červnu 2008 na adrese

www.kr-olomoucky.cz/opvk. V současné době jsou na webových stránkách dostupné všechny potřebné informace, které jsou pravidelně aktualizovány.

Došlo k vybudování, resp. stabilizaci kontaktního místa. Pracovníci oddělení grantových schémat poskytují základní informace o GG OK v rámci OP VK na tzv. kontaktním místě, kterým je Oddělení grantových schémat Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje. Za rok 2008 bylo poskytnuto celkem 725 osobních konzultací.

Informace o GG OK byly podávány také na různých poradách, workshopech, konferencích organizovaných Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje (viz. příložený soubor Semináře, workshopy, konference 2008 s příspěvkem o GG OK OP VK.doc), kterých se zúčastnilo 393 osob.

Pardubický kraj

V souvislosti s publicitou GG byly realizovány následující aktivity:

- Pardubický, Svitavský, Chrudimský a Orlický deník (5.5.2008)
- Zpravodaj Pardubického kraje (září 2008)
- Webové stránky Pardubického kraje (trvale)
- Webové stránky MŠMT (trvale)
- Seminář pro žadatele (5.5. 2008)
- Seminář pro příjemce v rámci 1. výzvy (25.9. 2008)
- Porada s řediteli škol a školských zařízení v působnosti ORP Chrudim (22.9.2008)
- Porada ředitelů chrudimských škol (26. 8. 2008)

Plzeňský kraj

Oddělení řízení OP VK uspořádalo v monitorovaném období tři semináře pro žadatele a jeden seminář pro hodnotitele. Seminářům předcházelo 9 informačních workshopů pro potenciální žadatele zajišťovaných pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Tyto workshopy probíhaly v měsíci květnu a červnu. Na informačních workshopech i seminářích byly potenciálním žadatelům v souladu s pravidly pro publicitu (použití log, poskytování informací) rozdávány propagační materiály OP VK v podobě letáček, plakátů a CD. ZS i nadále umožňuje pro efektivní implementaci finančních prostředků osobní konzultace se zájemci o dotace v prostorách KÚ PK.

ZS pravidelně zveřejňuje potřebné dokumenty pro příjemce i žadatele na internetovém portále Plzeňského kraje (informace též poslány k vyvěšení na stránkách MŠMT).

Pro naplňování pravidel publicity byly ke konci roku 2008 vytvořeny propagační materiály a v průběhu ledna 2009 informativní letáky – OP VK v Plzeňském kraji.

Středočeský kraj

V uplynulém monitorovacím období byly vyhlášeny výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, prioritní osy 1. Ve vazbě na připravovanou/vyhlášenou výzvu proběhlo několik akcí směřujících k informování a publicitě GG OP VK, které probíhaly již před začátkem monitorovacího období a následně v průběhu a po ukončení výzvy.

Proběhlo 17 seminářů pro žadatele, resp. příjemce, kterých se zúčastnilo 615 lidí. V průběhu celého období probíhaly konzultace s potenciálními žadateli, které poskytovali pracovníci Odboru regionálního rozvoje telefonicky, emailem i osobně na KÚ SK.

V průběhu vyhlášené 1. výzvy bylo poskytnuto 134 osobních konzultací k projektovým záměrům žadatelů, k 2. výzvě pak 70 konzultací .



Vysočina

Samostatný webový odkaz pro GG OP VK v kraji Vysočina na stránkách www.vysocina-finance.cz.

Workshopy, semináře pro potenciální žadatele, školení, propagační akce - v roce 2008 proběhlo 19 propagačních akcí – podrobněji viz příloha Výroční zprávy.

Inzerce vyhlášených výzev do GG

- deník Vysočina – 26. 5. 2008
- MF dnes – 26.a 29. 5 2008

Mailing organizacím ze stávajících databází kraje. Předávání aktuálních informací o GG OP VK v kraji Vysočina potenciálním žadatelům (o vyhlášení výzev, o konání seminářů, workshopů, konferencí, školení, změně dokumentů apod.)

Osobní a telefonické předávání informací o GG OP VK, konzultace projektových záměrů, poradenská činnost žadatelům při tvorbě projektů

Tiskové zprávy a články o GG OP VK

- tiskové zprávy o stavu GG OP VK v kraji Vysočina na www.kr-vysocina.cz (7 zpráv)
- článek ve Zpravodaji Krajského úřadu kraje Vysočina

Ústecký kraj

Z realizovaných akcí se jedná o semináře a workshopy :

Seminář pro žadatele – 1. výzva (81 účastníků, 9.4.2008, Ústí nad Labem), seminář pro žadatele UJEP (20 účastníků, 2.7.2008, Ústí nad Labem), workshop pro příjemce – 1. výzva (20 účastníků, Ostrov),seminář pro žadatele – 2. výzva (81 účastníků, 10.7.2008, Ústí nad Labem), seminář pro příjemce – 1. výzva (25 účastníků, 15.9.2008, Ústí nad Labem), workshop pro příjemce – 2. výzva (41 účastníků, 3.11.2008, Ústí nad Labem).

Dále byly v tisku zveřejněny v daném období celkem 4 inzeráty k vyhlášení výzev (4.4.2008 – MF Dnes, 4.4.2008 – Deník Bohemia – 1. výzva, 4.7.2008 – MF Dnes, 4.7.2008 – Deník Bohemia – 2. výzva). V daném období byl vydán 1 článek v tisku (16.10.2008, Ústecký deník).

Zlínský kraj



10.4. 2008 - Inzerce k pořádaným seminářům pro potenciální žadatele – inzerát ve dvou regionálních denících (regionální příloha MF DNES a Deníky Vltava-Labe-Press)

15.4. 2008 - Seminář pro zájemce o získání podpory z OP VK PO 1 – Otrokovice, 64 účastníků

17.4. 2008 - Seminář pro zájemce o získání podpory z OP VK PO 1 – Vsetín, 68 účastníků

23.4. 2008 - Seminář pro zájemce o získání podpory z OP VK PO 1 – Kroměříž, 41 účastníků

25.4. 2008 - Seminář pro zájemce o získání podpory z OP VK PO 1 – Uherské Hradiště, 55 účastníků

3.12.2008 – Seminář pro příjemce finanční podpory 1.1 – Zlín (44 účastníků)

5.12.2008 – Seminář pro příjemce finanční podpory 1.1 – Zlín (37 účastníků)

Průběžně probíhá aktualizace internetových stránek Zlínského kraje. Jsou zveřejňovány nové verze příruček, seznam podpořených projektů, prezentace ze seminářů pro žadatele i pro příjemce, dotazy a odpovědi, jsou aktualizovány dokumenty ke stažení a uveřejňovány veřejné zakázky realizátorů grantových projektů.

Hodnocení informačních a propagačních aktivit OP VK

Všechny výše uvedené aktivity významnou měrou přispívaly v roce 2008 ke zvýšení informovanosti o OP VK, jednotlivých výzvách i samotných projektových záměrech potenciálních žadatelů. Na základě těchto aktivit významně stoupl zájem o projektování v rámci OP VK, což se projevilo zejména značným nárůstem návštěv webových stránek MŠMT (www.msmt.cz/strukturální-fondy) i přímých dotazů zasílaných na informační kontaktní emailovou adresu opvzdelavani@msmt.cz.

Řada aktivit napomáhající informovanosti a publicitě OP VK i podpoře absorpční kapacity bude pokračovat dle KoP OP VK, ročních KoP ŘO a ZS i projektů TP i v roce 2009 a letech dalších.

Pro zajištění koordinačních mechanismů v rámci informačních a komunikačních aktivit OP VK, resp. programu spolufinancovaného z ESF, bylo využíváno logo ESF v ČR i webových stránek www.esfcr.cz, přičemž byla dodržována pravidla vizuální identity OP VK i ESF.

Za účelem zjištění účinnosti realizovaných komunikačních aktivit bylo v říjnu 2008 vyhlášeno výběrové řízení na zpracování analýzy informovanosti potenciálních žadatelů OP VK o možnostech čerpání prostředků ESF v rámci OP VK a o konkrétních postupech při tvorbě a realizaci projektů v rámci OP VK.

Fotografická dokumentace:

Ukázka informačních materiálů



Stánek MŠMT na veletrhu Schola Nova 2008 (Praha, duben 2008)



Výroční konference k ESF – Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Praha, duben 2008)



Infostánek s ministrem Ondřejem Liškou na konferenci CIP EQUAL (Praha, duben 2008)



Webové stránky ŘO k OP VK (www.msmt.cz/strukturalni-fondy)

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013 - MŠMT ČR - Windows Internet Explorer

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013

Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené položky Nástroje Nápověda

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007...

Novinář Rodič Student Pedagog Vědec Úředník Sportovec

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

EN

Ministerstvo Vzdělávání Mládež Sport Sociální programy Dotace programy EU a zahraničí

Strukturální fondy:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013

Aktuality
Základní informace o ESF
Základní dokumenty
Pro žadatele a příjemce
Pro hodnotitele
Projekty
Veřejné zakázky
Kontakty a užitečné odkazy

OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
OP Rozvoj lidských zdrojů období 2004-2006

Právě se nacházíte:
[Tuhá stránka](#) » [Strukturální fondy](#) » [OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost...](#)

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013

V této sekci naleznete základní informace o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Popsány jsou zde jeho cíle, prioritní osy, typy podporovaných projektů, finanční alokace a další užitečné informace.

Co je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost?

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF).

Na co se OP VK zaměřuje?

OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

VYHLEDÁVÁNÍ

PŘIHLÁŠENÍ / REGISTRACE

Aktuality

- 13.10.2008 Vyhlášení výzvy k předkládání IPo oblast podpory 2.3
- 19.5.2009 Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání Prioritní osy 2 OP VK
- 24.3.2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku "Provedení výzkumu studentů akademických pracovníků a vnějších aktérů vysokého školství v ČR"

Internet 100%

Start Kaldář - Microso... Nové články z http... H:\vyrocní_zprava Výroční zpráva OP... R:\MSMT-4\Odbor... OP Vzdělávání p... 9:22

7 UŽÍVANÉ ZKRATKY

AKČR	Asociace krajů ČR
CIP EQUAL	Program Iniciativy Společenství EQUAL
ČSÚ	Český statistický úřad
DVPP	Další vzdělávání pedagogických pracovníků
EIB	Evropská investiční banka
EK	Evropská komise
ERDF pro regionální rozvoj	European Regional Development Fund, Evropský fond
ES	Evropské společenství
ESF	Evropský sociální fond
EU	Evropská unie
EVVO	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
GG	Globální grant/y
GP	Grantový projekt
HK	Hodnotitelská komise
ICT	Information and Communication Technologies
IP	Individuální projekt/y
IPn	Individuální projekt národní
IPo	Individuální projekt ostatní
IPRM	Integrovaný plán rozvoje měst
IS	Implementační soustava/Informační systém
ISKA	Informační systém kvalifikací a autorizací
JČK	Jihočeský kraj
JMK	Jihomoravský kraj
KHK	Královehradecký kraj
KK	Karlovarský kraj
KoP	Komunikační plán
KÚ	Krajský úřad
LK	Liberecký kraj
MF ČR	Ministerstvo financí České republiky
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MS	Monitorovací systém

MSC2007	Monitorovací systém Central 2007
MSK	Moravskoslezský kraj
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV ČR	Ministerstvo vnitra české republiky
MV OP VK	Monitorovací výbor Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
MZ	Monitorovací zpráva
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
N/A	not available, nedostupný
NČI	Národní číselník indikátorů
NNO	Nestátní nezisková organizace
NOK	Národní orgán pro koordinaci
NPR	Národní program reforem ČR
NRPS	Národní rámec politiky soudržnosti
NSRR	Národní strategický referenční rámec
NUTS2	územní statistická jednotka, tzv. region soudržnosti, (z fr. originálu Nomenclature des Unites Territoriales Statistique - klasifikace územních statistických jednotek);
OL	Olomoucký kraj
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OP PA	Operační program Praha Adaptabilita
OP PI	Operační program Podnikání pro inovace
OP TP	Operační program Technická pomoc
OP VaVpI	Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
op	Oblast podpory
ORP	Obec z rozšířenou působností
OŠMT	Odbor školství mládeže a tělovýchovy
PAS	Pověřený auditní subjekt
PCO	Platební a certifikační orgán
PD	Prováděcí dokument
PK	Pardubický kraj
PLZ	Plzeňský kraj
PO	Prioritní osa
PS RLZ	Pracovní skupina rozvoje lidských zdrojů

PS	Pracovní skupina
ROP	Regionální operační program
ŘO	Řídící orgán
SČK	Středočeský kraj
SF	Strukturální fondy
SFC 2007	System for Fund management in the European Community 2007—2013, Informační systém Evropské komise
SHR	Strategie hospodářského růstu
TP	Technická pomoc
ÚIV	Ústav pro informace ve vzdělávání
ÚK	Ústecký kraj
ÚOSS	Ústřední orgán státní správy
VaV	Věda a výzkum
VOŠ	Vyšší odborná škola
VŠ	Vysoká škola
VYS	Kraj Vysočina
VZ	Výroční zpráva
ZK	Zlínský kraj
ZS	Zprostředkující subjekt
